

2018



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Julio
FECHA DE CORTE: 30/07/18

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Header section containing university name (Universidad de Guadalajara), entity (Jalisco), and contact information for the planning and maintenance departments.

Main data table with columns for project priority, name, type, authorized amount, exercised amount, remaining amount, project details (rooms, quantities, costs), actions, dates, and completion status.

Summary row showing total authorized amount (\$45,544,269.16), exercised amount (\$0.00), and remaining amount (\$45,544,269.16).

Signature of Dr. Miguel Ángel Navarro, Rector General de la Universidad de Guadalajara.

Signature of Ing. Esteban Segura Estrada, Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara.

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anular esta fila como sea necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se vean reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Toda vez que se digan: dd, mm y aa.

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Julio

FECHA DE CORTE: 20/07/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD 10 Nombre de la obra:

Construcción de edificio bioclimático de laboratorios para el Departamento de Ciencias de la Salud, del Centro Universitario de la Costa Sur, sede Anonas (CUCOSTASUR) FAM 2018 P-11

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Camino de Capaya S/N, Colonia Castellón, Autlán, Independencia Nacional #151 C.P. 48900, Autlán, Jalisco, México.

Referencia de fotos en croquis

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Se adjuntan imágenes y renders de la proyección de construcción para el FAM 2018. Misma que ya se encuentra en su proceso de licitación.

En una superficie de desplante de 1,013.45 m2 la presente etapa (primera) considera los trabajos de excavaciones, movimientos de tierra, cimentación y un 10% de la estructura del inmueble la cual es a base de concreto y acero de refuerzo. Este proyecto forma parte y es continuidad del plan maestro de sede "Las Anonas".

Iniciar con esta obra sustentable y bioclimática busca minimizar el impacto, entre otros, de la huella de carbono generada por el ser humano y contribuir con el medio físico natural a través del uso de las tecnologías amigables con el ambiente aplicadas en su proceso de construcción. Permitir la edificación de obras sustentables coadyuvan a minimizar el impacto al medio físico natural estableciendo, a través de sistemas de ahorro de energía, captación de agua de lluvia y otras tecnologías verdes, el impulso sustentable a efecto de contribuir a revertir el cambio climático.

El disponer de este inmueble, busca contribuir al fortalecimiento de la formación y capacitación de profesionales en el campo de la Salud, respondiendo a una importante demanda de la sociedad en la región Costa Sur del Estado. Permitiendo incrementar a 490 alumnos adicionales para la recepción de alumnos inscritos en estos PE, además de beneficiar a 57 profesores de tiempo completo, medio tiempo y asignatura que corresponden a estos Programas Educativos



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Julio

FECHA DE CORTE: 20/07/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

11

Nombre de la obra:

Cuarta etapa de la construcción del Auditorio del Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño (CUAAD) FAM 2018 P-16




Estado de la universidad

Porcentaje de avance

0

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

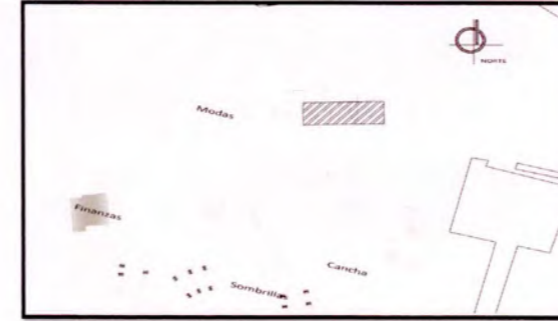

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calzada Independencia Norte no. 5075, Col. Huentitán El Bajo, C.P.44250 Guadalajara, Jal.

FOTOS




F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Se adjuntan imágenes de la etapa previa en donde se proyecta construir la 4a etapa de la construcción del Auditorio con recursos del FAM 2018, mismo que ya se encuentra en proceso de licitación.

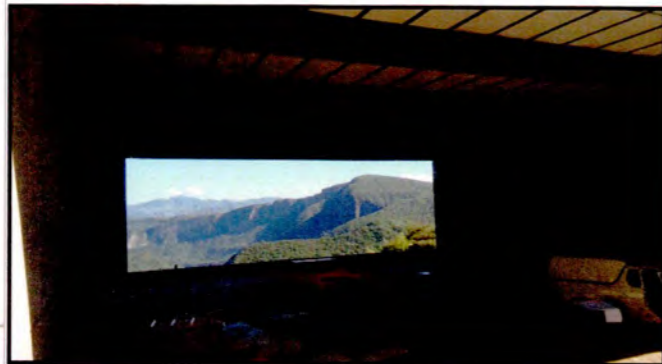


F3: Fachada posterior




F4: Entrada



F5: Interior de aula


Dr. Miguel Ángel Navarro, Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES


Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Julio

FECHA DE CORTE: 20/07/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0



PRIORIDAD

12

Nombre de la obra:

**Obras exteriores y conectividad del Edificio de Laboratorio de Ingenierías (CUNORTE)
FAM 2019 P-25**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

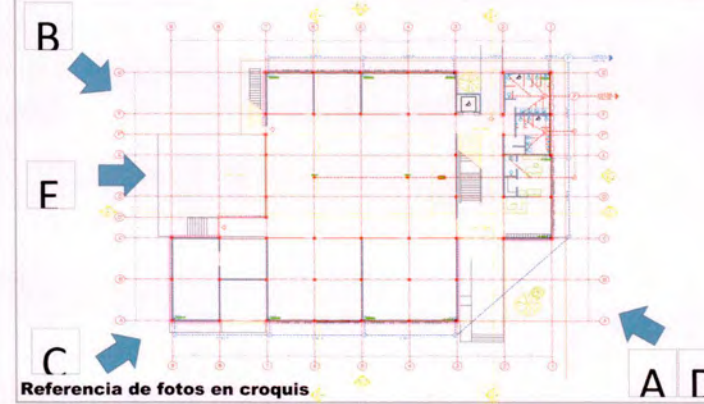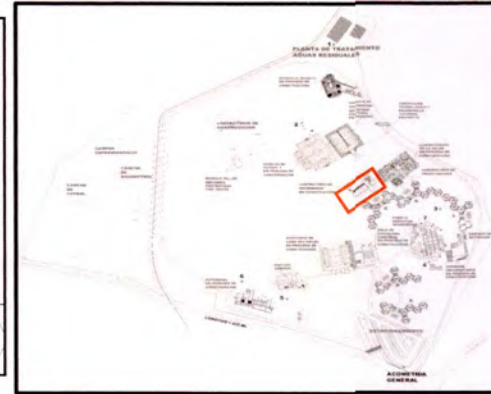

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Federal No. 23, Km. 191, C.P. 46200,
Colotlán, Jalisco, México

FOTOS



A

F1: Fachada principal



B

F2: lateral



C



F3: Fachada posterior



D



F4: Entrada



E



F5: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

Se adjuntan imágenes de la etapa previa, donde se proyecta la continuidad de la obra autorizada con recursos del FAM 2018. Misma que se encuentra en proceso de licitación.

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Julio

FECHA DE CORTE: 20/07/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Escudo de la Universidad
Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD **7** Nombre de la obra: **Continuación de Remodelación Clínica Escuela en el Centro Universitario del Sur (etapa 2) (CUSUR)**

FAM 2018 P-17

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

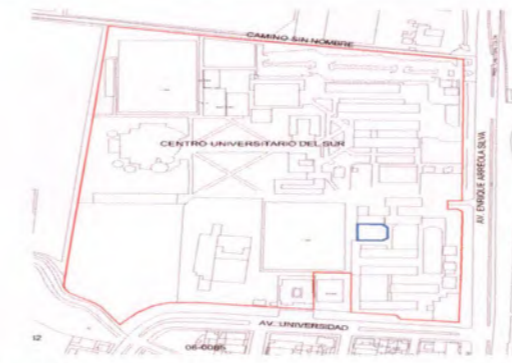

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Enrique Arreola Silva No. 883, colonia centro
C.P. 49000, Ciudad Guzmán, Jalisco, México.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada

Comentarios de los trabajos realizados:

Ya se encuentra en proceso de licitación la obra a realizar con el FAM 2018



F5: Interior de aula

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Julio

FECHA DE CORTE: 20/07/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **8** Nombre de la obra:

Continuación de la construcción de nuevas instalaciones para el Laboratorio de Psicología y Educación Especial (CUCS) FAM 2018 P-3



Porcentaje de avance

0

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Sierra Mojada # 950, Modulo U, Col. Independencia,
C.P. 44340, Guadalajara, Jalisco, México

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Se muestran imágenes de la etapa previa del Laboratorio de Psicología y Educación Especial, en donde se proyecta continuar la obra con recursos del FAM 2018. Ya se encuentra en proceso de licitación.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Inés Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2018
AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Julio
FECHA DE CORTE: 20/07/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD **9** Nombre de la obra: **Continuación de Construcción Sede Tomatlán del Centro Universitario de la Costa, Edificio C. (CUCOSTA) FAM 2018 P-7 (ajuste de monto)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

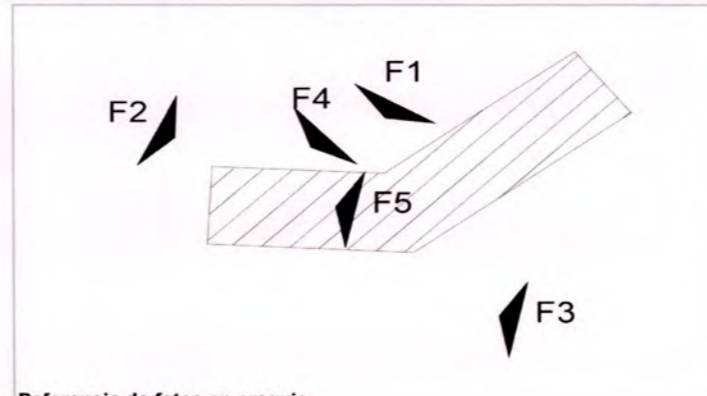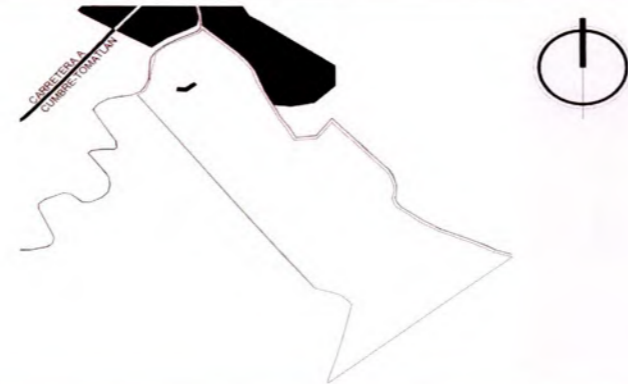

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera La Cumbre - Tomatlán, km. 2.116,
Tomatlán, Jalisco.

FOTOS



F1: Fachada principal




F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada

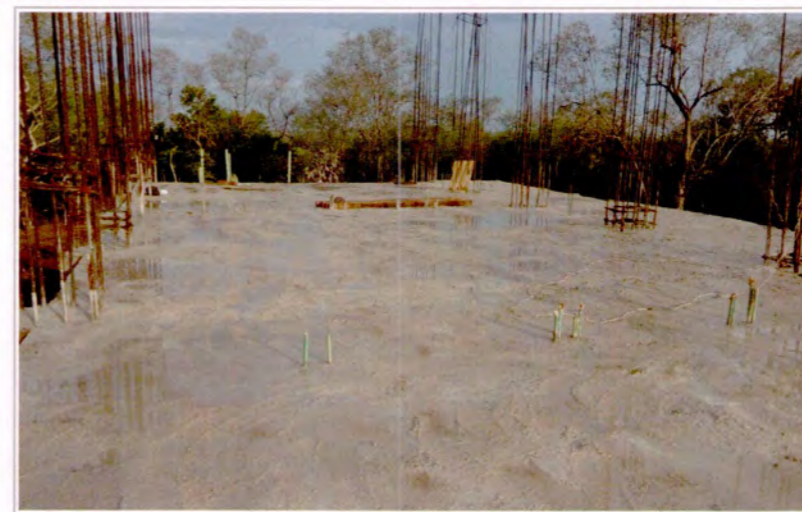

F5: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

Se muestran imágenes de la etapa previa, en donde se proyecta continuar con la construcción de la obra.
Ya se encuentra en proceso de licitación la obra autorizada con recursos del FAM 2018

Dr. Miguel Angel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Julio

FECHA DE CORTE: 20/07/18

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


PRIORIDAD

2

Nombre de la obra:

Instalación de luminarias led, fotoceldas y paneles solares en las instalaciones del Sistema de Universidad Virtual. (SUV) FAM 2018 P-36

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

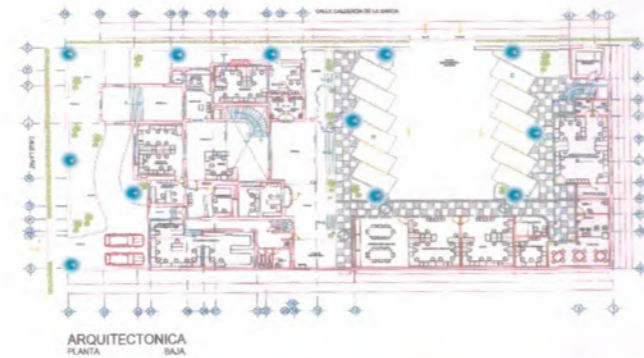

ARQUITECTONICA
PLANTA
SUA



Referencia: Calle de los Arcos



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. La Paz No. 2453
Col. Arcos Sur, C.P. 44130
Guadalajara, Jalisco.



Porcentaje de avance

0

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

Se adjuntan imagenes de la propiedad en donde proyecta realizar el suministro de fotoceldas y paneles solares, así como una imagen de la azotea.

Adicionalmente se construye el nuevo modulo de oficinas, en su azotea se instalarán parte de los paneles solares, por el momento se encuentra en etapa de demoliciones.

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Julio

FECHA DE CORTE: 20/07/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad
Porcentaje de avance

0


PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Conclusión de módulo A (4 aulas y pasillo de intercomunicación) en la planta alta del Centro Universitario de la Ciénega, sede Atotonilco (CUCIENEGA) FAM 2019 P-2

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

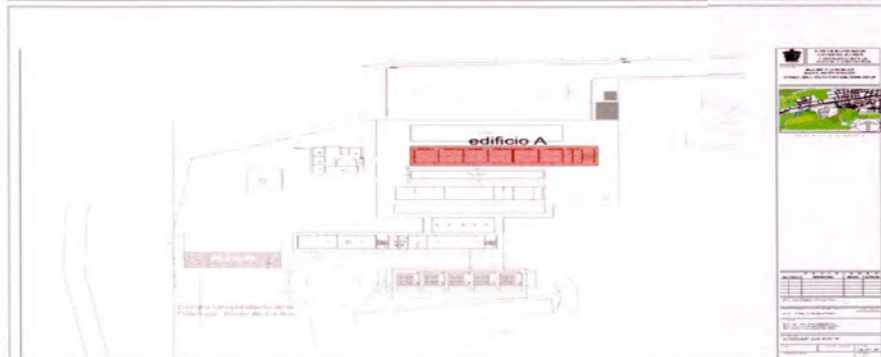

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Universidad, No.1115, Col. Lindavista,
Código Postal 47820, Ocotlán, Jalisco, México.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:
Se muestran imágenes en donde se proyecta realizar la conclusión del módulo A., Actualmente se encuentra en proceso de licitación la obra.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Julio

FECHA DE CORTE: 20/07/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Edificio de Investigación (Vinculación y Transferencia del Conocimiento) (CUCEA) FAM 2019 P-11

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

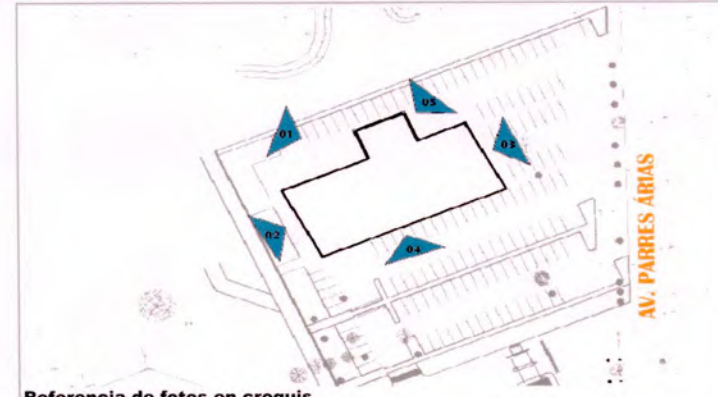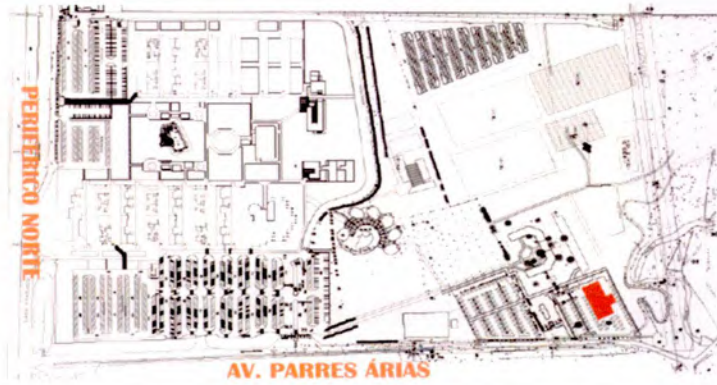

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Periférico Norte 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.



Escuela de la comunidad

Porcentaje de avance

0

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Se adjuntan imágenes de los avances que se tienen en la etapa previa, en donde se proyecta la continuidad de la construcción del edificio de Investigación con recursos del FAM 2018

Se publica convocatoria de licitación.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Julio
FECHA DE CORTE: 20/07/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Estado de la universidad

Porcentaje de avance
0

PRIORIDAD **4** Nombre de la obra: **CULAGOS Sustentable (CULAGOS)** **FAM 2019 P-14**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

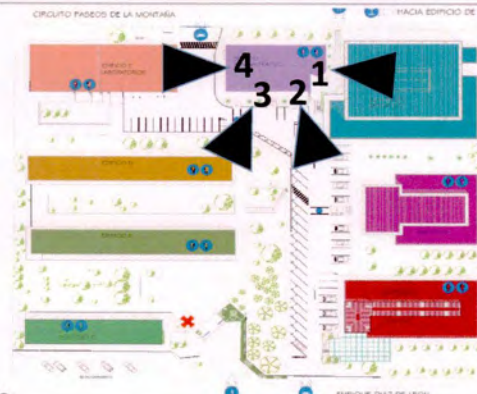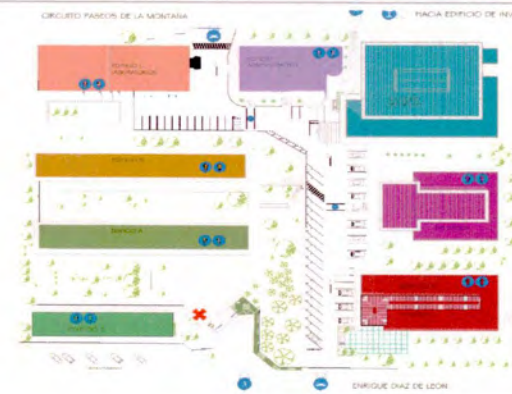

Referencia de

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Enrique Díaz de León No. 1144, Colonia Paseos de la Montaña C.P. 47460.
Lagos de Moreno, Jalisco, México

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:


Se muestran imágenes de los espacios a intervenir con los temas de sustentabilidad. Actualmente se analizan las prioridades y el catálogo de conceptos.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada

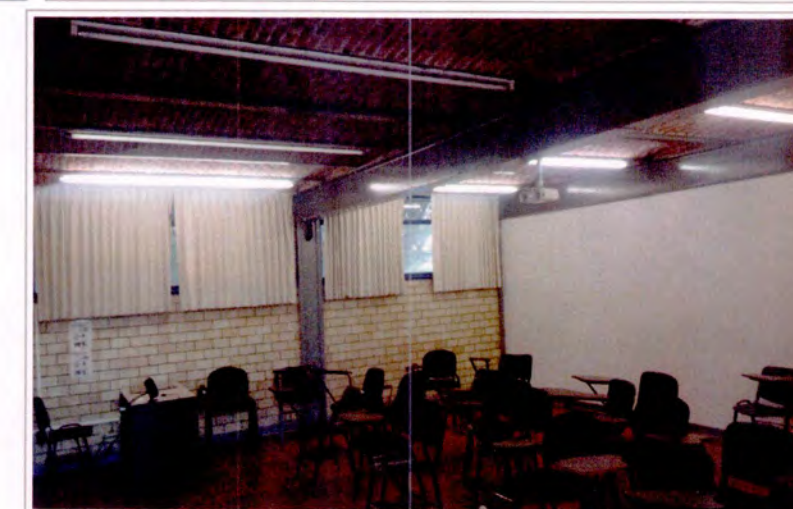

F5: Interior de aula

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Julio

FECHA DE CORTE: 20/07/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0



PRIORIDAD

5

Nombre de la obra:

Equipamiento de Mobiliario especializado para laboratorios de aprendizaje del Centro Universitario de los Valles (CUVALLES) FAM 2018 P-6 (ajuste de monto)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

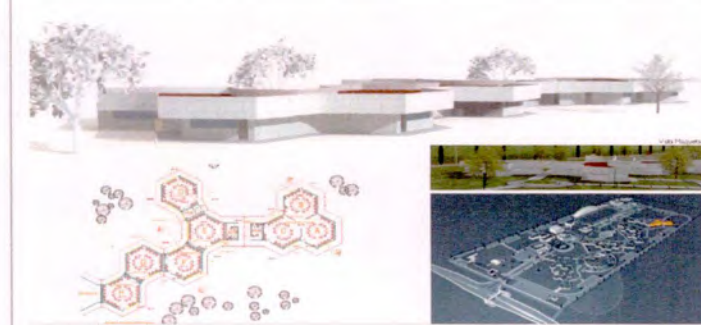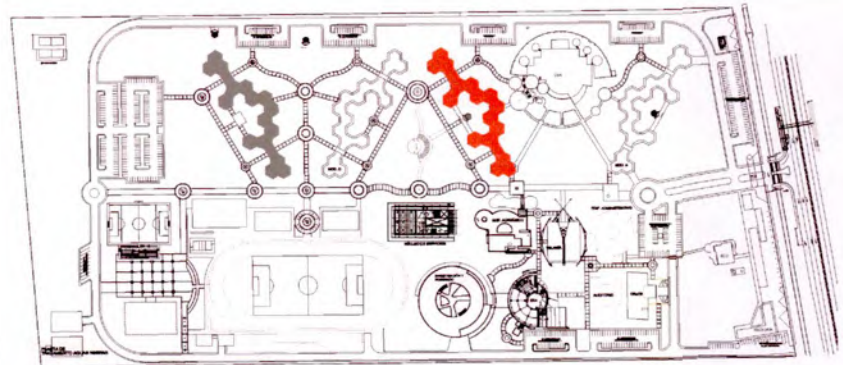

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Guadalajara - Ameca Km. 45.5, C.P. 46600, Ameca, Jalisco, México.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Se presentan estas fotografías como referencia para la adquisición de mobiliario especializado para los laboratorios de aprendizaje en el CUValles



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Julio

FECHA DE CORTE: 20/07/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad
Porcentaje de avance

0


PRIORIDAD

6

Nombre de la obra:

Centro de Recursos Informativos -CERI- Tercera Etapa (CUCBA). (CUCBA) FAM 2019 P-16

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

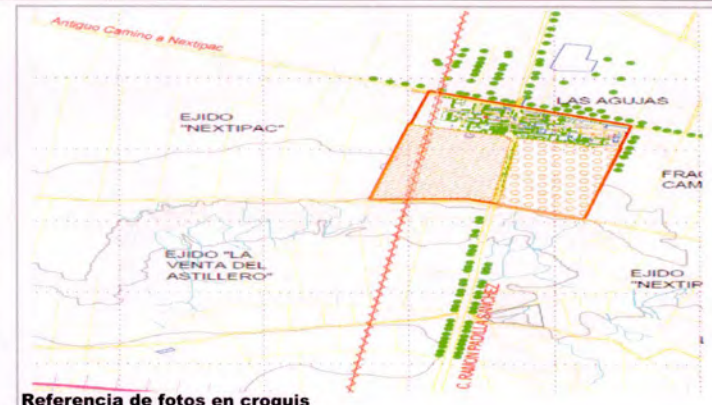

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

C. Ramón Padilla Sánchez #2100 Nextipac,
Zapopan, Jalisco, México

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

1.- Se muestran imágenes de los avances que se tienen en la etapa previa, Trazo y nivelación, cimentación y Estructura.
La obra del FAM 2018, se encuentra en proceso de licitación.

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Julio

FECHA DE CORTE: 20/07/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD 13

Nombre de la obra: Laboratorio de Química, quinta etapa. (CUCEI)

FAM 2018 P-22

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Boulevard Marcelino Gracia Barragan No. 1421,
Esquina Calzada Olímpica C.P 44430, Guadalajara,
Jalisco.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral




F3: Fachada posterior



F4: Entrada

Comentarios de los trabajos realizados:

Se muestran imágenes de la etapa previa, en donde se proyecta desarrollar la obra autorizada con recursos del FAM 2018. Misma que ya se encuentra en proceso de licitación.



F5: Interior de aula

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Jng. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
