

2020

AÑO



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Meses reportados

3er Trim. 2020

FECHA DE CORTE: 30/06/2020

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad de Guadalajara

Entidad federativa: Jalisco

Clave Inst 911: 14MSU0010Z

RESPONSABLES

Planeación  
Nombre: Mtra. Paola Lyccette Corona Gutiérrez  
Cargo: Coordinador General de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara  
Teléfono: 52 (01) 33 31342214 Ext 11202  
Correo electrónico: paola.corona@copladi.udg.mx

Obras y Mantenimiento  
Nombre: Ing. Esteban Segura Estrada  
Cargo: Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara  
Teléfono: 52 (01) 33 31342235 Ext 1801 y 1802  
Correo electrónico: esegura@redudg.udg.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/Equipo	Cantidad	Metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Terminación del edificio de Investigación Vinculación y Transferencia del conocimiento. (CUCEA)	X				\$ 8,000,000.00	\$ 1,744,215.11	\$ 6,255,784.89	Talleres	4	481.17	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza y deshierbe del terreno.</li> <li>• Andadores</li> <li>• Sistema principal y secundaria</li> <li>• Excavación y construcción de muro para recibir el biodigestor y la colocación del mismo.</li> <li>• Escalera Principal y secundaria.</li> <li>• Registros de agua potable.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalación de tuberías y ductos (canalizaciones).</li> <li>• Instalación de sistema fotovoltaico.</li> <li>• Cimbrado, armado y colado de tapas de cisternas.</li> <li>• Pozos de absorción.</li> <li>• Terminación de la fachada.</li> <li>• Interconexión del sistema de agua potable, sanitario y pluvial.</li> <li>• Escalera Principal. Terminar el montaje de la estructura metálica, aplicación de pintura, colocación de Insacera x malla electrn...</li> </ul>	30	16/07/20	12/11/20								
									Laboratorios	2	263.56													
									Cubículos	34	290.40													
									Aulas usos múltiples	1	79.17													
									Sanitarios	4	89.96													
									Áreas comunes	7	223.69													
TOTAL	52	1427.95	GLOBAL DEL PROYECTO																					
2	Construcción de edificio de 3 niveles destinado aulas y servicios, tercera etapa, módulo uno. (CUCEI)	X				\$ 8,500,000.00	\$ 1,864,632.92	\$ 6,635,367.08	Aulas/salones	11	900.68	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impermeabilización en azotea, recubrimientos y acabados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cancelería, herrería, aluminio, vidrios y chapas.</li> </ul>	5	02/9/20	31/10/20								
									Oficinas académicas	1	56.47													
									Sanitarios	2	81.88													
									Áreas comunes	4	558.90													
									Otros	2	113.54													
									TOTAL	20.00	1711.47													
3	Reforzamiento y ampliación de los Edificios P-Q que albergarán el Instituto Transdisciplinar de Investigación e Innovación en Salud (Continuación). (CUCS)	X				\$ 15,000,000.00	\$ 3,931,539.52	\$ 11,068,460.48	Aulas/salones	9	340.35	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colocación de equipos eléctricos en azotea (transformadores, plantas de emergencia)</li> <li>• Trabajos eléctricos y tableros eléctricos en todo el edificio</li> <li>• Acabados en interior pisos, muros y plafones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terminación de fachadas de cristal, acabados en aluminio on fachadas.</li> </ul>	50	09/07/20	31/12/20								
									Laboratorios	12	2993.48													
									Cubículos	157	1660.36													
									Auditorios	2	441.00													
									Oficinas académicas	12	76.50													
									Aulas usos múltiples	3	124.50													
									Sanitarios	11	288.78													
									Áreas comunes	10	2229.45													
									Otros	4	443.25													
TOTAL	220.00	8597.67																						
4	Continuación del Edificio de Tutorías. (CUTONALÁ)	X				\$ 13,844,986.00	\$ 7,940,385.22	\$ 5,904,600.78	Aulas/salones	10	700.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reforzamiento estructural, aplicación de pintura prima en estructura y colocación de lamina acanalada en entpisos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colado de losas de entrepiso, colocación de ductería sanitaria, eléctrica e hidráulica, fabricación y montaje de escalera metálica</li> </ul>	71	16/07/20	31/12/20								
									Cubículos	25	1450.00													
									Bibliotecas	1	140.00													
									Oficinas académicas	10	700.00													
									Oficinas administrativas	10	700.00													
									Centros de cómputo	8	560.00													
									Aulas usos múltiples	3	210.00													
									Sanitarios	12	320.00													
									Áreas comunes	6	120.00													
									TOTAL	85.00	4900.00													

\$45,344,986.00    \$15,480,722.77    \$29,864,213.23

Dr. Ricardo Villanueva Lomei  
Rector General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada  
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

2020

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Meses reportados  
**3er Trim 2020**  
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL




Escudo de la Universidad

Porcentaje de avance

**30**

PRORIDAD **1** Nombre de la obra: **Terminación del edificio de Investigación Vinculación y Transferencia del conocimiento. (CUCEA)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

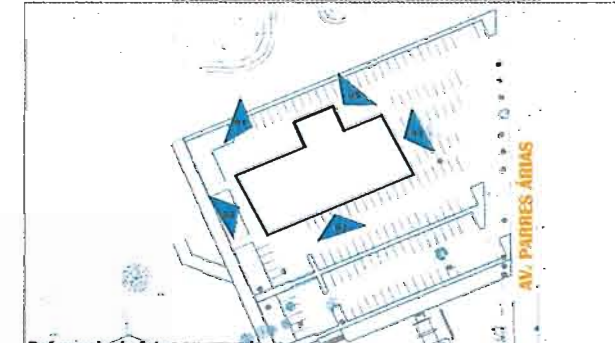

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Periférico Norte 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.

FOTOS



(01) Cisterna Principal



(02) Cisterna Secundaria (Agua Pluvial)

**Comentarios de los trabajos realizados:**

- Limpieza y deshierbe del terreno.
- Construcción de tres andadores de concreto lavado para las entradas.
- Excavación, cimbrado, armado y colado de las estructuras de cisterna principal y de cisterna secundaria (agua pluvial), descimbrado, relleno y compactación de material producto de excavaciones anteriores alrededor de las caras exteriores de los muros de la cisterna principal.
- Excavación y construcción de muro para recibir el biodigestor y la colocación del mismo.
- Escalera Principal: Excavación de cimentación, colado de zapatas y dados de cimentación, inicio del montaje de la estructura metálica.
- Escalera Secundaria: Excavación de cimentación, colado de zapatas y dados de cimentación, montaje y soldado de estructura metálica de acero, aplicación de pintura esmalte, colocación de losacero, cimbrado.
- Construcción de registros de agua potable en bajantes y de registros sanitarios, así como la conexión de los mismos.



F3: Andadores



F4: Fachada posterior



(06) Biodigestor y (07) Registros

Dr. Ricardo Villanueva Lomeli  
Rector General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de la IES

M. Esteban Piñera Estrada  
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Meses reportados  
**3er Trim 2020**  
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Estado de la universidad

Porcentaje de avance

5


PRORIDAD

2

Nombre de la obra:

Construcción de edificio de 3 niveles destinado aulas y servicios, tercera etapa, módulo uno. (CUCEI)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

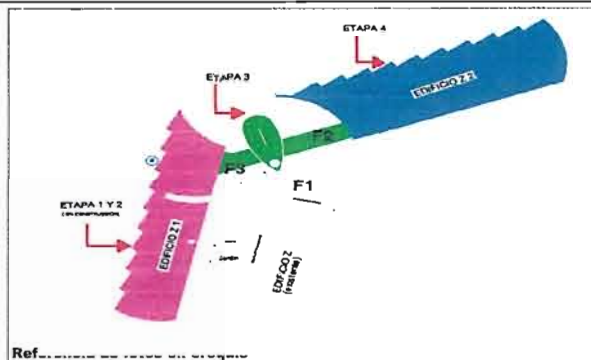

Ref...

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Boulevard Marcelino Gracia Barragán No. 1421,  
Esquina Calzada Olímpica C.P 44430, Guadalajara,  
Jalisco.

FOTOS



F1: Impermeabilización en azotes



F2: Preparación de instalaciones equipos de A/A

Comentarios de los trabajos realizados:

Estructura:

Trabajos de recubrimientos de panel durok en closet de ducto de instalaciones por cada nivel, instalación de ducto eléctrico embisagrado, instalaciones de ductería de alimentación a equipos de A/A por cada nivel.



F3: Trabajos de recubrimientos y acabados durok



F4: Ducto eléctrico sobre plafón



F5: Recubrimientos y acabados

Dr. Ricardo Villanueva Lomeli  
Rector General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de la IES

Coordinador de Servicios Generales de la Subdirección General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Meses reportados  
**3er Trim 2020**  
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL





Porcentaje de avance

**50**

PRIMORDIAL 3

Nombre de la obra: **Reforzamiento y ampliación de los Edificios P-Q que albergarán el Instituto Transdisciplinario de Investigación e Innovación en Salud (Continuación). (CUCS)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

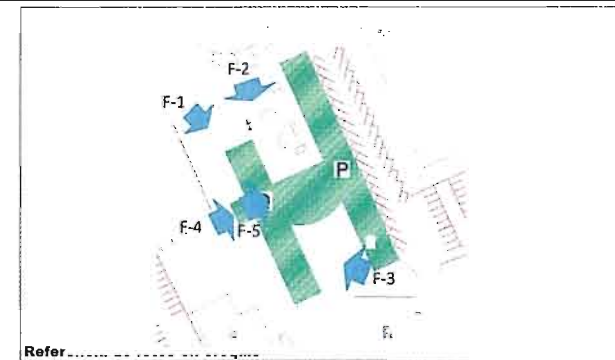

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Sierra Mojada # 950, Modulo U, Col. Independencia,  
C.P. 44340, Guadalajara, Jalisco, México

FOTOS



F1: Fachada posterior



F2: Equipos eléctricos en azoteas

Comentarios de los trabajos realizados:  
La obra lleva un avance del 50% ejecutado en esta nueva etapa , continuan los trabajos en acabados, electrnoidad, fachadas, equipos de suministros especiales, parte de su equipamiento.



F3: Avances interiores



F4: Avances interiores (2)



F5: Avances interiores (3)

Dr. Ricardo Villanueva Lomeli  
Rector General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada  
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Meses reportados  
**3er Trim 2020**  
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Estado de la universidad


Porcentaje de avance

**71**

PRIORIDAD **4**

Nombre de la obra: **Continuación del Edificio de Tutorías. (CUTONALÁ)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

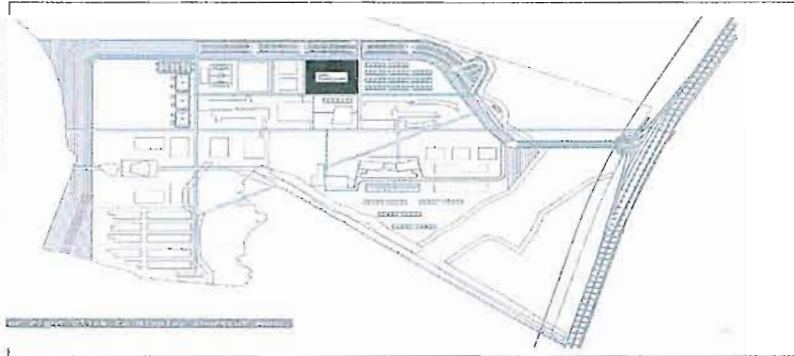

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Nuevo Periférico No. 555 Ejido San José  
Tatepozco, C.P. 45425, Tonalá Jalisco, México

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Fachada

Comentarios de los trabajos realizados:

Se realizó reforzamiento estructural, colocación de pintura primario en estructura y colocación de lamina.

Dr. Ricardo Villanueva Torres  
Rector General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Sequeira Estrada  
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
