

2020

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Meses reportados

Abril - Junio

FECHA DE CORTE: 30/06/2020

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad de Guadalajara**

Entidad federativa: Jalisco

Clave Inst 911: 14MSU0010Z

RESPONSABLES

Planeación
Nombre: Mtra. Paola Lyocette Corona Gutiérrez
Cargo: Coordinador General de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara
Teléfono: 52 (01) 33 31342214 Ext 11202
Correo electrónico: paola.corona@copladi.udg.mx

Obras y Mantenimiento
Nombre: Ing. Esteban Segura Estrada
Cargo: Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Teléfono: 52 (01) 33 31342235 Ext 1801 y 1802
Correo electrónico: esegura@redudg.udg.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Cuenta con Actas				
		Obrn de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/ Equipo	Cantidad	Metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró ?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Terminación del edificio de Investigación Vinculación y Transferencia del conocimiento. (CUCEA)	X					\$ 8,000,000.00	\$ -	\$ 8,000,000.00	Talleres	4	481.17	GLOSAL DEL PROYECTO	0			En proceso de convocatoria							
									Laboratorios	2	263.56													
										Cubículos	34	290.40												
										Aulas usos múltiples	1	79.17												
										Sanitarios	4	89.96												
										Áreas comunes	7	223.69												
										TOTAL	52	1427.95												
2	Construcción de edificio de 3 niveles destinado aulas y servicios, tercera etapa, módulo uno. (CUCEI)	X					\$ 8,500,000.00	\$ -	\$ 8,500,000.00	Aulas/salones	11	900.68	GLOSAL DEL PROYECTO	0			En proceso de convocatoria							
									Oficinas académicas	1	56.47													
										Sanitarios	2	81.88												
										Áreas comunes	4	568.90												
										Otros	2	113.54												
										TOTAL	20.00	1711.47												
3	Reforzamiento y ampliación de los Edificios P-Q que albergarán el Instituto Transdisciplinar de Investigación e Innovación en Salud (Continuación). (CUCS)	X					\$ 15,000,000.00	\$ -	\$ 15,000,000.00	Aulas/salones	9	340.35	GLOSAL DEL PROYECTO	0			En proceso de convocatoria							
									Laboratorios	12	2993.48													
										Cubículos	157	1660.36												
										Auditorios	2	441.00												
										Oficinas académicas	12	76.50												
										Aulas usos múltiples	3	124.50												
										Sanitarios	11	288.78												
										Áreas comunes	10	2229.45												
										Otros	4	443.25												
										TOTAL	220.00	8597.67												
4	Continuación del Edificio de Tutorías. (CUTONALÁ)	X					\$ 13,844,986.00	\$ -	\$ 13,844,986.00	Aulas/salones	10	700.00	GLOSAL DEL PROYECTO	0			En proceso de convocatoria							
									Cubículos	25	1450.00													
										Bibliotecas	1	140.00												
										Oficinas académicas	10	700.00												
										Oficinas administrativas	10	700.00												
										Centros de cómputo	8	560.00												
										Aulas usos múltiples	3	210.00												
										Sanitarios	12	320.00												
										Áreas comunes	6	120.00												
										TOTAL	85.00	4900.00												
							\$45,344,986.00	\$0.00	\$45,344,986.00															

Dr. Ricardo Valmueva Lomeli
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2020

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Meses reportados
Abril - Junio
FECHA DE CORTE: 30/06/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL




Escuela de la universidad

Porcentaje de avance
0

PRIMORDIAL 1 Nombre de la obra: **Terminación del edificio de Investigación Vinculación y Transferencia del conocimiento. (CUCEA)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

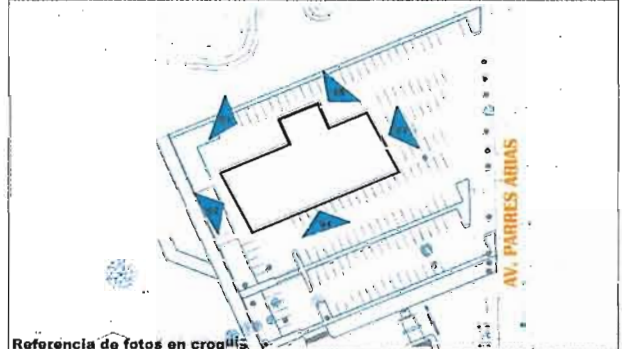

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Periférico Norte 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.

FOTOS




F1: Fachada principal



F2: Lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

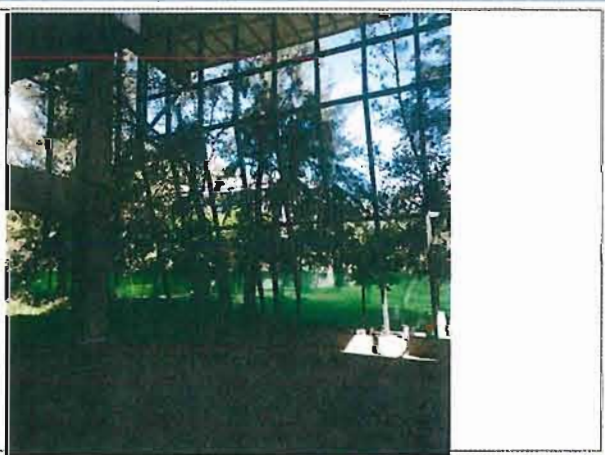

F3: interior fachada principal



F4: Fachada posterior



F5: Detalle Fachada lateral

Dr. Ricardo Vilanueva Lopez
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

M. Esteban Mora Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

*Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Meses reportados
Abril - Junio
FOLIO DE CORTE: 2019/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL




Estado de la universidad

Porcentaje de avance
0

PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Construcción de edificio de 3 niveles destinado aulas y servicios, tercera etapa, módulo uno. (CUCEI)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

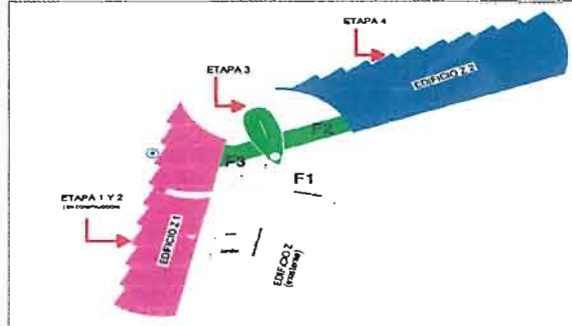

Ref...

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Boulevard Marcelino Gracia Barragán No. 1421,
Esquina Calzada Olimpica C.P 44430, Guadalajara,
Jalisco.

FOTOS



F1: Fachada principal




F2: Lateral

Comentarios de los trabajos realizados:



F3: Fachada posterior

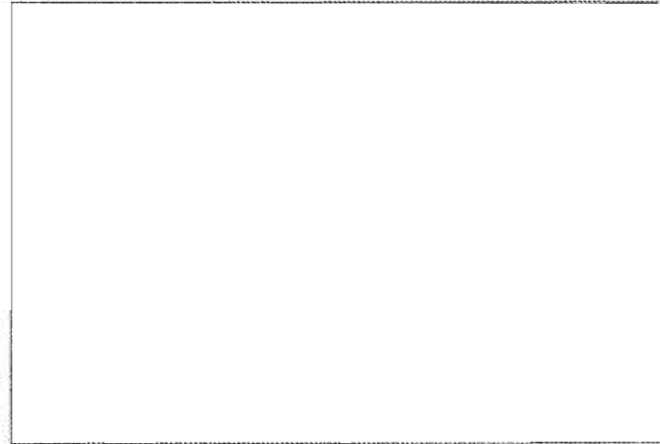

F4: Entrada

Obra no iniciada. Fotos de etapa posterior

F5: Interior de aula

[Signature]
Dr. Ricardo Villanueva Lomelí
Director General de Infraestructura de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

[Signature]
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Meses reportados

Abril - Junio

FECHA DE CORTE: 30/06/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0


PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Reforzamiento y ampliación de los Edificios P-Q que albergarán el Instituto Transdisciplinar de Investigación e Innovación en Salud (Continuación). (CUCS)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

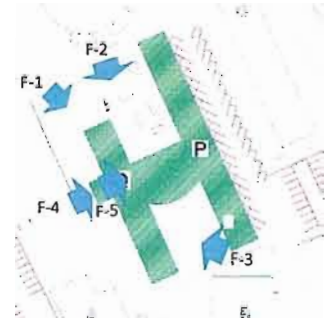

Refer

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Sierra Mojada # 950, Modulo U, Col. Independencia, C.P. 44340, Guadalajara, Jalisco, México

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Fachada Lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

La obra lleva un avance del 90% en cuestión de albañilerías, faltan partidas de acabados electricidad, aire acondicionado, agua, equipos de suministros especiales, parte de su equipamiento.



F3: Fachada posterior



F4: Fachada principal (2)



F5: Interior de edificio

Dr. Ricardo Villagueva Lomelí
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Figueroa Esqueda
Coordinador de los Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

*Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Meses reportados

Abril - Junio

FECHA DE CORTE: 30/05/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Estado de la universidad

Porcentaje de avance


0

PRIORIDAD

4

Nombre de la obra: **Continuación del Edificio de Tutorías. (CUTONALÁ)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

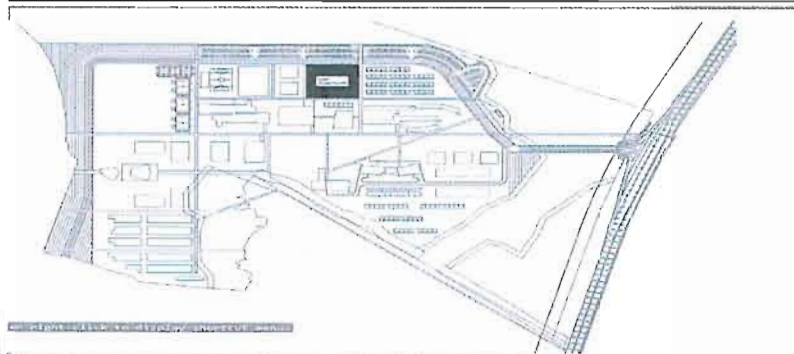

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Nuevo Periférico No. 555 Ejido San José
Tatepozco, C.P. 45425, Tonalá Jalisco, México

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Lateral

Comentarios de los trabajos realizados:



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Fachada

Dr. Alejandro Manueta Lopez
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

*Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una peslaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
