

2018

ANO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Agosto
FECHA DE CORTE: 25/08/18

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Nombre: Universidad de Guadalajara

Entidad federativa: Jalisco

Clave Inst 911: 14MSU00102

Planeación

Nombre: Mtro. Rubén Juan Sebastián García Sánchez
Cargo: Coordinador General de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara
Teléfono: 52 (01) 33 31342214 Ext 11202
Correo electrónico: ruben.garcia.sanchez@copladi.udg.mx

Obras y Mantenimiento

Nombre: Ing. Esteban Segura Estrada
Cargo: Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Teléfono: 52 (01) 33 31342235 Ext 1801 y 1802
Correo electrónico: esegura@redudg.udg.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas																						
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/ Equipo	Cantidad	Metros cuadrados				¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró ?			Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa																						
1	Conclusión de módulo A (4 aulas y pasillo de intercomunicación) en la planta alta del Centro Universitario de la Ciénega, sede Atotonilco (CUCIENEGA) FAM 2019 P-2		X				\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ 4,000,000.00	Aulas/Salones	4	256.00	LI-001-CUCIENEGA-FAM-2018	Licitación	0	10/09/18	23/11/18	Obra en proceso de licitación																										
										Áreas comunes	1	32.00																																
										TOTAL	5	288.00																																
2	2 Instalación de luminarias led, fotoceldas y paneles solares en las instalaciones del Sistema de Universidad Virtual. (SUV) FAM 2018 P-36				X		\$ 1,211,625.00	\$ -	\$ 1,211,625.00	Paneles solares y estructura	84	0.00	LI-003-CUCEA-2018	Licitación	0			En integración de catalogos de conceptos.																										
										Lámparas led de 30 watts	12	0.00																																
										Tubos led 9 watts	500	0.00																																
										Instalación y mano de obra de paneles	84	0.00																																
										Instalación y mano de obra de lámparas led 30w	12	0.00																																
										Instalación y mano de obra de tubos led 9w	500	0.00																																
TOTAL	1192.00	0.00																																										
3	Edificio de Investigación (Vinculación y Transferencia del Conocimiento) (CUCEA) FAM 2019 P-11	X					\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ 4,000,000.00	Cubículos	60	1269.44	LI-003-CUCEA-2018	Licitación	0	10/09/18	30/11/18	Obra en proceso de licitación																										
										Sanitarios	4	117.00																																
										Áreas comunes	2	544.11																																
										TOTAL	66.00	1930.55																																
										4	CULAGOS Sustentable (CULAGOS) FAM 2019 P-14															X		\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00	Sistema de captación solar	2	0.00	LI-OBRA-002-CUCBA-2018	Licitación	0			En integración de catalogos de conceptos.					
																															Captación pluvial	1	0.00											
TOTAL	3.00	0.00																																										
5	Equipamiento de Mobiliario especializado para laboratorios de aprendizaje del Centro Universitario de los Valles (CUVALLES) FAM 2018 P-6 (ajuste de monto)	X					\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00				Mesa plegable para aula con características especiales	383	0.00	LI-OBRA-002-CUCBA-2018	Licitación	0			En integración de catalogos de conceptos.																							
										Silla para aula con características especiales	751	0.00																																
										TOTAL	1134.00	0.00																																
										6	Centro de Recursos Informativos - CERI- Tercera Etapa (CUCBA). (CUCBA) FAM 2019 P-16	X													\$ 4,600,000.00	\$ -	\$ 4,600,000.00	Bibliotecas	2	950.00				LI-OBRA-002-CUCBA-2018	Licitación	0	10/09/18	30/11/18	Obra en proceso de licitación					
Oficinas administrativas	6	200.00																																										
Aulas didácticas	5	400.00																																										
Sanitarios	4	300.00																																										
Áreas comunes	10	1380.00																																										
Otros	5	1400.00																																										
TOTAL	32.00	4630.00																																										
7	Continuación de Remodelación Clínica Escuela en el Centro Universitario del Sur (etapa 2) (CUSUR) FAM 2018 P-17	X					\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ 4,000,000.00	Áreas comunes	7	160.55	LI-002-CUSUR-2018	Licitación	0	10/09/18	05/12/18	Obra en proceso de licitación																										
										Otros	16	312.13																																
										TOTAL	23.00	472.68																																
										8	Continuación de la construcción de nuevas instalaciones para el Laboratorio de Psicología y Educación Especial (CUCS) FAM 2018 P-3	X																\$ 4,200,000.00	\$ -	\$ 4,200,000.00	Talleres	3	48.00	LI-FAM-CUCS-001-2018	Licitación	0	10/09/18	05/12/18	Obra en proceso de licitación					
																															Cubículos	17	112.00											
																															Bibliotecas	1	18.00											
Oficinas administrativas	3	81.00																																										
Aulas usos múltiples	1	20.00																																										
Aulas didácticas	1	10.00																																										
TOTAL	39.00	588.00																																										
9	Continuación de Construcción Sede Tomatlán del Centro Universitario de la Costa, Edificio C. (CUCOSTA) FAM 2018 P-7 (ajuste de monto)	X					\$ 4,500,000.00	\$ -	\$ 4,500,000.00	Sanitarios	5	46.00	LI-002-CUCOSTA-2018	Licitación	0	10/09/18	03/12/18	Obra en proceso de licitación																										
										Áreas comunes	5	244.00																																
										Otros	3	9.00																																
										TOTAL	39.00	588.00																																
										10	Construcción de edificio bioclimático de laboratorios para el Departamento de Ciencias de la Salud, del Centro Universitario de la Costa Sur, sede Anonas (CUCOSTASUR) FAM 2018 P-11															X		\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00	Áreas comunes	7	160.55	LI-003-CUCS-001-2018	Licitación	0	10/09/18	03/12/18	Obra en proceso de licitación					
																															Otros	16	312.13											
TOTAL	23.00	472.68																																										
11	Cuarta etapa de la construcción del Auditorio del Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño (CUAAD) FAM 2018 P-16	X					\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ 4,000,000.00				Preeliminación de instalaciones sustentables: pvc con contenido de biocidas (polipropileno, polibutileno y polietileno)	855	0.00	LI-001-CUAAD-FAM-2018	Licitación	0	10/09/18	23/11/18	Obra en proceso de licitación																							
													Cimentación y estructura: materiales naturales de banco mejorados con cementantes	634	0.00																													
													TOTAL	1489.12	0.00																													
										12	Obras exteriores y conectividad del Edificio de Laboratorio de Ingenierías (CUNORTE) FAM 2019 P-25	X													\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	Auditorios	1	720.00				LI-002-FAM-CUCEI-2018	Licitación	0	10/09/18	28/11/18	Obra en proceso de licitación					
																												TOTAL	1.00	720.00														
																												Talleres	2	210.00														
Laboratorios	12	680.00																																										
Oficinas académicas	1	26.00																																										
Aulas didácticas	3	156.00																																										
TOTAL	27.00	1992.00																																										
13	Laboratorio de Química, quinta etapa. (CUCEI) FAM 2018 P-22	X					\$ 4,532,644.16	\$ -	\$ 4,532,644.16	Sanitarios	5	817.39	LI-001-CUNORTE-2018/OBRAS	Licitación	0	10/09/18	04/12/18	Obra en proceso de licitación																										
										Cubículos	12	436.39																																
										Sanitarios	4	41.51																																
										Otros	12	904.71																																
										TOTAL	33.00	2200.00																																

\$45,544,269.16

\$0.00

\$45,544,269.16

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro

Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada

Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturarán los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2018

AÑO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Agosto

FECHA DE CORTE: 25/08/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

 Escudo de la universidad Porcentaje de avance 0	PRIORIDAD 1	Nombre de la obra: Conclusión de módulo A (4 aulas y pasillo de intercomunicación) en la planta alta del Centro Universitario de la Ciénega, sede Atotonilco (CUCIENEGA) FAM 2019 P-2
	CROQUIS DE LOCALIZACIÓN	
		
UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO Av. Universidad, No.1115, Col. Lindavista, Código Postal 47820, Ocotlán, Jalisco. México.		

FOTOS



F1: Fachada principal




F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

Se muestran imágenes en donde se proyecta realizar la conclusión del módulo A., Actualmente se encuentra en proceso de licitación la obra.

 Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
 Rector General de la Universidad de Guadalajara
 Nombre y firma del Titular de la IES

 Ing. Esteban Segura Estrella
 Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Julio

FECHA DE CORTE: 20/07/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




PRIORIDAD

2

Nombre de la obra:

Instalación de luminarias led, fotoceldas y paneles solares en las instalaciones del Sistema de Universidad Virtual. (SUV) FAM 2018 P-36

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

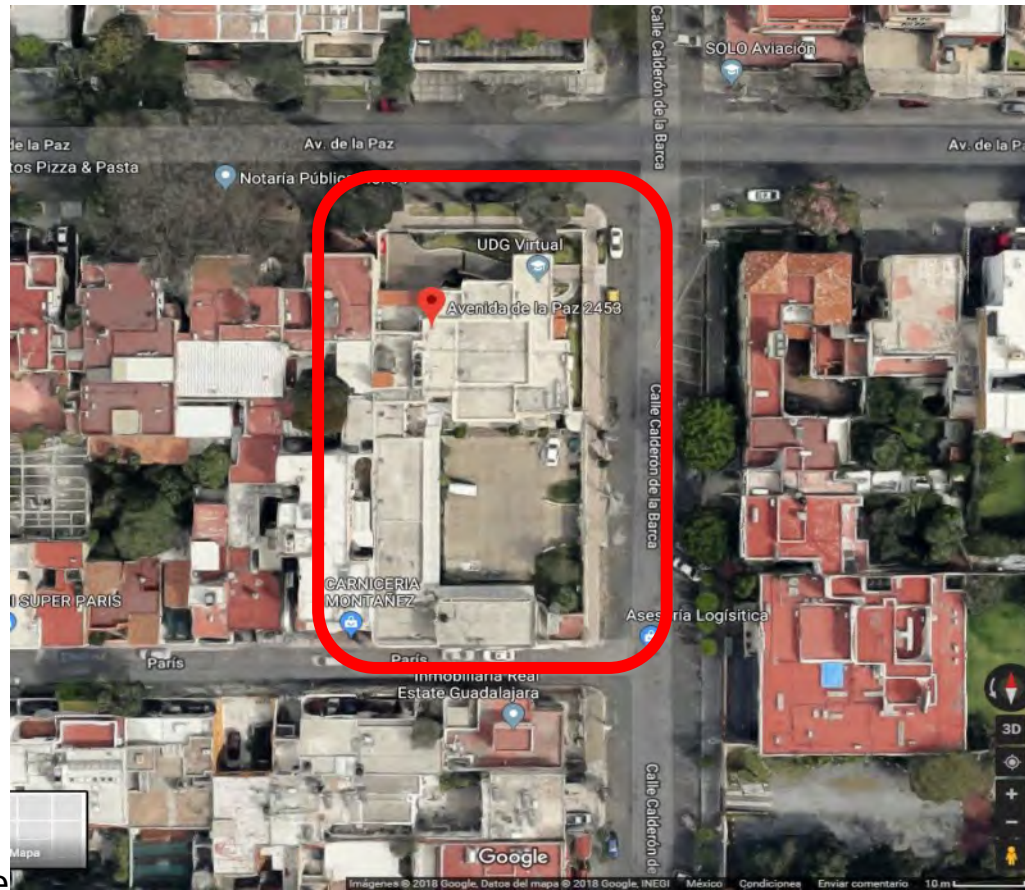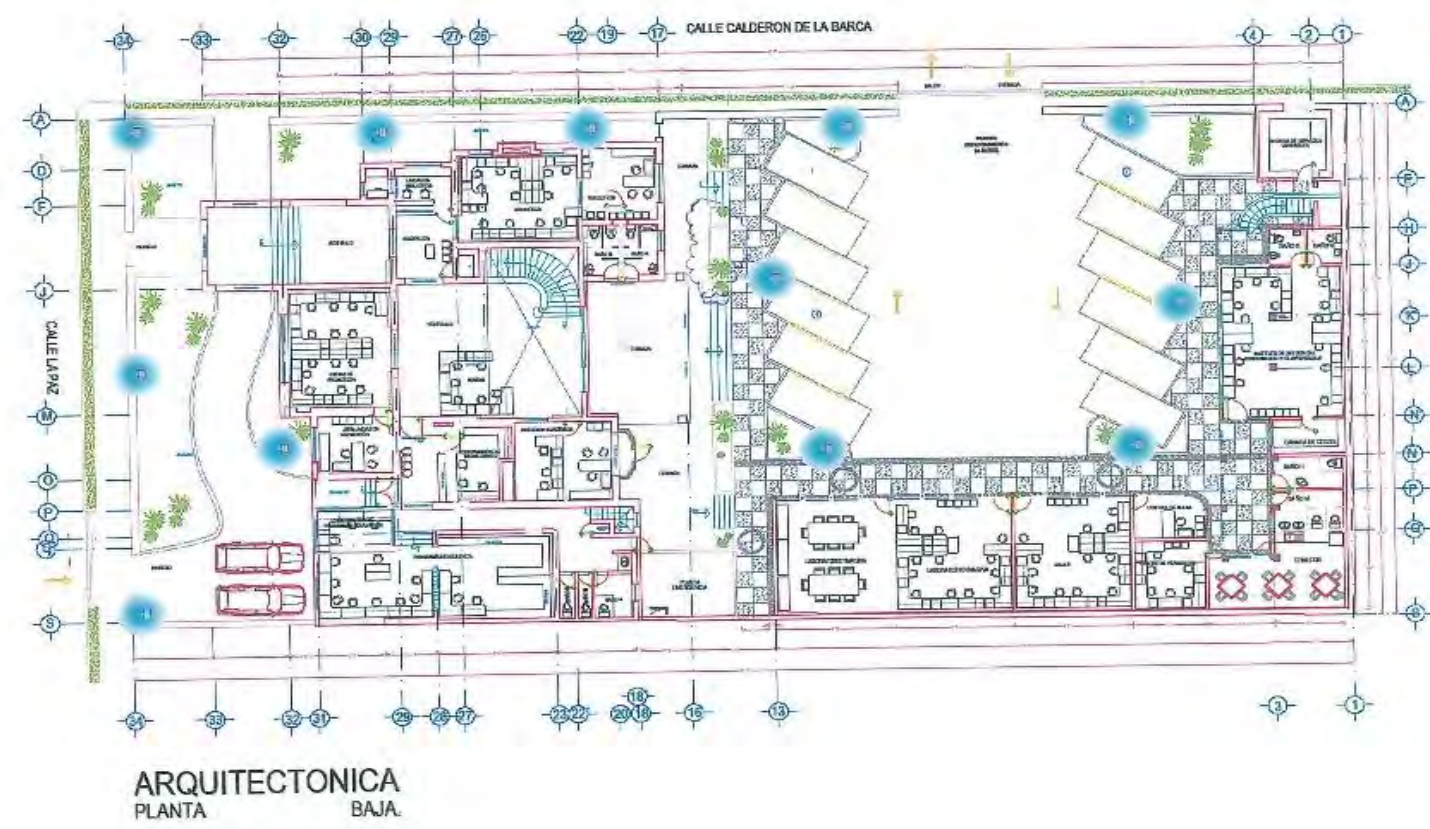

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. La Paz No. 2453
Col. Arcos Sur, C.P. 44130
Guadalajara, Jalisco.



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:




Se adjuntan imágenes de la propiedad en donde proyecta realizar el suministro de fotoceldas y paneles solares, así como una imagen de la azotea.

Adicionalmente se construye el nuevo módulo de oficinas, en su azotea se instalarán parte de los paneles solares, por el momento se encuentra en etapa de demoliciones.

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

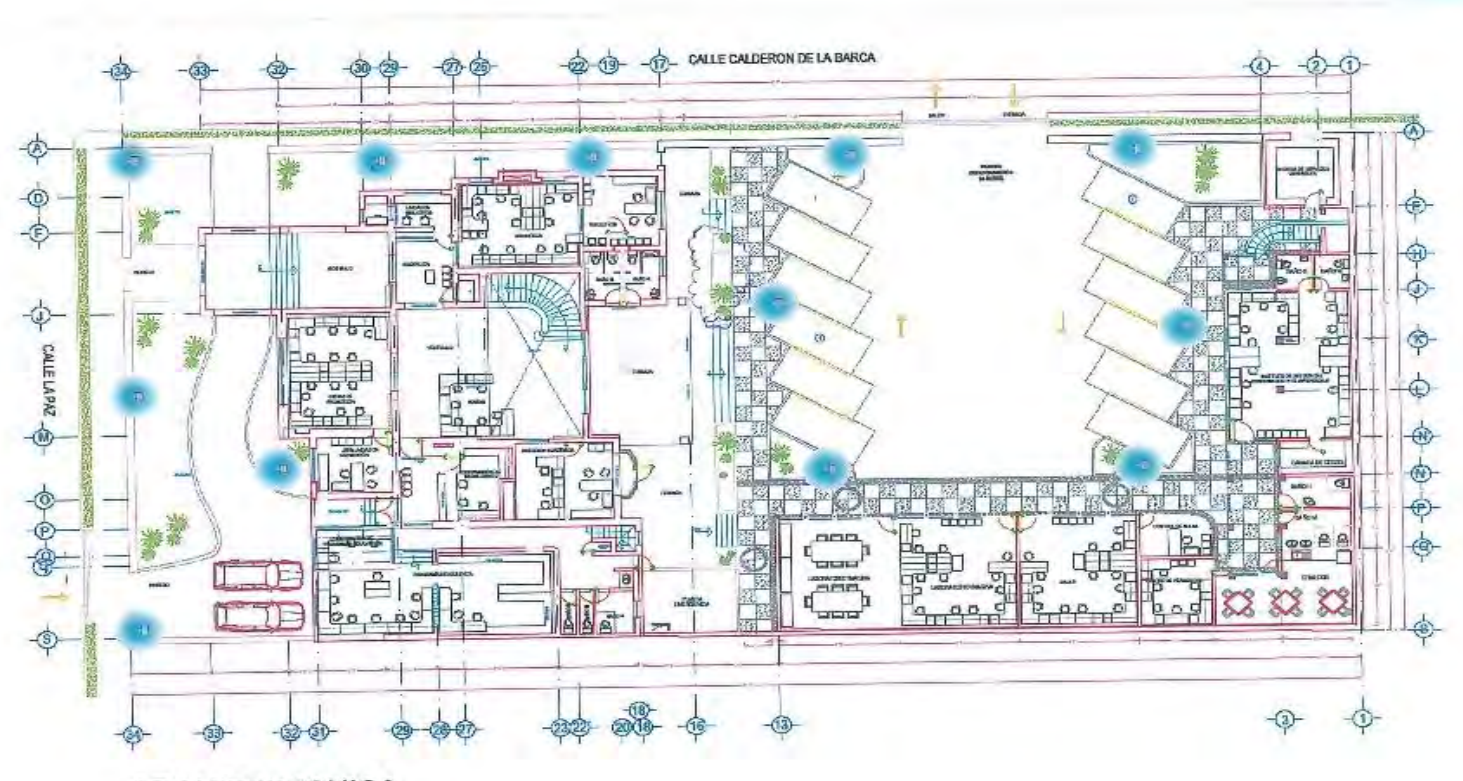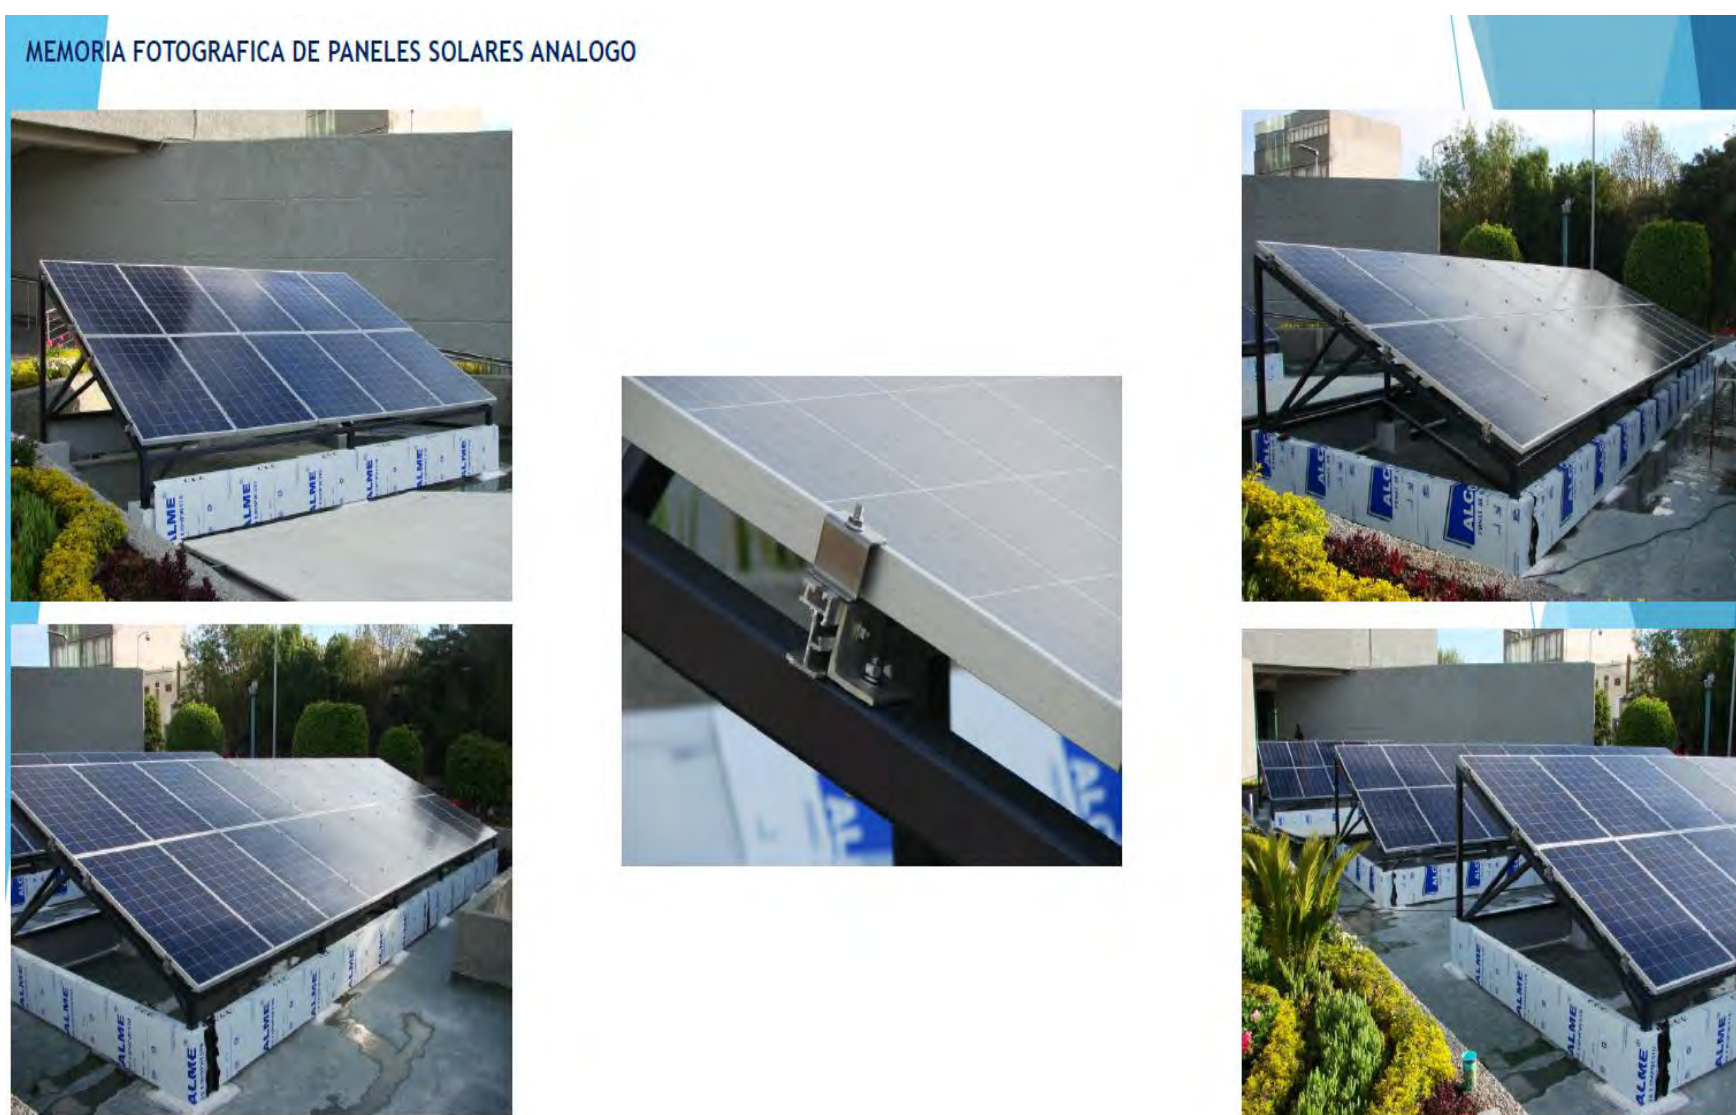2018		FAM		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Mes reportado Agosto FECHA DE CORTE: 25/08/18	
AÑO		FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL			
 Escudo de la universidad		PRIORIDAD 2		Nombre de la obra: Instalación de luminarias led, fotoceldas y paneles solares en las instalaciones del Sistema de Universidad Virtual. (SUV) FAM 2018 P-36			
Porcentaje de avance		CROQUIS DE LOCALIZACIÓN		UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO			
0		 ARQUITECTONICA PLANTA SUVA		 Referencia de la obra en croquis		Av. La Paz No. 2453 Col. Arcos Sur, C.P. 44130 Guadalajara, Jalisco.	
FOTOS							
 CASA S.U.V. SEDE LA PAZ, ANALISIS DE ÁREAS PARA PANELES SOLARES		 MEMORIA FOTOGRÁFICA DE PANELES SOLARES ANALOGO		Comentarios de los trabajos realizados: Se adjuntan imagenes de la propiedad en donde proyecta realizar el suministro de fotoceldas y paneles solares, así como una imagen de la azotea. Adicionalmente se construye el nuevo modulo de oficinas, en su azotea se instalarán parte de los paneles solares, por el momento s encuentra en etapa de demoliciones.			
Análisis de área para paneles solares		Memoria Fotográfica de paneles solares análogo					
 Ubicación de alumbrado para áreas públicas de la casa.		 Ubicación de alumbrado para áreas públicas de la casa.		 MODELOS PROPUESTOS PARA LUMINARIA			
Ubicación de alumbrado para áreas públicas de la casa		Ubicación de alumbrado para áreas públicas de la casa		Modelos propuestos para luminaria			
 Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro Rector General de la Universidad de Guadalajara Nombre y firma del Titular de la IES				 Ing. Esteban Segura Estrada Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES			
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.							

2018 AÑO		FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Mes reportado Agosto FECHA DE CORTE: 25/08/18	
REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL							
Escudo de la universidad Porcentaje de avance 0		PRIORIDAD3Nombre de la obra:Edificio de Investigación (Vinculación y Transferencia del Conocimiento) (CUCEA) FAM 2019 P-11 CROQUIS DE LOCALIZACIÓN Referencia de fotos en croquis UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO Periférico Norte 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.					
FOTOS							
F1: Fachada principal		F2: lateral		Comentarios de los trabajos realizados: Se adjutan imágenes de los avances que se tienen en la etapa previa, en donde se proyecta la continuidad de la construcción del edificio de Investigación con recursos del FAM 2018 Se publica convocatoria de licitación.			
F3: Fachada posterior		F4: Entrada		F5: Interior de aula			
Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro Rector General de la Universidad de Guadalajara Nombre y firma del Titular de la IES		Ing. Esteban Segura Estrada Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES					
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.							

2018 AÑO		FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Mes reportado Agosto FECHA DE CORTE: 25/08/18	
REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL							
Escudo de la universidad Porcentaje de avance 0		PRIORIDAD 4 Nombre de la obra: CULAGOS Sustentable (CULAGOS)		FAM 2019 P-14		UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO Enrique Díaz de León No. 1144, Colonia Paseos de la Montaña C.P. 47460. Lagos de Moreno, Jalisco, México	
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN Referencia de:							
FOTOS							
F1: Fachada principal		F2: lateral		Comentarios de los trabajos realizados: Se muestran imágenes de los espacios a intervenir con los temas de sustentabilidad. Actualmente se analizan las prioridades y el catálogo de conceptos.			
F3: Fachada posterior		F4: Entrada		F5: Interior de aula			
Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro Rector General de la Universidad de Guadalajara Nombre y firma del Titular de la IES		Ing. Esteban Segura Estrada Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES					
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.							

2018 AÑO		FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Mes reportado Agosto FECHA DE CORTE: 25/08/18	
REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL							
Escudo de la universidad		PRIORIDAD 5		Nombre de la obra: Equipamiento de Mobiliario especializado para laboratorios de aprendizaje del Centro Universitario de los Valles (CUVALLES) FAM 2018 P-6 (ajuste de monto)			
Porcentaje de avance 0		CROQUIS DE LOCALIZACIÓN				UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO Carretera Guadalajara - Ameca Km. 45.5, C.P. 46600, Ameca, Jalisco, México.	
FOTOS							
				Comentarios de los trabajos realizados: Se presentan estas fotografías como referencia para la adquisición de mobiliario especializado para los laboratorios de aprendizaje en el CUValles			
Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro Rector General de la Universidad de Guadalajara Nombre y firma del Titular de la IES		Ing. Esteban Segura Estrada Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES					
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.							

2018

AÑO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Agosto

FECHA DE CORTE: 25/08/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance


0

PRIORIDAD

6

Nombre de la obra: Centro de Recursos Informativos -CERI- Tercera Etapa (CUCBA). (CUCBA) FAM 2019 P-16

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

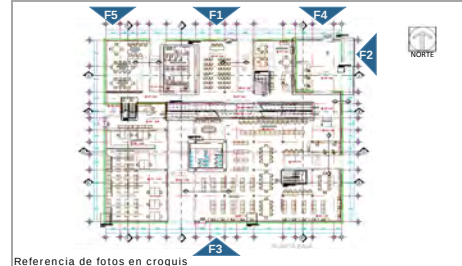

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

C. Ramón Padilla Sánchez #2100 Nextipac, Zapopan, Jalisco, México

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

1.- Se muestran imágenes de los avances que se tienen en la etapa previa, Trazo y nivelación, cimentación y Estructura de acero. La obra del FAM 2018, se encuentra en proceso de licitación.

Los trabajos que se realizarán en esta tercera etapa son la habilitación de la estructura de la cubierta del Nivel 1 y del Nivel 2.

 Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
 Rector General de la Universidad de Guadalajara
 Nombre y firma del Titular de la IES

 Dr. Esteban Segura Estrada
 Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO


FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Agosto
 FECHA DE CORTE: 25/08/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

 Escuela de la universidad Porcentaje de avance 0	PRIORIDAD 7	Nombre de la obra: Continuación de Remodelación Clínica Escuela en el Centro Universitario del Sur (etapa 2) (CUSUR)	FAM 2018 P-17
	CROQUIS DE LOCALIZACIÓN		UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO
			
		Referencia de fotos en croquis	
Av. Enrique Arreola Silva No. 883, colonia centro C.P. 49000, Ciudad Guzmán, Jalisco, México.			

FOTOS




F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada

Comentarios de los trabajos realizados:

Ya se encuentra en proceso de licitación la obra a realizar con el FAM 2018

F5: Interior de aula

 Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
 Rector General de la Universidad de Guadalajara
 Nombre y firma del Titular de la IES

 Mtro. Esteban Segura Estrada
 Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Agosto
 FECHA DE CORTE: 25/08/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


PRIORIDAD

8

Nombre de la obra:

Continuación de la construcción de nuevas instalaciones para el Laboratorio de Psicología y Educación Especial (CUCS) FAM 2018 P-3

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

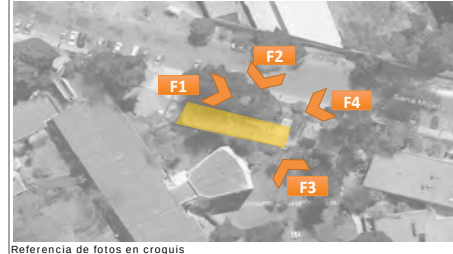

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

 Sierra Mojada # 950, Modulo U, Col. Independencia,
 C.P. 44340, Guadalajara, Jalisco, México


Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0

FOTOS



F1: Fachada principal




F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada

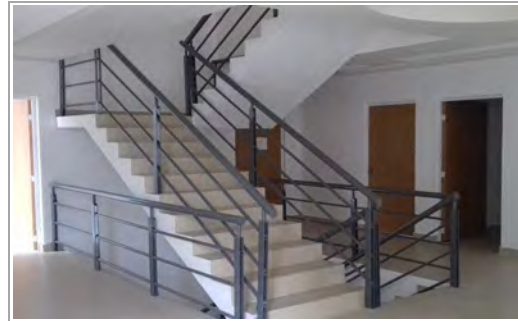

F5: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

Se muestran imágenes de la etapa previa del Laboratorio de Psicología y Educación Especial, en donde se proyecta continuar la obra con recursos del FAM 2018.

Ya se encuentra en proceso de licitación.

El área de los trabajos a realizar son en TODO el modulo, dado que solo se dejaron en la etapa previa canalizaciones para el aire acondicionado, sin embargo no se colocó ninguna unidad evaporadora o condensadora en todo el edificio. Lo mismo ocurre con la instalación de los equipos de CCTV, los trabajos de iluminación se realizarán en el perímetro del edificio.

 Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
 Rector General de la Universidad de Guadalajara
 Nombre y firma del Titular de la IES

 Ing. Leticia Segura Estrada
 Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.

Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Agosto
 FECHA DE CORTE: 25/08/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

9

Nombre de la obra:

Continuación de Construcción Sede Tomatlán del Centro Universitario de la Costa, Edificio C. (CUCOSTA) FAM 2018 P-7 (ajuste de monto)



CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0

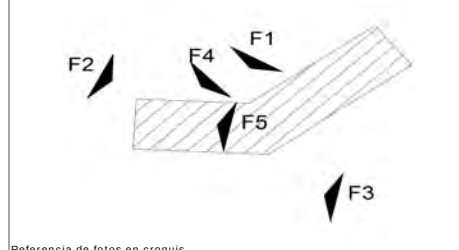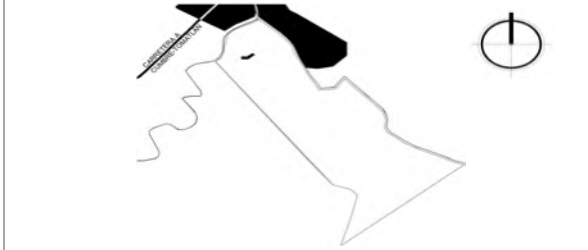

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera La Cumbre - Tomatlán, km. 2.116, Tomatlán, Jalisco.

FOTOS



F1: Fachada principal




F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada

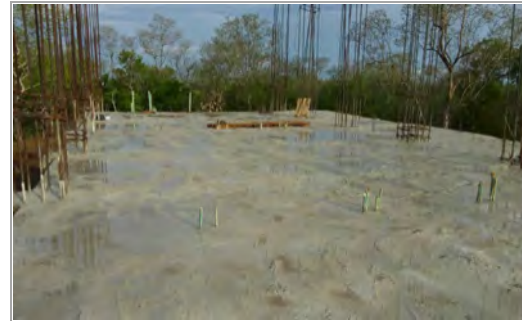

F5: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:





Se muestran imágenes de la etapa previa, en donde se proyecta continuar con la construcción de la obra.

Ya se encuentra en proceso de licitación la obra autorizada con recursos del FAM 2018

 Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
 Rector General de la Universidad de Guadalajara
 Nombre y firma del Titular de la IES

 Ing. Esteban Sengra Estrada
 Coordinador de Servicios Generales de la Universidad de Guadalajara
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

 * Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

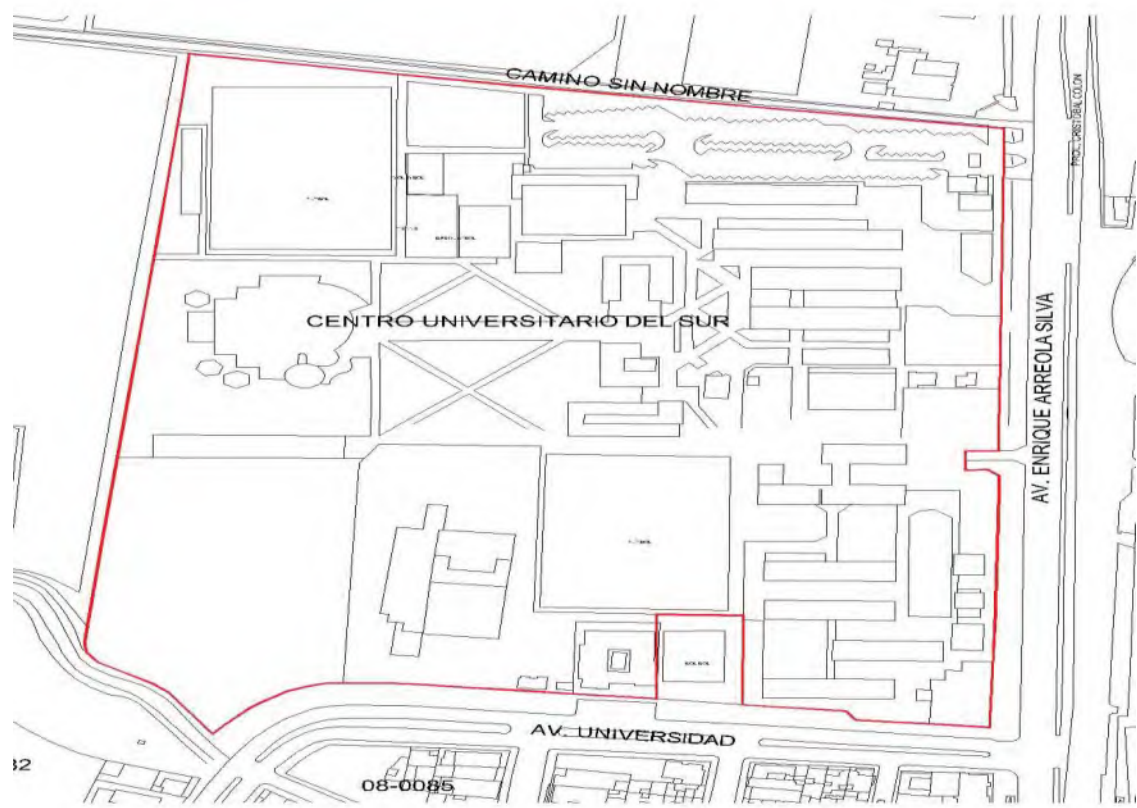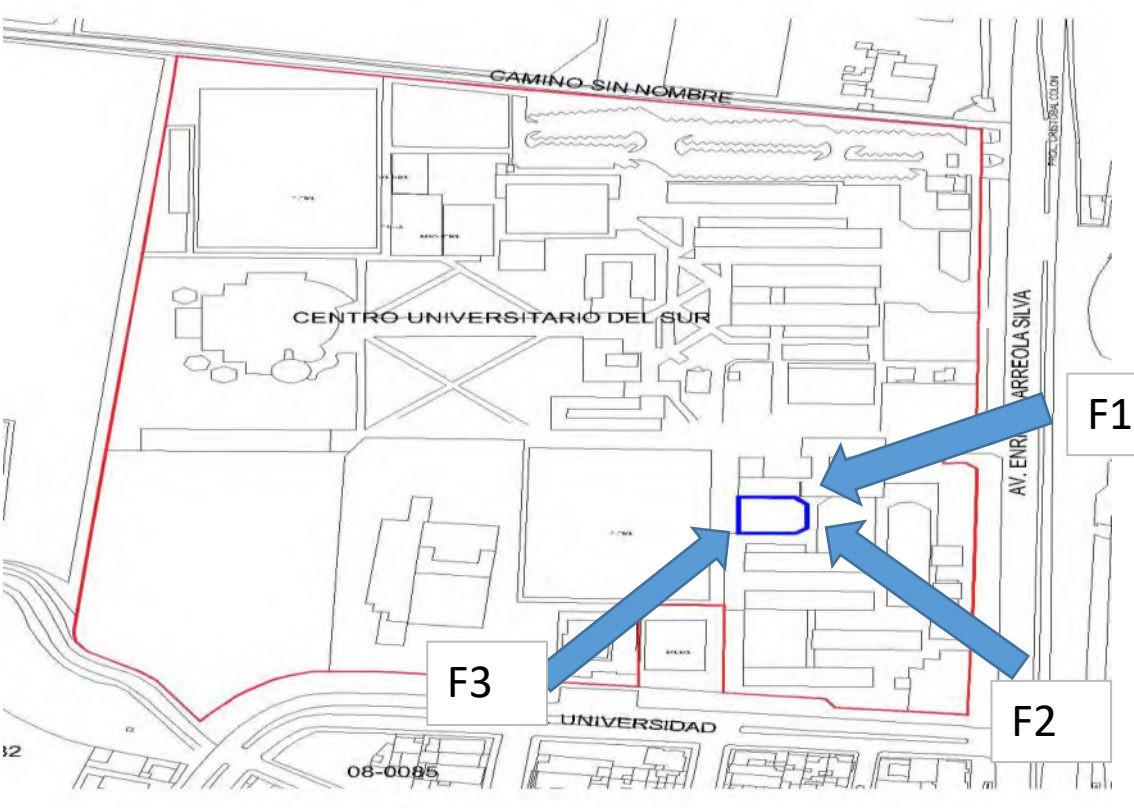2018 AÑO		FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Mes reportado Agosto FECHA DE CORTE: 25/08/18	
REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL							
 Escudo de la universidad Porcentaje de avance 0		PRIORIDAD 7		Nombre de la obra: Continuación de Remodelación Clínica Escuela en el Centro Universitario del Sur (etapa 2) (CUSUR)		FAM 2018 P-17	
		CROQUIS DE LOCALIZACIÓN					
						UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO Av. Enrique Arreola Silva No. 883, colonia centro C.P. 49000, Ciudad Guzmán, Jalisco, México.	
Fotos de referencia en croquis							
FOTOS							
				Comentarios de los trabajos realizados: Ya se encuentra en proceso de licitación la obra a realizar con el FAM 2018			
F1: Fachada principal		F2: lateral					
							
F3: Fachada posterior		F4: Entrada					
							
		Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro Rector General de la Universidad de Guadalajara Nombre y firma del Titular de la IES		Inge. Esteban Segura Estrada Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES			
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.							

2018 AÑO		FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Mes reportado Agosto FECHA DE CORTE: 25/08/18	
REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL							
Escudo de la universidad Porcentaje de avance 0		PRIORIDAD8Nombre de la obra:Continuación de la construcción de nuevas instalaciones para el Laboratorio de Psicología y Educación Especial (CUCS) FAM 2018 P-3 CROQUIS DE LOCALIZACIÓN UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO Sierra Mojada # 950, Modulo U, Col. Independencia, C.P. 44340, Guadalajara, Jalisco, México					
FOTOS							
F1: Fachada principal		F2: lateral		Comentarios de los trabajos realizados: Se muestran imágenes de la etapa previa del Laboratorio de Psicología y Educación Especial, en donde se proyecta continuar la obra con recursos del FAM 2018 Ya se encuentra en proceso de licitación. El área de los trabajos a realizar son en TODO el modulo, dado que solo se dejaron en la etapa previa canalizaciones para el aire acondicionado, sin embargo no se colocó ninguna unidad evaporadora o condensadora en todo el edificio. Lo mismo ocurre con la instalación de los equipos de CCTV, los trabajos de iluminación se realizarán en el perímetro del edificio.			
F3: Fachada posterior		F4: Entrada		F5: Interior de aula			
Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro Rector General de la Universidad de Guadalajara Nombre y firma del Titular de la IES		Ing. Esteban Segura Estrada Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES					
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.							

2018		FAM		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Mes reportado Agosto FECHA DE CORTE: 25/08/18	
ANO		FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL			
PRIORIDAD		9		Nombre de la obra: Continuación de Construcción Sede Tomatlán del Centro Universitario de la Costa, Edificio C. (CUCOSTA) FAM 2018 P-7 (ajuste de monto)			
Escudo de la universidad		CROQUIS DE LOCALIZACIÓN		UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO			
Porcentaje de avance		0		Carretera La Cumbre - Tomatlán, km. 2.116, Tomtlán, Jalisco.			
		Referencia de fotos en croquis					
FOTOS							
				Comentarios de los trabajos realizados: Se muestran imágenes de la etapa previa, en donde se proyecta continuar con la construcción de la obra. Ya se encuentra en proceso de licitación la obra autorizada con recursos del FAM 2018			
F1: Fachada principal		F2: lateral					
F3: Fachada posterior		F4: Entrada		F5: Interior de aula			
Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro Rector General de la Universidad de Guadalajara Nombre y firma del Titular de la IES				Ing. Esteban Segura Estrada Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES			
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.							

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLESDIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Agosto

FECHA DE CORTE: 25/08/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD

10

Nombre de la obra:

Construcción de edificio bioclimático de laboratorios para el Departamento de Ciencias de la Salud, del Centro Universitario de la Costa Sur, sede Anonas (CUCOSTASUR) FAM 2018 P-11

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Camino de Capaya S/N, Colonia Castellón, Autlán,
Independencia Nacional #151
C.P. 48900, Autlán, Jalisco, México.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

Se adjuntan imágenes y renders de la proyección de construcción para el FAM 2018. Misma que ya se encuentra en su proceso de licitación.

En una superficie de desplante de 1,013.45 m2 la presente etapa (primera) considera los trabajos de excavaciones, movimientos de tierra, cimentación y un 10% de la estructura del inmueble la cual es a base de concreto y acero de refuerzo. Este proyecto forma parte y es continuidad del plan maestro de sede "Las Anonas".

Iniciar con esta obra sustentable y bioclimática busca minimizar el impacto, entre otros, de la huella de carbono generada por el ser humano y contribuir con el medio físico natural a través del uso de las tecnologías amigables con el ambiente aplicadas en su proceso de construcción. Permitir la edificación de obras sustentables coadyuvan a minimizar el impacto al medio físico natural estableciendo, a través de sistemas de ahorro de energía, captación de agua de lluvia y otras tecnologías verdes, el impulso sustentable a efecto de contribuir a revertir el cambio climático.

El disponer de este inmueble, busca contribuir al fortalecimiento de la formación y capacitación de profesionales en el campo de la Salud, respondiendo a una importante demanda de la sociedad en la región Costa Sur del Estado. Permitiendo incrementar a 400 alumnos adicionales para la recepción de alumnos inscritos en estos P.E., además de beneficiar a 57 profesores de tiempo completo, medio tiempo y asignatura que corresponden a estos Programas Educativos

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IESIng. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Agosto

FECHA DE CORTE: 25/08/18



REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

11

Nombre de la obra: Cuarta etapa de la construcción del Auditorio del Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño (CUAAD) FAM 2018 P-16

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

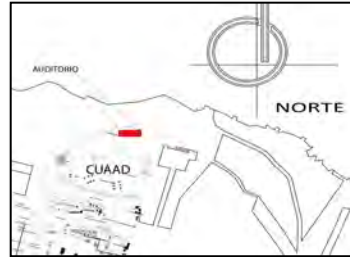

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

 Calzada Independencia Norte no. 5075, Col. Huentitán
 El Bajo, C.P.44250 Guadalajara, Jal.


Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

Se adjuntan imágenes de la etapa previa en donde se proyecta construir la 4a etapa de la construcción del Auditorio con recursos del FAM 2018, mismo que ya se encuentra en proceso de licitación.

 Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
 Rector General de la Universidad de Guadalajara
 Nombre y firma del Titular de la IES

 Dr. Esteban Segura Estrada
 Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

 * Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Agosto

FECHA DE CORTE: 25/08/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

0



PRIORIDAD

12

Nombre de la obra:

 Obras exteriores y conectividad del Edificio de Laboratorio de Ingenierías (CUNORTE)
 FAM 2019 P-25

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

 Carretera Federal No. 23, Km. 191, C.P. 46200,
 Colotlán, Jalisco, México

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula


 Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
 Rector General de la Universidad de Guanajuato
 Nombre y firma del Titular de la IES

 Ing. Esteban Segura Estrada
 Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guanajuato
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Agosto
 FECHA DE CORTE: 25/08/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD



13

Nombre de la obra:

Laboratorio de Química, quinta etapa. (CUCEI)

FAM 2018 P-22

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

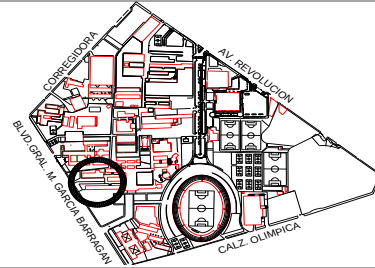

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

 Boulevard Marcelino Gracia Barragan No. 1421, Esquina
 Calzada Olímpica C.P 44430, Guadalajara, Jalisco.


Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

Se muestran imágenes de la etapa previa, en donde se proyecta desarrollar la obra autorizada con recursos del FAM 2018. Misma que ya se encuentra en proceso de licitación.

 Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
 Rector General de la Universidad de Guadalajara
 Nombre y firma del Titular de la IES

 Ing. Esteban Segura Estrada
 Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
