

2018

AÑO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

 Mes reportado
Octubre

FECHA DE CORTE: 25/10/18

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad de Guadalajara**

Entidad federativa: Jalisco

Clave Inst 911: 14MSU010Z

RESPONSABLES

Planeación

 Nombre: Mtro. Rubén Juan Sebastián García Sánchez
 Cargo: Coordinador General de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara
 Teléfono: 52 (01) 33 31342214 Ext 11202
 Correo electrónico: ruben.garcia.sanchez@copiadi.udg.mx

Obras y Mantenimiento

 Nombre: Ing. Esteban Segura Estrada
 Cargo: Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
 Teléfono: 52 (01) 33 31342235 Ext 1801 y 1802
 Correo electrónico: esegura@redudg.udg.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada				
		Obra de construcción	Equipo	Adquisición y/o mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/ Equipo	Cantidad	Metros cuadrados				Inicio	Término			Cuenta con Actas				
																				¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Conclusión de módulo A (4 aulas y pasillo de intercomunicación) en la planta alta del Centro Universitario de la Ciénega, sede Atotonilco (CUCIENEGA) FAM 2019 P-2	X					\$ 4,000,000.00	\$ 862,033.65	\$ 3,137,966.35	Aulas/Salones 4 256.00 Áreas comunes 1 32.00		Demoliciones, preparación de nodos y habilitación de estructura	Habilitado y montaje de estructura, colado de losa, albañilerías e instalación eléctrica	10	24/09/18	08/12/18	Por pago de anticipo se difiere el inicio el día 24 de septiembre y término el 6 de diciembre.							
										TOTAL	5	288.00												
2	2 Instalación de luminarias led, fotoceldas y paneles solares en las instalaciones del Sistema de Universidad Virtual. (SUV) FAM 2018 P-36		X				\$ 1,211,625.00	\$ -	\$ -	Panels solares y estructura 70 0.00 Lámparas led de 30 watts 12 0.00 Inversor central de interconexion 6 0.00 Instalación y mano de obra de paneles 70 0.00 Instalación y mano de obra de lámparas led 30w 12 0.00 Instalación Inversor central de interconexion 6 0.00		Se realizó lectura de fallo LPN-002-SUV-FAM-2018	Proceso de elaboración de contrato	0	23/10/18	31/12/18	Los trabajos a realizar son : suministro y colocación de módulo fotovoltaico y suministro y colocación de lámparas para alumbrado público solar, para el Sistema de Universidad Virtual							
										TOTAL	176.00	0.00												
3	Edificio de Investigación (Vinculación y Transferencia del Conocimiento) (CUCEA) FAM 2019 P-11	X					\$ 4,000,000.00	\$ 915,556.44	\$ 3,084,443.56	Cubículos 60 1269.44 Sanitarios 4 117.00 Áreas comunes 2 544.11		Se libera anticipo.	Obra por iniciar.	0	24/10/18	13/01/19								
										TOTAL	66.00	1930.55												
4	CULAGOS Sustentable (CULAGOS) FAM 2019 P-14		X				\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00	Sistema de captación solar 2 0.00 Captación pluvial 1 0.00		Se realizó lectura de fallo LPN-001-CULAGOS-FAM-2018	Proceso de elaboración de contrato	0	23/10/18	31/12/18	Los trabajos a realizar son: suministro y colocación de módulos fotovoltaicos, retro de luminarias existentes y suministro y colocación de luminarias con tecnología LED y luminarias para alumbrado público solar, para el Centro Universitario de los Lagos.							
										TOTAL	3.00	0.00												

2018

AÑO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Octubre

FECHA DE CORTE: 25/10/18

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad de Guadalajara**

Entidad federativa: Jalisco

Clave Inst 911: 14MSU0102


 Planeación
 Nombre: Mtro. Rubén Juan Sebastián García Sánchez
 Cargo: Coordinador General de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara
 Teléfono: 52 (01) 33 31342214 Ext 11202
 Correo electrónico: ruben.garcia.sanchez@copladi.udg.mx

 RESPONSABLES
 Obras y Mantenimiento
 Nombre: Ing. Esteban Segura Estrada
 Cargo: Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
 Teléfono: 52 (01) 33 31342235 Ext 1801 y 1802
 Correo electrónico: esegura@redudg.udg.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ²		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obras de construcción	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/ Equipo	Cantidad	Metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
9	Continuación de Construcción Sede Tomatlán del Centro Universitario de la Costa, Edificio C. (CUCOSTA) FAM 2018 P-7 (ajuste de monto)	X					\$ 4,500,000.00	\$ 1,076,215.95	\$ 3,423,784.05	Auditorios 12 748.24 Sanitarios 2 68.47 Áreas comunes 5 614.37 Otros 2 24.14 TOTAL 21.00 1455.22	Se trabaja en firmes, aplanados, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.	Continuación de trabajos en acabados, instalaciones y azoteas.	10	03/10/18	26/12/18									
10	Construcción de edificio bioclimático de laboratorios para el Departamento de Ciencias de la Salud, del Centro Universitario de la Costa Sur, sede Anonas (CUCOSTASUR) FAM 2018 P-11		X				\$ 3,000,000.00	\$ 712,474.71	\$ 2,287,525.29	Preliminares de instalaciones sustentables: pvc con contenido de biocidas, (polipropileno, polibutieno y polietileno) 855 0.00 Cimentación y estructura: materiales naturales de banco mejorados con cementantes 634 0.00 TOTAL 1489.12 0.00	Actividades Preliminares (Localización de punto de georeferenciación) y trazo en sitio del polígono del edificio y colocación en sitio de acero de refuerzo.	Preliminares, (limpieza de terreno, despalmas, excavaciones rellenas) Cimentación (plantillas, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo, cimbras comunes, suministro y colocación de concreto premezclado, colocación de muro a tazon de block de jalisco para nivelación de cimentación, anclaje de castillos, suministro y colocación de impermeabilizante) y Estructura (suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo, cimbras comunes, suministro y colocación de concreto premezclado)	5	02/10/18	16/12/18	Se ha dado inicio con los trabajos preliminares, comenzando con la localización del punto georeferenciado para el trazo general, limpieza del terreno, despalmas y trazos								
11	Cuarta etapa de la construcción del Auditorio del Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño (CUAAD) FAM 2018 P-16		X				\$ 4,000,000.00	\$ 723,785.84	\$ 3,276,214.16	Auditorios 1 720.00 TOTAL 1.00 720.00	Instalación de muros de tablaroca interior oriente y poniente y aplicación de pasta. Construcción de muro sur de block y enjarre en ambas caras. Instalación de salida eléctrica para las luminarias al interior.	Instalación de piso, fachada norte de cristal, plafón, instalación eléctrica.	60	10/10/18	23/12/18									

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Octubre

FECHA DE CORTE: 25/10/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad


Porcentaje de avance

10

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra:

Conclusión de módulo A (4 aulas y pasillo de intercomunicación) en la planta alta del Centro Universitario de la Ciénega, sede Atotonilco (CUCIENEGA) FAM 2019 P-2

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

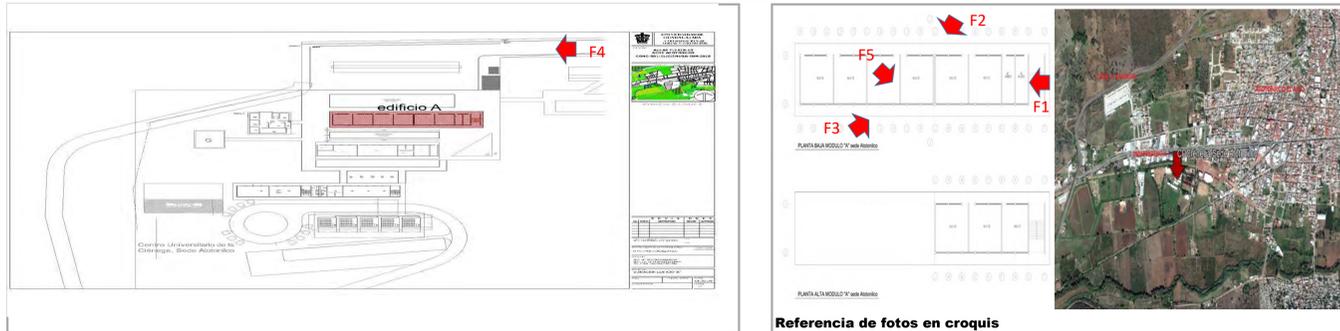

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Universidad, No.1115, Col. Lindavista,
Código Postal 47820, Ocotlán, Jalisco. México.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Se realizaron demoliciones de hormigón para preparación de nodos de conexión y se fabrica en taller la estructura.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Octubre

FECHA DE CORTE: 25/10/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD **2** Nombre de la obra: **Instalación de luminarias led, fotoceldas y paneles solares en las instalaciones del Sistema de Universidad Virtual. (SUV) FAM 2018 P-36**


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

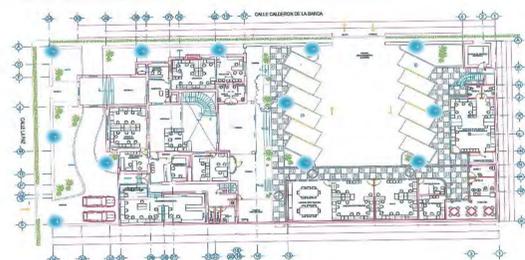

ARQUITECTÓNICA
PLANTA



Referencia de la obra en croquis



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. La Paz No. 2453
Col. Arcos Sur, C.P. 44130
Guadalajara, Jalisco.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

En proceso de elaboración de contrato.

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Estelán Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Octubre

FECHA DE CORTE: 25/10/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra: **Edificio de Investigación (Vinculación y Transferencia del Conocimiento) (CUCEA) FAM 2019 P-11**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Periférico Norte 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:
Obra adjudicada por iniciar, anticipo pagado el día 24 de octubre del 2018.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES

Ingr. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Octubre

FECHA DE CORTE: 25/10/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance


0

PRIORIDAD **4**

Nombre de la obra: **CULAGOS Sustentable (CULAGOS)**

FAM 2019 P-14

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

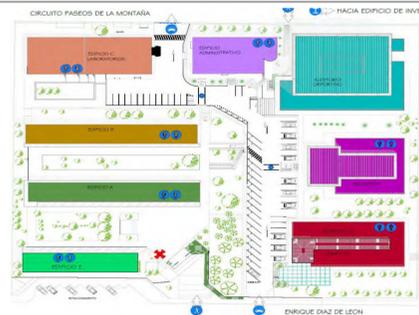

Referencia de 1

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Enrique Díaz de León No. 1144, Colonia Paseos de la Montaña C.P. 47460.
Lagos de Moreno, Jalisco, México

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:


En proceso de elaboración de contrato.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada

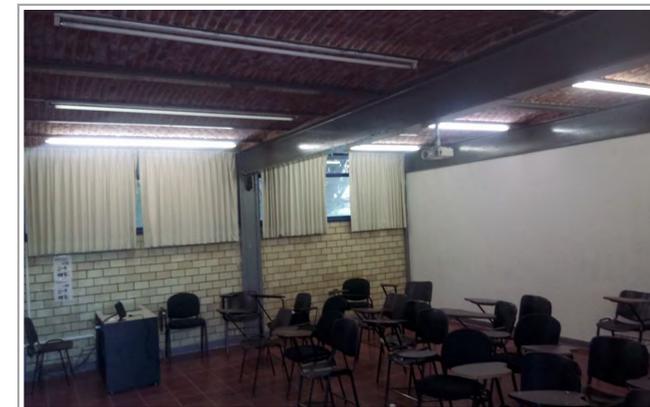

F5: Interior de aula

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Octubre

FECHA DE CORTE: 25/10/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad



Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD **5** Nombre de la obra:

Equipamiento de Mobiliario especializado para laboratorios de aprendizaje del Centro Universitario de los Valles (CUVALLES) FAM 2018 P-6 (ajuste de monto)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

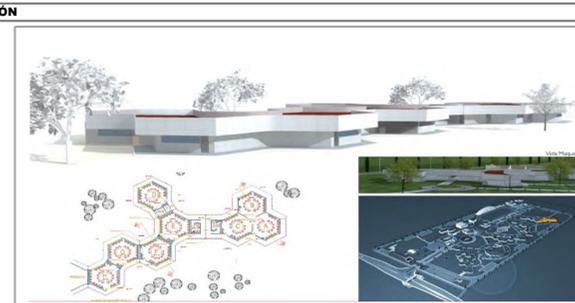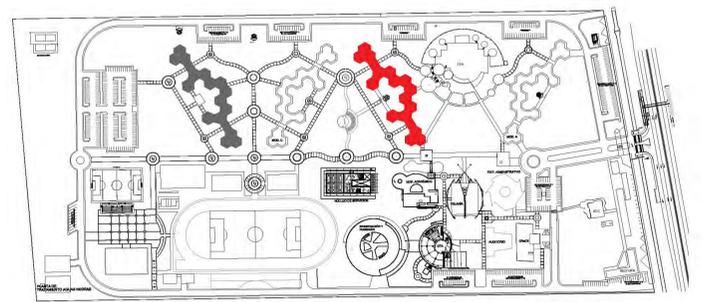

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Guadalajara - Ameca Km. 45.5, C.P. 46600, Ameca, Jalisco, México.

FOTOS




F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

El pasado 23 de octubre del 2018 se dio el fallo. Por lo que se esta en proceso de elaborar contrato y pago de anticipo.

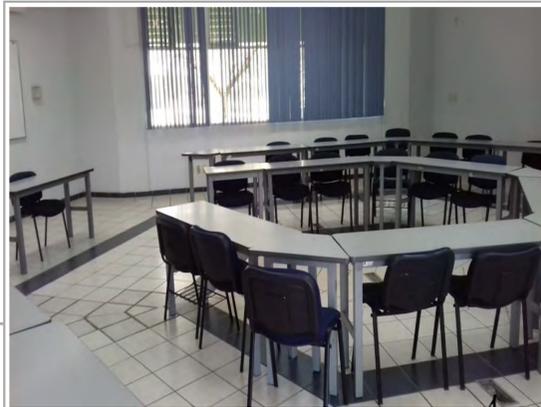

F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Octubre

FECHA DE CORTE: 25/10/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

38

PRIORIDAD **6** Nombre de la obra: **Centro de Recursos Informativos -CERI- Tercera Etapa (CUCBA). (CUCBA) FAM 2019 P-16**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

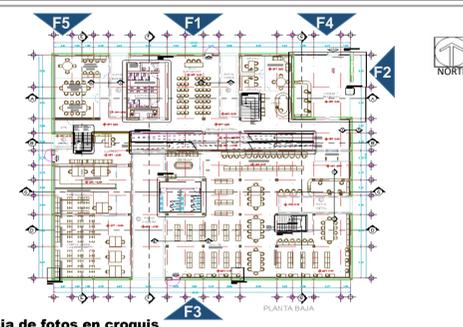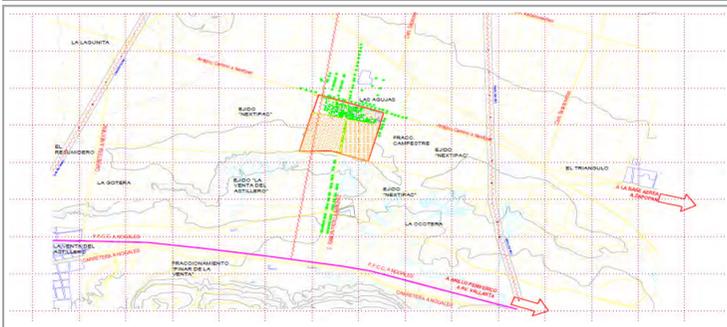

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

C. Ramón Padilla Sánchez #2100 Nextipac, Zapopan, Jalisco, México

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

1.- Se muestran imágenes de los avances del suministro y colocación de acero de refuerzo en entrepiso



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES

Lic. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración Especial de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Octubre

FECHA DE CORTE: 25/10/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance



35

PRIORIDAD **7**

Nombre de la obra: **Continuación de Remodelación Clínica Escuela en el Centro Universitario del Sur (etapa 2) (CUSUR)**

FAM 2018 P-17

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

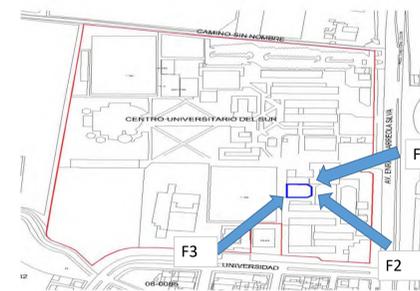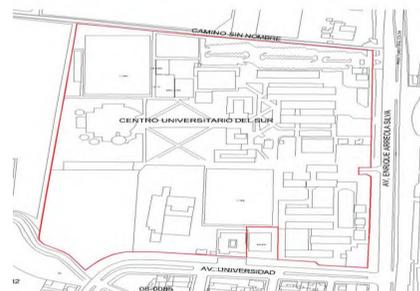

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Enrique Arreola Silva No. 883, colonia centro
C.P. 49000, Ciudad Guzmán, Jalisco, México.

FOTOS




F1: Fachada principal



F2: lateral




F3: Fachada posterior



F4: Entrada

Comentarios de los trabajos realizados:

TERMINO DE RELLENOS DE SUELO CEMENTO
ARMADO Y COLADO DE ZAPATAS.
COLADO DE DADOS



F5: Interior de aula

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Octubre

FECHA DE CORTE: 25/10/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad


Porcentaje de avance

65

PRIORIDAD **8**

Nombre de la obra: **Continuación de la construcción de nuevas instalaciones para el Laboratorio de Psicología y Educación Especial (CUCS) FAM 2018 P-3**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

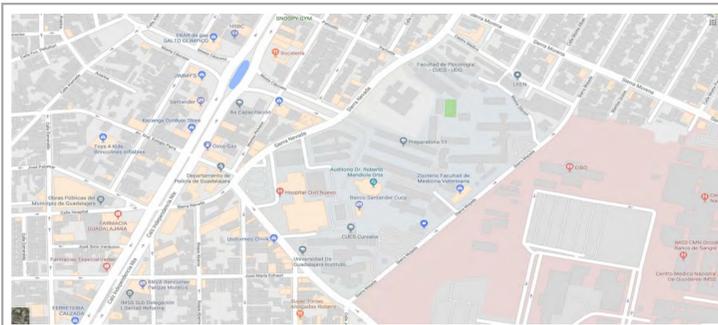

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Sierra Mojada # 950, Modulo U, Col. Independencia,
C.P. 44340, Guadalajara, Jalisco, México

FOTOS



Recepción - Aire Acondicionado

F1: Fachada principal



Site - Camaras de Seguridad

F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Se realizan trabajos de herrería, instalacion de aires acondicionados, iluminacion, cercados, electricidad e iluminacion.



Azotea - Equipos de Aire Acondicionado

F3: Fachada posterior



Entrada Principal - Protecciones de Herrería

F4: Entrada



Aula Centro Eduactivo Para Altas Capacidades CEPAC - Pintado en Negro

F5: Interior de aula

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Octubre

FECHA DE CORTE: 25/10/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad



Porcentaje de avance

10

PRIORIDAD **9** Nombre de la obra:

Continuación de Construcción Sede Tomatlán del Centro Universitario de la Costa, Edificio C. (CUCOSTA) FAM 2018 P-7 (ajuste de monto)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

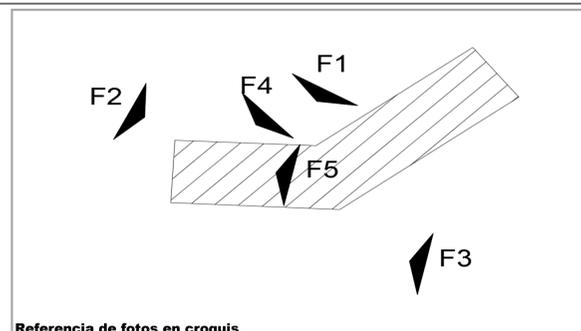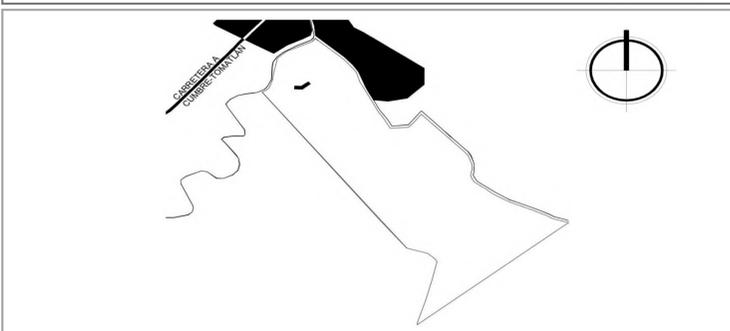

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera La Cumbre - Tomatlán, km. 2.116, Tomatlán, Jalisco.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:
SE TRABAJA EN EL TENDIDO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICAS.
SE TRABAJA EN EL FORJADO DEL PRETEL A BASE DE MURO DE TABIQUE EN AZOTEA.
SE TRABAJA EN APLANADO EN MUROS.
SE TRABAJA EN COLOCACIÓN DE FIRMES.
SE TRABAJA EN FORJADO DE MURETE PARA NIVELAR BANQUETA DE ACCESO EN PLANTA BAJA.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Octubre

FECHA DE CORTE: 25/10/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

5


PRIORIDAD **10** Nombre de la obra:

Construcción de edificio bioclimático de laboratorios para el Departamento de Ciencias de la Salud, del Centro Universitario de la Costa Sur, sede Anonas (CUCOSTASUR) FAM 2018 P-11

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



PLANTA DE LOCALIZACIÓN GENERAL EN PLAN MAESTRO

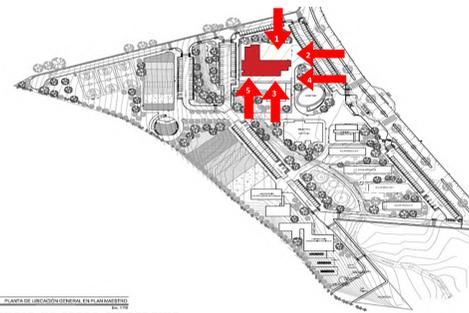

Referencia de rotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Camino de Capaya S/N, Colonia Castellón, Autlán, Independencia Nacional #151 C.P. 48900, Autlán, Jalisco, México.



FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Se ha dado inicio con los trabajos preliminares, comenzando con la localización del punto georeferenciado para el trazo general, limpieza del terreno, despalmes y trazos



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Octubre

FECHA DE CORTE: 25/10/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad



Porcentaje de avance

60

PRIORIDAD **11**

Nombre de la obra: **Cuarta etapa de la construcción del Auditorio del Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño (CUAAD) FAM 2018 P-16**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

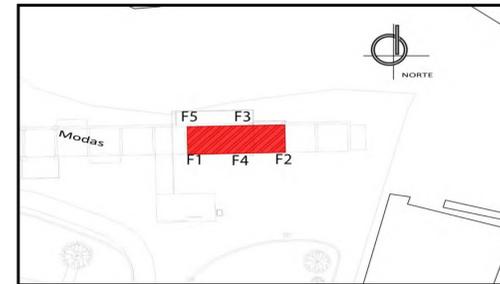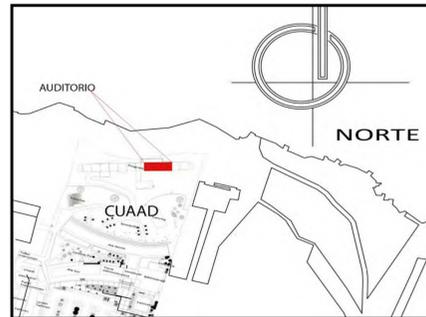

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calzada Independencia Norte no. 5075, Col. Huentitán El Bajo, C.P.44250 Guadalajara, Jal.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:
Instalación de muros de tablaroca interior oriente y poniente y aplicación de pasta. Construcción de muro sur de block y enjarre en ambas caras. Instalación de salida eléctrica para las luminarias al interior.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Octubre

FECHA DE CORTE: 25/10/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad




Porcentaje de avance

45

PRIORIDAD **12** Nombre de la obra:

**Obras exteriores y conectividad del Edificio de Laboratorio de Ingenierías (CUNORTE)
FAM 2019 P-25**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

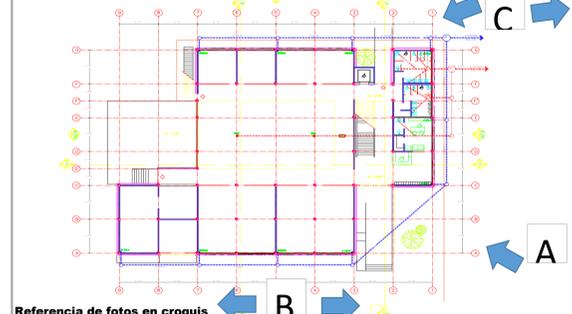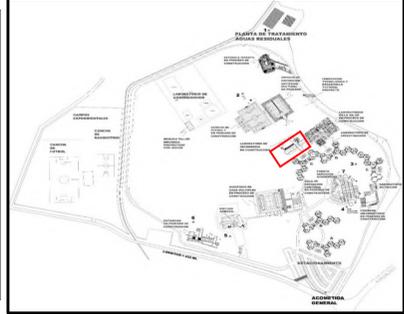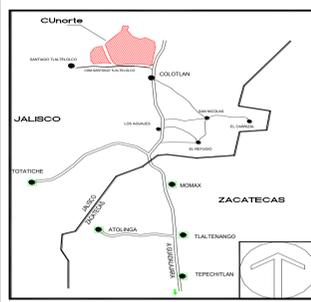

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Federal No. 23, Km. 191, C.P. 46200,
Colotlán, Jalisco, México

FOTOS



F 1,2,3 Y 4: Plazoleta



F 5,6 Y 7: Trazo de andador de conexión y ppal.

Comentarios de los trabajos realizados:
AL MOMENTO LOS TRABAJOS SE CENTRAN EN LA CONCLUSIÓN DE ANDADORES Y SUS DETALLES ASÍ COMO LA COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TUBERÍAS A LOS REGISTROS, PREPARACIÓN DE ÁREA DE INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR, COMO ES LA LOSA DE RECIBIMIENTO Y TRINCHERAS, Y CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE I-LINE. ACTO SEGUIDO SE LLEVARÁN ACABO LAS CONEXIONES, ENERGOZACIÓN Y TRÁMITES ANTE CFE.



F 8 Y 9: Trazo de línea eléctrica en baja tensión



F 10: Trazo de línea media tensión



F 11: Ubicación de transformador y línea de media tensión

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Octubre

FECHA DE CORTE: 25/10/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance



1

PRIORIDAD **13**

Nombre de la obra: **Laboratorio de Química, quinta etapa. (CUCEI)**

FAM 2018 P-22

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

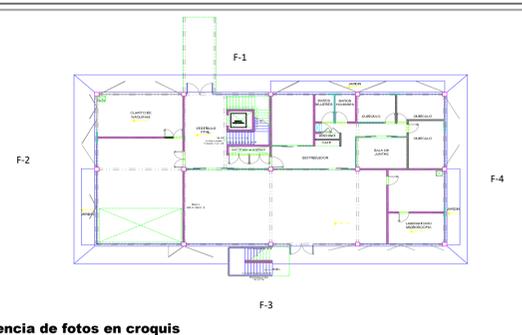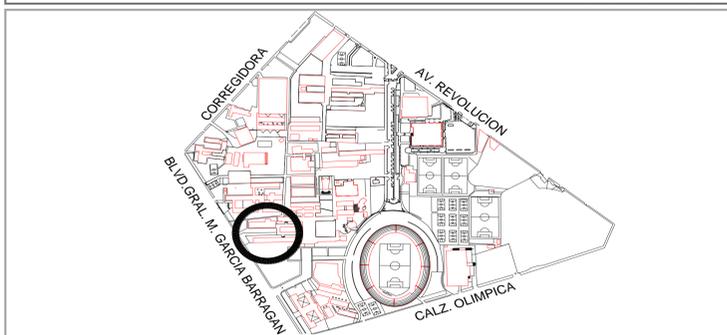

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Boulevard Marcelino Gracia Barragan No. 1421,
Esquina Calzada Olímpica C.P 44430, Guadalajara,
Jalisco.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada

Comentarios de los trabajos realizados:

LOS TRABAJOS EN EL EDIFICIO DE QUIMICA SE INICIAN CON LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES, YA QUE EL ANTICIPO FUE ENTREGADO A LA EMPRESA CONTRATISTA EL PASADO

F5: Interior de aula

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
