

2019

AÑO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Agosto

FECHA DE CORTE: 28/08/19

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad de Guadalajara

Entidad federativa: Jalisco

Clave Inst 911: 14MSU00102

 Nombre: Mtra. Paola Lycothe Corona Gutiérrez
 Cargo: Coordinador General de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara
 Teléfono: 52 (01) 33 31342214 Ext 11202
 Correo electrónico: paola.corona@copladi.udg.mx

 Nombre: Ing. Esteban Segura Estrada
 Cargo: Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
 Teléfono: 52 (01) 33 31342235 Ext 1801 y 1802
 Correo electrónico: esegura@redudg.udg.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada								
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/Equipo	Cantidad	Metros cuadrados				Inicio	Término			Entrega-Recepción (Acta Inicativo)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa						
																							Cuenta con Actas					
1	P-1 Centro de Recursos Informativos -CERI- Tercera Etapa (CUCBA). (CUCBA) FAM 2019	X					\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	Bibliotecas	2	950.00	En proceso de contratación	0	26/09/19	31/12/19	En proceso de contratación Lectura de fallo 19 septiembre 2019	No (Es obra de continuidad y falta asignar recursos para concluir el Inmueble en su totalidad)										
									Oficinas Admvas	6	200.00																	
									Aulas didácticas	5	400.00																	
									Sanitarios	4	300.00																	
									Áreas comunes	10	1380.00																	
									Otros	5	1400.00																	
									TOTAL	32	4630.00																	
2	P-2 Continuación de la construcción de laboratorios multifuncionales de las licenciaturas de Médico Cirujano Partero y Nutrición del CUCS. (CUCS) FAM 2019	X					\$ 5,453,808.00	\$ -	\$ 5,453,808.00	Aulas/salones	1	45.53	En proceso de contratación	0	07/10/19	31/12/19	En proceso de contratación Lectura de fallo 30 septiembre 2019											
									Talleres	3	40.76																	
									Cubículos	3	46.63																	
									Oficinas administrativas	19	364.99																	
									Centros de cómputo	3	327.83																	
									Aulas magnas	1	62.96																	
									Aulas usos múltiples	2	76.36																	
									Aulas didácticas	8	290.59																	
									Sanitarios	7	81.24																	
									Áreas comunes	3	906.24																	
									Otros	3	49.87																	
									TOTAL	63.00	2293.00																	
3	P-3 Construcción de edificio bioclimático de laboratorios para el Departamento de Ciencias de la Salud, del Centro Universitario de la Costa Sur, sede Anonas (CUCOSTASUR) FAM 2019		X				\$ 5,892,712.50	\$ -	\$ 5,892,712.50	Instalaciones sustentables: pvc con contenido de bioadhesivos, (polipropileno, polibutileno y polietileno)	1	1045.55	En proceso de contratación	0	02/10/19	31/12/19	En proceso de contratación Lectura de fallo 02 octubre 2019											
									Cimentación y estructura materiales naturales de barro mejorados con cementantes	1	1901.00																	
									Albanilerías: ladrillos de barro precocido	1	1520.80																	
									Acabados en general: vidrio reciclado, lanas minerales, pinturas con base mineral	1	1267.33																	
									TOTAL	4.00	5734.68																	
4	P-4 Continuación del Edificio Recursos Tecnológicos y Análisis de Datos para la Academia de Investigación. III Etapa (CUTONALÁ) FAM 2019	X					\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	Aulas/salones	14	850.00	En proceso de contratación	0	15/10/19	31/12/19	En proceso de contratación Lectura de fallo 08 octubre 2019											
									Cubículos	3	211.00																	
									Oficinas administrativas	6	286.00																	
									Aulas usos múltiples	3	202.00																	
									Aulas didácticas	3	633.00																	
									Sanitarios	3	104.00																	
									Áreas comunes	21	1020.00																	
									TOTAL	63.00	3306.00																	
5	P-5 Continuación de Construcción Sede Tomatlán del Centro Universitario de la Costa, Edificio B. (CUCOSTA) FAM 2019	X					\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	Aulas/salones	7	408.31	En proceso de contratación	0	26/09/19	31/12/19	En proceso de contratación Lectura de fallo 19 septiembre 2019											
									Laboratorios	1	136.17																	
									Bibliotecas	1	82.34																	
									Oficinas administrativas	3	90.19																	
									Sanitarios	2	9.32																	
									Áreas comunes	4	350.23																	
									Otros	1	9.91																	
									TOTAL	19.00	1066.47																	
6	P-6 Conclusión de Auditorio de Usos Múltiples (CUNORTE) FAM 2019	X					\$ 3,472,850.37	\$ -	\$ 3,472,850.37	Talleres	5	640.00	En proceso de contratación	0	24/09/19	31/12/19	En proceso de contratación Lectura de fallo 17 septiembre 2019											
									Bibliotecas	1	17.00																	
									Oficinas administrativas	3	360.00																	
									Sanitarios	10	380.00																	
									Áreas comunes	4	3070.00																	
									Otros	3	140.00																	
									TOTAL	26.00	4607.00																	
7	P-7 Continuación de Remodelación Clínica Escuela en el Centro Universitario del Sur (etapa 3) (CUSUR) FAM 2019	X					\$ 4,005,700.00	\$ -	\$ 4,005,700.00	Laboratorios	4	108.59	Obra en licitación	0	18/09/19	31/12/19	En proceso de contratación Lectura de fallo 11 septiembre 2019											
									Oficinas administrativas	7	80.96																	
									Áreas comunes	4	125.97																	
									Otros	5	112.35																	
									TOTAL	20.00	427.87																	
8	P-8 Incorporación de energía solar al centro de formación Integral. (CUCEA) FAM 2019		X				\$ 3,640,183.06	\$ -	\$ 3,640,183.06	Modulo Solar Fotovoltaico	248	Pza.	En proceso de contratación	0	04/10/19	31/12/19	En proceso de contratación Lectura de fallo 27 septiembre 2019											
									Panel Solar de Baterías y Sistemas de Fijación para Inversor de Corriente 40TL	2	Pza.																	
									Módulo Medio de Protección, Lote de cables THW, L.S.	1	Lote																	
									Sistema de Monitoreo de Cargas y Sistemas de Tierras físicas, Lote de cable para tierra	1	Lote																	
									Instalación completa del sistema	1	Paquete																	
									Calentador Solar Industrial y Soporte de Colectores	20	Pza.																	
									Termotanque 5000 lt. Depósito de Agua Térmico.	1	Pza.																	
									Recirculación Bombas de	2	Pza.																	
									Recirculación a 1/3 Sistema de Presurización, bomba vertical de Acabamiento	1	Pza.																	
									Termotanque, Incubamiento en Ingenierías del	1	Lote																	
									Sistema, juego de planos Hidráulicos y	1	Lote																	
									Instalación completa del sistema, incluye:	1	Lote																	
									TOTAL	282.00	NA																	
9	P-9 Tercera etapa de construcción de edificio de 3 niveles destinado a aulas y servicios. (CUCEI) FAM 2019	X					\$ 5,200,000.00	\$ -	\$ 5,200,000.00	Aulas/salones	11	920.00							En proceso de contratación	0	19/09/19	31/12/19	En proceso de contratación Lectura de fallo 12 septiembre 2019					
									Oficinas académicas	1	54.00																	
									Sanitarios	4	90.30																	
									Áreas comunes	1	297.46																	
									Otros	4	121.75																	
									TOTAL	21.00	1483.51																	
10	P-10 Equipamiento multimedia en aulas para clases (CUAAD) FAM 2019	X					\$ 2,900,000.00	\$ -	\$ 2,900,000.00	Equipamiento multimedia video	51	Pza.	En proceso de contratación	0	31/10/19	31/12/19	En proceso de contratación											
									TOTAL	61.00	NA																	

\$45,665,253.93 \$0.00 \$45,665,253.93

 D. Guillermo Villanueva Lugo
 Rector General de la Universidad de Guadalajara
 Nombre y firma del Titular de la IES

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Agosto

FECHA DE CORTE: 25/08/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad


Porcentaje de avance

0


PRIORIDAD 1

Nombre de la obra: P-1 Centro de Recursos Informativos -CERI- Tercera Etapa (CUCBA). (CUCBA) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

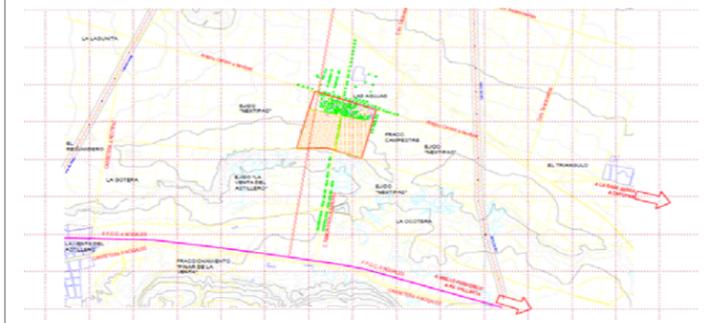

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

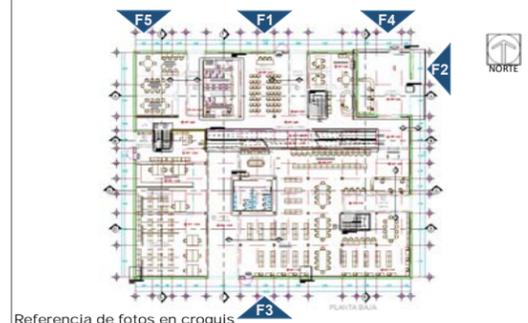

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

C. Ramón Padilla Sánchez #2100 Nextipac, Zapopan, Jalisco, México

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

1.- Se muestran imágenes del suministro y colocación de acero estructural de la última Etapa.

Dr. Ricardo Villanueva González
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Serrera Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Agosto

FECHA DE CORTE: 26/08/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad



Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD 2 Nombre de la obra:

P-2 Continuación de la construcción de laboratorios multifuncionales de las licenciaturas de Médico Cirujano Partero y Nutrición del CUCS. (CUCS) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

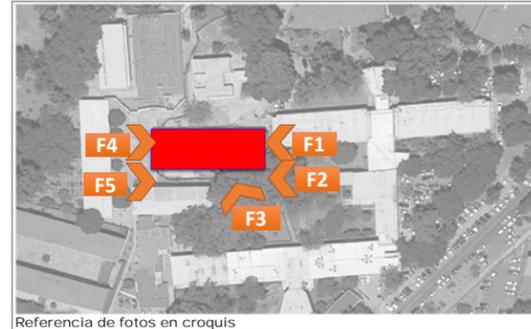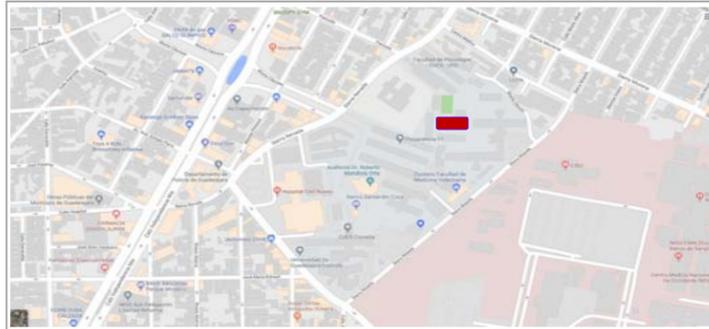

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Sierra Mojada # 950, Modulo U, Col. Independencia, C.P. 44340, Guadalajara, Jalisco, México

FOTOS



F1: Planta 1er Nivel



F2: Planta 2do Nivel



F3: Planta 3er Nivel



F4: Planta 1er Nivel



F5: Planta 2do Nivel

Comentarios de los trabajos realizados:

Se muestran imágenes de la etapa actual del edificio.

Dr. Ricardo Villanueva López
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Sojura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Agosto

FECHA DE CORTE: 25/08/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD 3 Nombre de la obra:

P-3 Construcción de Edificio bioclimático de laboratorios para el Departamento de Ciencias de la Salud, del Centro Universitario de la Costa Sur, sede Anonas (CUCOSTASUR) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Camino de Capaya S/N, Colonia Castellón, Autlán,
Independencia Nacional #151
C.P. 48900, Autlán, Jalisco, México.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:
Se muestran imágenes de la etapa actual.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Ricardo Villanueva Domínguez
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Agosto
FECHA DE CORTE: 25/08/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD 4

Nombre de la obra: P-4 Continuación del Edificio Recursos Tecnológicos y Análisis de Datos para la Academia de Investigación. III Etapa (CUTONALÁ) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Nuevo Periférico No. 555 Ejido San José
Tatepozco, C.P. 45425, Tonalá Jalisco, México

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

Se muestran imágenes de la etapa actual del edificio.

Ricardo Villanueva Comeli
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Agosto

FECHA DE CORTE: 25/08/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD 5 Nombre de la obra: P-5 Continuación de Construcción Sede Tomatlán del Centro Universitario de la Costa, Edificio B. (CUCOSTA) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

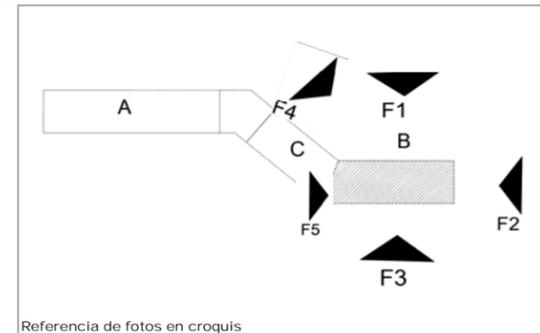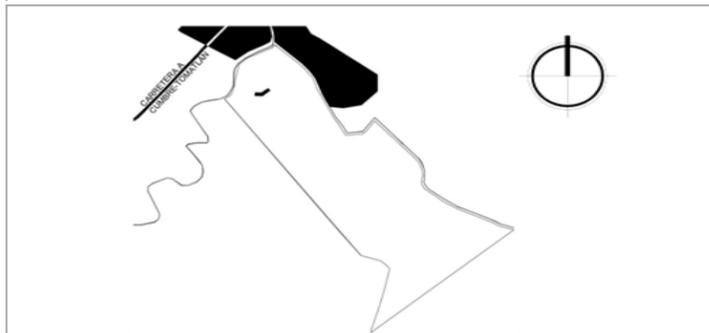

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera La Cumbre - Tomatlán, km. 2.116, Tomatlán, Jalisco.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:
Se muestran imágenes en donde se desarrollará la construcción.
Obra por contratarse



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

D. Ricardo Villanueva Panielli
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

D. Esteban Sepúlveda Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Agosto

FECHA DE CORTE: 25/08/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad


Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD 6

Nombre de la obra: P-6 Conclusión de Auditorio de Usos Múltiples (CUNORTE) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

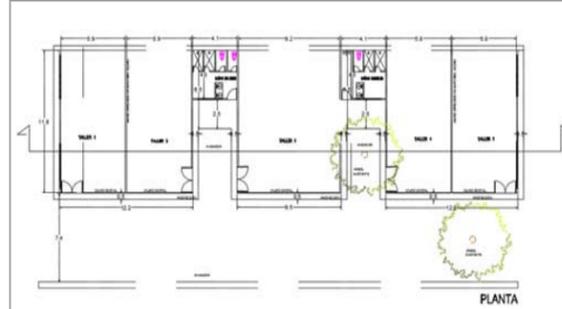

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Federal No. 23, Km. 191, C.P. 46200,
Colotlán, Jalisco, México

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:
Se muestran imágenes de la etapa actual del edificio.
Obra por contratarse



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Logolani
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Sanguera Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Agosto

FECHA DE CORTE: 25/08/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD 7

Nombre de la obra: P-7 Continuación de Remodelación Clínica Escuela en el Centro Universitario del Sur (etapa 3) (CUSUR) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

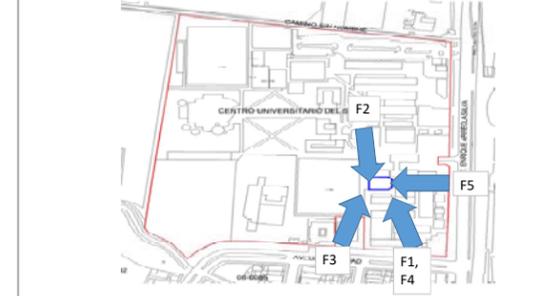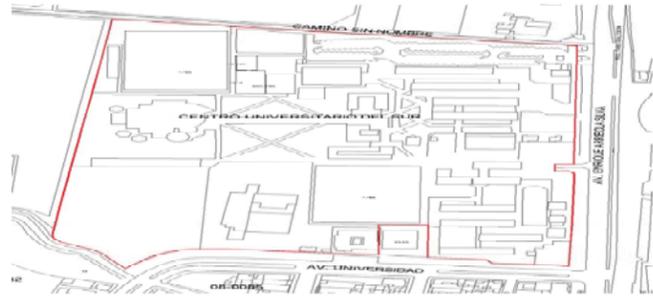

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Enrique Arreola Silva No. 883, colonia centro
C.P. 49000, Ciudad Guzmán, Jalisco, México.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Lateral

Comentarios de los trabajos realizados:
Se muestran imágenes de la etapa actual del edificio.
Obra por contratarse



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Lobos
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Agosto

FECHA DE CORTE: 25/08/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad


Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD 8

Nombre de la obra: P-8 Incorporación de energía solar al centro de formación Integral. (CUCEA) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

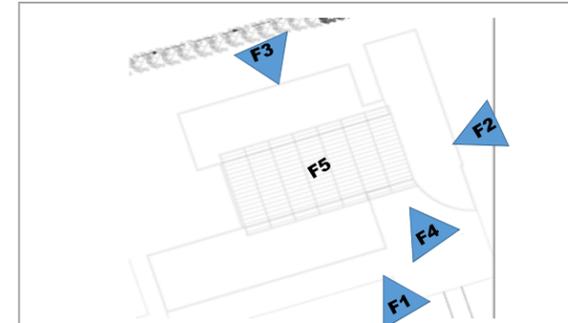

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Periférico Norte 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral


Comentarios de los trabajos realizados:
Se muestran imágenes de la etapa actual del edificio.
Obra por contratarse



F3: Fachada posterior



F4: Entrada

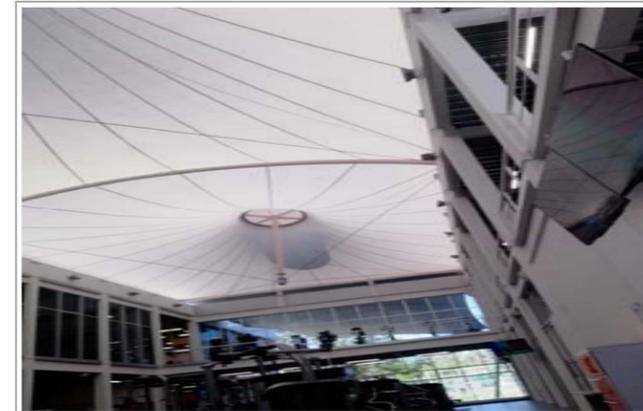

F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Lora
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Agosto

FECHA DE CORTE: 25/08/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad


Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD 9

Nombre de la obra: P-9 Tercera etapa de construcción de edificio de 3 niveles destinado a aulas y servicios. (CUCEI) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

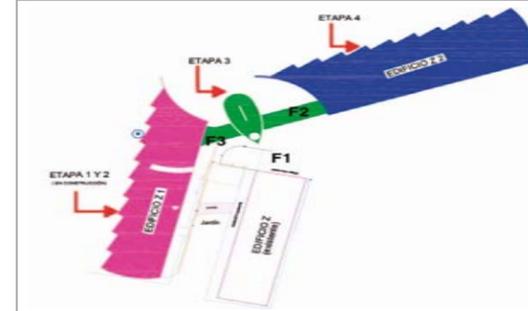

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Boulevard Marcelino Gracia Barragan No. 1421,
Esquina Calzada Olimpica C.P 44430, Guadalajara,
Jalisco.

FOTOS



F1: Fachada principal




F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:


Se muestran imágenes de la etapa actual del edificio.
Obra por contratarse



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Lortelli
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Sr. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Agosto

FECHA DE CORTE: 25/08/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD 10 Nombre de la obra: P-10 Equipamiento multimedia en aulas para clases (CUAAD) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

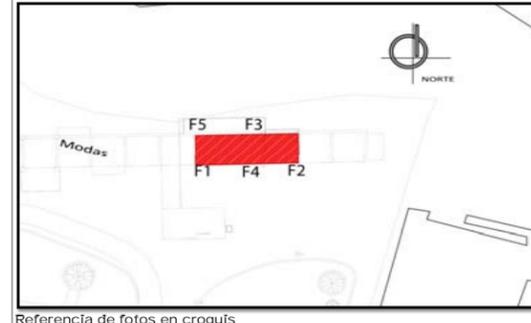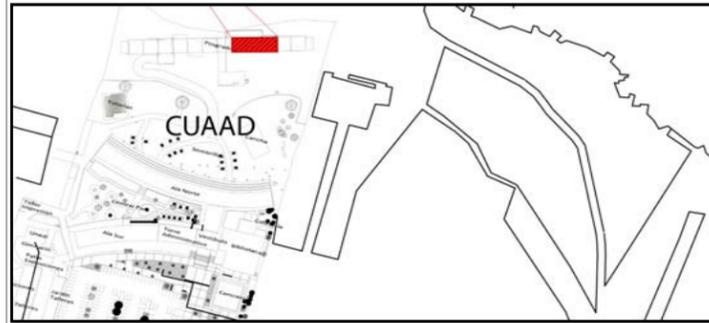

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calzada Independencia Norte no. 5075, Col. Huentitán El Bajo, C.P.44250 Guadalajara, Jal.


FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

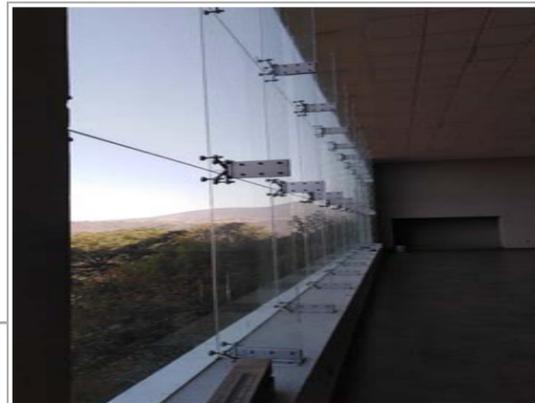

F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra por contratarse

Dr. Ricardo Villanueva Comeli
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
