

2019  
AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Julio**  
FECHA DE CORTE: 20/07/19

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

	Nombre: <b>Universidad de Guadalajara</b>
	Entidad federativa: <b>Jalisco</b>
Clave Inst 911: 14MSU00102	
<b>RESPONSABLES</b>	
Planación	Obras y Mantenimiento
Nombre: <b>Mtra. Paola Lycolette Corona Gutiérrez</b> Cargo: <b>Coordinador General de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara</b> Teléfono: <b>52 (01) 33 31342214 Ext 11202</b> Correo electrónico: <b>paola.corona@copladi.udg.mx</b>	Nombre: <b>Ing. Esteban Segura Estrada</b> Cargo: <b>Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara</b> Teléfono: <b>52 (01) 33 31342215 Ext 1801 y 1802</b> Correo electrónico: <b>esegura@redudg.udg.mx</b>

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada																			
		Obra de construcción	Equipamiento	Adaptaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/ Equipo	Cantidad				Metros cuadrados	Inicio			Término	Cuenta con Actas																		
																				¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa														
1	P-1 Centro de Recursos Informativos -CERI- Tercera Etapa (CUCBA). (CUCBA) FAM 2019	X				\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	Bibliotecas	2	950.00	Obra no iniciada	Suministro y colocación de acero estructural, cubierta de losa-acero, instalaciones hidrosanitarias.	0	31/08/19	31/12/19	La IES esta en espera que Gobierno del Estado le transfiera los recursos.	No (Es obra de continuidad y falta asignar recursos para concluir el inmueble en su totalidad)																				
									Oficinas Admvas	6	200.00													Aulas didácticas	5	400.00	Sanitarios	4	300.00	Áreas comunes	10	1380.00	Otros	5	1400.00	<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>4630.00</b>
2	P-2 Continuación de la construcción de laboratorios multifuncionales de las licenciaturas de Médico Cirujano Parto y Nutrición del CUCS. (CUCS) FAM 2019	X				\$ 5,453,808.00	\$ -	\$ 5,453,808.00	Aulas/salones	1	45.53	Obra no iniciada		0	31/08/19	31/12/19	La IES esta en espera que Gobierno del Estado le transfiera los recursos.																					
									Talleres	3	40.76												Cubículos	3	46.63	Oficinas administrativas	19	364.99	Centros de cómputo	3	327.83	Aulas magnas	1	62.96	Aulas usos múltiples	2	76.36	Aulas didácticas
3	P-3 Construcción de edificio bioclimático de laboratorios para el Departamento de Ciencias de la Salud, del Centro Universitario de la Costa Sur, sede Anonas (CUCOSTASUR) FAM 2019	X				\$ 5,892,712.50	\$ -	\$ 5,892,712.50	Instalaciones sustentables: pvc con contenido de biocidas (polipropileno, polibuteno y polietileno)	1	1045.55	Obra no iniciada	Continuidad de los trabajos de estructura a base de concreto reforzado y preparación de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, telecomunicaciones, gases y especiales	0	31/08/19	31/12/19	La IES esta en espera que Gobierno del Estado le transfiera los recursos.																					
									Cimentación y estructura: materiales naturales de barro mejorados con cementantes	1	1901.00												Albanilerías: ladrillos de barro precocido	1	1520.80	Acabados en general: vidrio reciclado, lanas minerales, pinturas con base mineral	1	1267.33	<b>TOTAL</b>	<b>4.00</b>	<b>6734.68</b>							
4	P-4 Continuación del Edificio Recursos Tecnológicos y Análisis de Datos para la Academia de Investigación, III Etapa (CUTONALA) FAM 2019	X				\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	Aulas/salones	14	850.00	Obra no iniciada		0	31/08/19	31/12/19	La IES esta en espera que Gobierno del Estado le transfiera los recursos.																					
									Cubículos	3	211.00												Oficinas administrativas	6	286.00	Aulas usos múltiples	3	202.00	Aulas didácticas	3	633.00	Sanitarios	3	104.00	Áreas comunes	21	1020.00	<b>TOTAL</b>
5	P-5 Continuación de Construcción Sede Tomatán del Centro Universitario de la Costa, Edificio B. (CUCOSTA) FAM 2019	X				\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	Aulas/salones	7	408.31	Obra no iniciada		0	31/08/19	31/12/19	La IES esta en espera que Gobierno del Estado le transfiera los recursos.																					
									Laboratorios	1	136.17												Bibliotecas	1	82.34	Oficinas administrativas	3	90.19	Sanitarios	2	9.32	Áreas comunes	4	350.23	Otros	1	9.91	<b>TOTAL</b>
6	P-6 Conclusión de Auditorio de Usos Múltiples (CUNORTE) FAM 2019	X				\$ 3,472,850.37	\$ -	\$ 3,472,850.37	Talleres	5	640.00	Obra no iniciada		0	31/08/19	31/12/19	La IES esta en espera que Gobierno del Estado le transfiera los recursos.																					
									Bibliotecas	1	17.00												Oficinas administrativas	3	360.00	Sanitarios	10	380.00	Áreas comunes	4	3070.00	Otros	3	140.00	<b>TOTAL</b>	<b>26.00</b>	<b>4667.00</b>	
7	P-7 Continuación de Remodelación Clínica Escuela en el Centro Universitario del Sur (etapa 3) (CUSUR) FAM 2019	X				\$ 4,005,700.00	\$ -	\$ 4,005,700.00	Laboratorios	4	108.59	Obra no iniciada		0	31/08/19	31/12/19	La IES esta en espera que Gobierno del Estado le transfiera los recursos.																					
									Oficinas administrativas	7	80.96												Áreas comunes	4	125.97	Otros	5	112.35	<b>TOTAL</b>	<b>20.00</b>	<b>427.87</b>							
8	P-8 Incorporación de energía solar al centro de formación Integral. (CUCEI) FAM 2019	X				\$ 3,640,183.06	\$ -	\$ 3,640,183.06	Módulo Solar Fotovoltaico	248	Pza.	Obra no iniciada		0	31/08/19	31/12/19	La IES esta en espera que Gobierno del Estado le transfiera los recursos.																					
									Panel Solar de Bastidores y Sistemas de Fijación para Invernal de Corriente 40TL	1	Paquete												Medidor de M480	2	Pza.	Protección, Lote de cables THHN/LS	1	Lote	Sistema de Monitores de Correas y Sistemas de Frenos físicos, Lote de cable para tierra	1	Lote	Instalación completa del sistema	1	Paquete	Calentador Solar Industrial y Soporte de Colectores	20	Pza.	Termostato 5000 lbs
9	P-9 Tercera etapa de construcción de edificio de 3 niveles destinado a aulas y servicios. (CUCEI) FAM 2019	X				\$ 5,200,000.00	\$ -	\$ 5,200,000.00	Aulas/salones	11	920.00	Obra no iniciada		0	31/08/19	31/12/19	La IES esta en espera que Gobierno del Estado le transfiera los recursos.																					
									Oficinas académicas	1	54.00												Sanitarios	4	90.30	Áreas comunes	1	297.48	Otros	4	121.75	<b>TOTAL</b>	<b>21.00</b>	<b>1483.51</b>				
10	P-10 Equipamiento multimedia en aulas para clases (CUAAD) FAM 2019	X				\$ 2,900,000.00	\$ -	\$ 2,900,000.00	Equipamiento multimedia video	51	Pza.	Obra no iniciada		0	31/08/19	31/12/19	La IES esta en espera que Gobierno del Estado le transfiera los recursos.																					
									<b>TOTAL</b>	<b>51.00</b>	<b>NA</b>																											
						\$45,565,253.93	\$0.00	\$45,565,253.93																														

Dr. Ricardo Villanueva Román  
Rector General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada  
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

<sup>1</sup> Se capturaron los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.  
<sup>2</sup> En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
<sup>3</sup> Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2019

AÑO

FAM  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Julio

FECHA DE CORTE: 20/07/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0


PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

P-1 Centro de Recursos Informativos -CERI- Tercera Etapa (CUCBA). (CUCBA) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

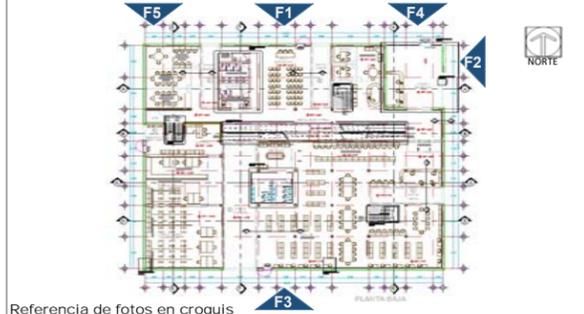

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

C. Ramón Padilla Sánchez #2100 Nextipac, Zapopan, Jalisco, México

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

1.- Se muestran imágenes del suministro y colocación de acero estructural de la última Etapa.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Comelt  
Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Serrera Estrada  
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Julio

FECHA DE CORTE: 20/07/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad



Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD 2 Nombre de la obra:

P-2 Continuación de la construcción de laboratorios multifuncionales de las licenciaturas de Médico Cirujano Partero y Nutrición del CUCS. (CUCS) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

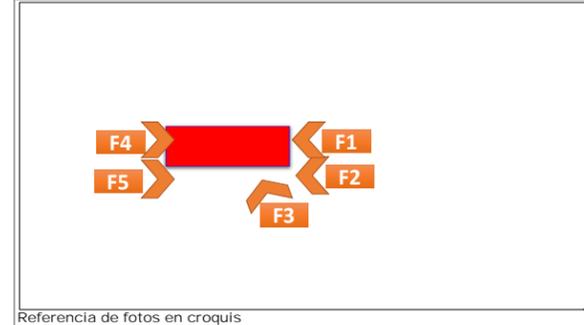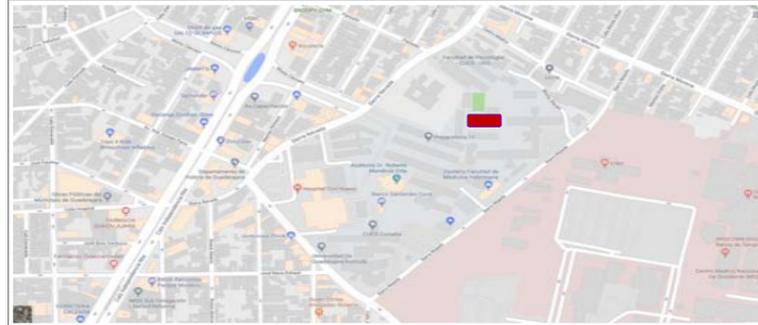

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Sierra Mojada # 950, Modulo U, Col. Independencia, C.P. 44340, Guadalajara, Jalisco, México

FOTOS



F1: Planta 1er Nivel



F2: Planta 2do Nivel



F3: Planta 3er Nivel



F4: Planta 1er Nivel



F5: Planta 2do Nivel

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra en proceso de restructuración

Ricardo Villanueva Comell  
Rector General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada  
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2019

AÑO

FAM  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Julio

FECHA DE CORTE: 20/07/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance


0

PRIORIDAD 3

Nombre de la obra:

P-3 Construcción de Edificio bioclimático de laboratorios para el Departamento de Ciencias de la Salud, del Centro Universitario de la Costa Sur, sede Anonas (CUCOSTASUR) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

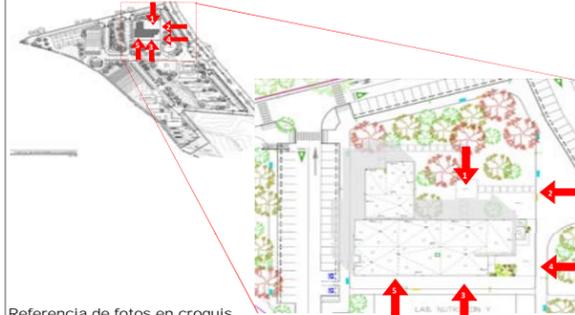

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Camino de Capaya S/N, Colonia Castellón, Autlán, Independencia Nacional #151 C.P. 48900, Autlán, Jalisco, México.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

**Comentarios de los trabajos realizados:**  
A la fecha del presente reporte no se cuenta con avance para esta etapa al no haber empresa contratada.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Fernando Villanueva Comel  
Rector General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Sobera Estrada  
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Julio

FECHA DE CORTE: 20/07/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 4

Nombre de la obra: P-4 Continuación del Edificio Recursos Tecnológicos y Análisis de Datos para la Academia de Investigación. III Etapa (CUTONALÁ) FAM 2019



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Nuevo Periférico No. 555 Ejido San José Tatepozco, C.P. 45425, Tonalá Jalisco, México

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra no iniciada



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Ricardo Villanueva Lomeli  
Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada  
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Julio

FECHA DE CORTE: 20/07/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0



PRIORIDAD

5

Nombre de la obra:

P-5 Continuación de Construcción Sede Tomatlán del Centro Universitario de la Costa, Edificio B. (CUCOSTA) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

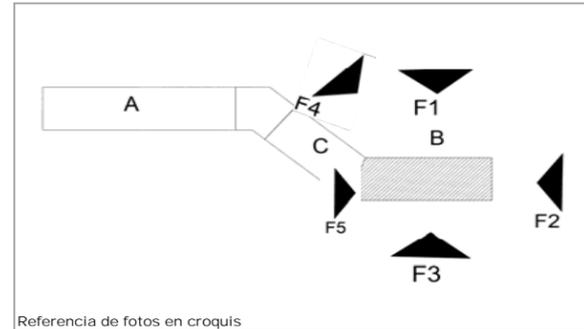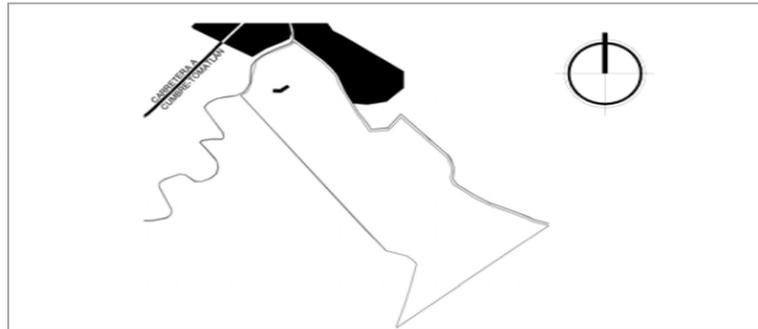

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera La Cumbre - Tomatlán, km. 2.116, Tomtlán, Jalisco.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:  
Obra no iniciada



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Lomeli  
Rector General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de la IES

Ino. Esteban Segura Estrada  
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Julio

FECHA DE CORTE: 20/07/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 6 Nombre de la obra: P-6 Conclusión de Auditorio de Usos Múltiples (CUNORTE) FAM 2019




Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

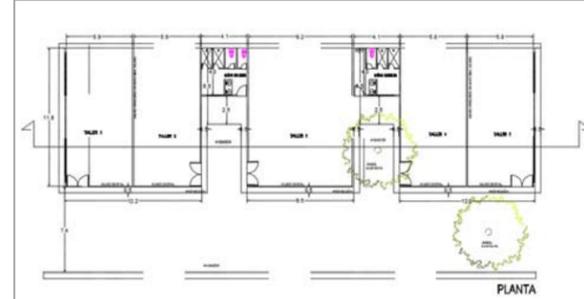

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Federal No. 23, Km. 191, C.P. 46200, Colotlán, Jalisco, México

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:  
Obra no iniciada



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Domínguez  
Rector General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada  
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Julio

FECHA DE CORTE: 20/07/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 7 Nombre de la obra: P-7 Continuación de Remodelación Clínica Escuela en el Centro Universitario del Sur (etapa 3) (CUSUR) FAM 2019





Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

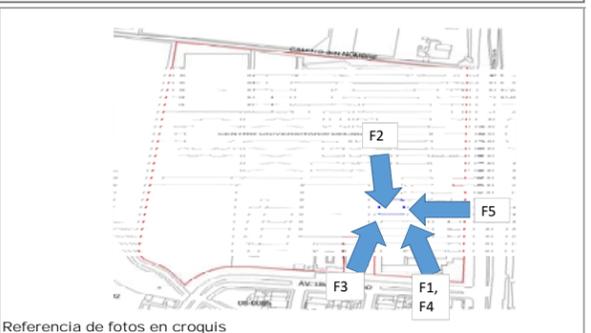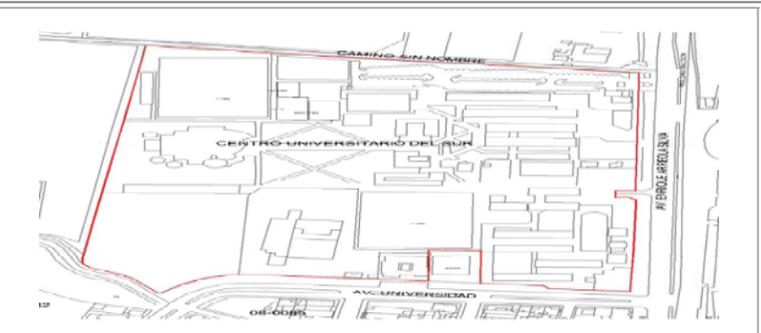

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Enrique Arreola Silva No. 883, colonia centro  
C.P. 49000, Ciudad Guzmán, Jalisco, México.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:  
Obra no iniciada



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Lomeli  
Rector General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Sotera Estrada  
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Julio

FECHA DE CORTE: 20/07/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 8

Nombre de la obra: P-8 Incorporación de energía solar al centro de formación Integral. (CUCEA) FAM 2019




Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

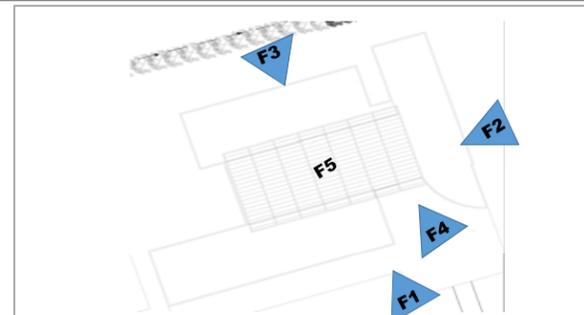

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Periférico Norte 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral


Comentarios de los trabajos realizados:  
Obra no iniciada



F3: Fachada posterior



F4: Entrada

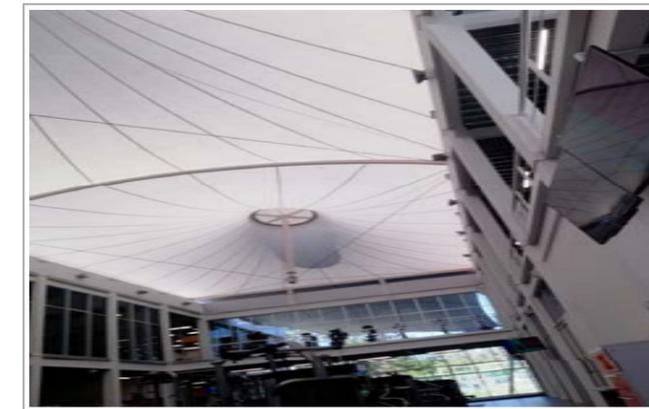

F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Comeli  
Rector General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada  
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Julio

FECHA DE CORTE: 20/07/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad


Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD 9

Nombre de la obra: P-9 Tercera etapa de construcción de edificio de 3 niveles destinado a aulas y servicios. (CUCEI) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

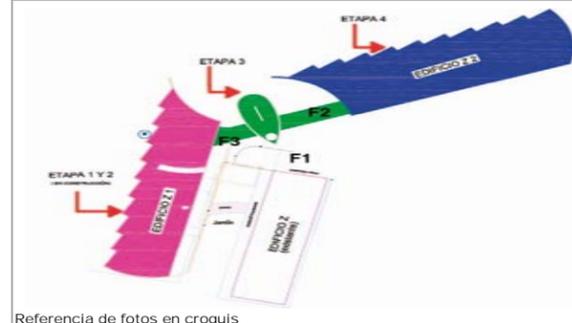

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Boulevard Marcelino Gracia Barragan No. 1421,  
Esquina Calzada Olimpica C.P 44430, Guadalajara,  
Jalisco.

FOTOS



F1: Fachada principal




F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:


Obra no iniciada



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Lemeli  
Rector General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Secura Estrada  
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Julio

FECHA DE CORTE: 20/07/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 10

Nombre de la obra: P-10 Equipamiento multimedia en aulas para clases (CUAAD) FAM 2019





Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

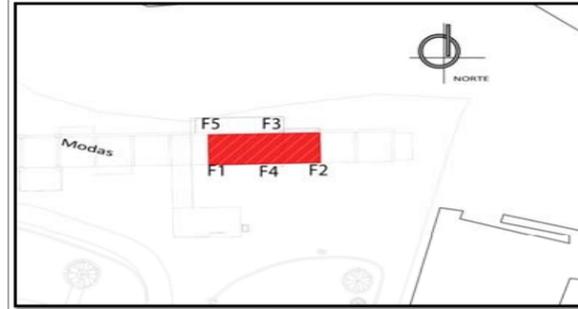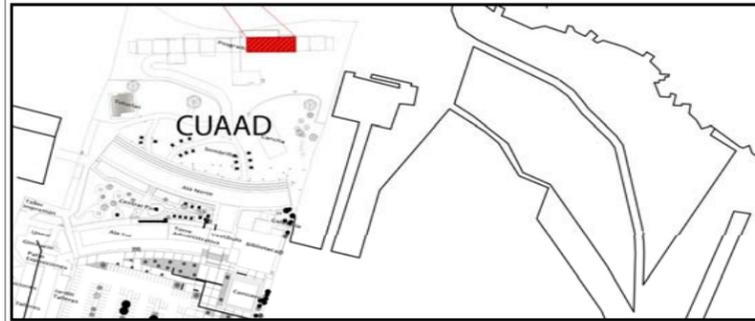

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calzada Independencia Norte no. 5075, Col. Huentitán El Bajo, C.P.44250 Guadalajara, Jal.

FOTOS




F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra no iniciada

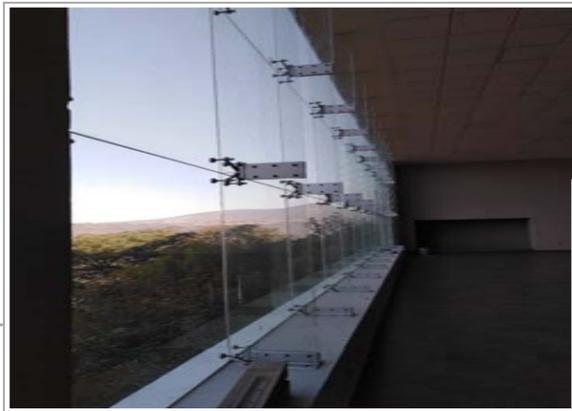

F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Lomeli  
Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Secora Estrada  
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
