

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad de Guadalajara**
Entidad federativa: Jalisco
Clave Inst 911: 14MSU010Z

Nombre: **Ing. Esteban Segura Estrada**
Cargo: Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Teléfono: 52 (01) 33 31342235 Ext 1801 y 1802
Correo electrónico: esegura@redudg.udg.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas													
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/ Equipo	Cantidad	Metros cuadrados				Inicio	Término			Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa													
																							¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?											
1	P-1 Centro de Recursos Informativos -CERI- Tercera Etapa (CUCBA). (CUCBA) FAM 2019	X					\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	Bibliotecas	2	950.00	Obra no iniciada	Suministro y colocación de acero estructural, cubierta de losa-acero, instalaciones hidrosanitarias.	0	30/06/19	31/12/19	En trámite Convenio con Gobierno del Estado y el INFEJAL para que la IES administre y contrate la obra.	No (Es obra de continuidad y falta asignar recursos para concluir el inmueble en su totalidad)																
		Oficinas Admivas	6	200.00																															
		Aulas didácticas	5	400.00																															
		Sanitarios	4	300.00																															
		Áreas comunes	10	1380.00																															
		Otros	5	1400.00																															
		TOTAL	32	4630.00																															
		2	P-2 Continuación de la construcción de laboratorios multifuncionales de las licenciaturas de Médico Cirujano Partero y Nutrición del CUCS. (CUCS) FAM 2019	X				\$ 5,453,808.00	\$ -	\$ 5,453,808.00	Aulas/salones	1												45.53	Obra no iniciada		0	30/06/19	31/12/19	En trámite Convenio con Gobierno del Estado y el INFEJAL para que la IES administre y contrate la obra.					
				Talleres	3	40.76																													
				Cubículos	3	46.63																													
Oficinas administrativas	19			364.99																															
Centros de cómputo	3			327.83																															
Aulas magnas	1			62.96																															
Aulas usos múltiples	2			76.36																															
Aulas didácticas	8			290.59																															
Sanitarios	7			81.24																															
Áreas comunes	3			906.24																															
Otros	3	49.87																																	
TOTAL	53.00	2293.00																																	
3	P-3 Construcción de edificio bioclimático de laboratorios para el Departamento de Ciencias de la Salud, del Centro Universitario de la Costa Sur, sede Anonas (CUCOSTASUR) FAM 2019	X				\$ 5,892,712.50	\$ -	\$ 5,892,712.50	Instalaciones sustentables: pvc con contenido de biosis, (polipropileno, polietileno y polietileno)	1	1045.55	Obra no iniciada	Continuidad de los trabajos de estructura a base de concreto reforzado y preparación de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, telecomunicaciones, gases y especiales	0	30/06/19	31/12/19	En trámite Convenio con Gobierno del Estado y el INFEJAL para que la IES administre y contrate la obra.																		
		Cimentación y estructura: materiales naturales de banco mejorados con cementantes	1	1901.00																															
		Albanilerías: ladrillos de barro precocido	1	1520.80																															
		Acabados en general: vitrio reciclado, lanas minerales, pinturas con base mineral	1	1267.33																															
		TOTAL	4.00	5734.68																															
4	P-4 Continuación del Edificio Recursos Tecnológicos y Análisis de Datos para la Academia de Investigación. III Etapa (CUTONALÁ) FAM 2019	X				\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	Aulas/salones	14	850.00	Obra no iniciada		0	30/06/19	31/12/19	En trámite Convenio con Gobierno del Estado y el INFEJAL para que la IES administre y contrate la obra.																		
		Cubículos	3	211.00																															
		Oficinas administrativas	6	286.00																															
		Aulas usos múltiples	3	202.00																															
		Aulas didácticas	3	633.00																															
		Sanitarios	3	104.00																															
		Áreas comunes	21	1020.00																															
		TOTAL	53.00	3366.00																															
5	P-5 Continuación de Construcción Sede Tomatán del Centro Universitario de la Costa, Edificio B. (CUCOSTA) FAM 2019	X				\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	Aulas/salones	7	408.31	Obra no iniciada		0	30/06/19	31/12/19	En trámite Convenio con Gobierno del Estado y el INFEJAL para que la IES administre y contrate la obra.																		
		Laboratorios	1	136.17																															
		Bibliotecas	1	82.34																															
		Oficinas administrativas	3	90.19																															
		Sanitarios	2	9.32																															
		Áreas comunes	4	350.23																															
		Otros	1	9.91																															
TOTAL	19.00	1086.47																																	
6	P-6 Conclusión de Auditorio de Usos Múltiples (CUNORTE) FAM 2019	X				\$ 3,472,850.37	\$ -	\$ 3,472,850.37	Talleres	5	640.00	Obra no iniciada		0	30/06/19	31/12/19	En trámite Convenio con Gobierno del Estado y el INFEJAL para que la IES administre y contrate la obra.																		
		Bibliotecas	1	17.00																															
		Oficinas administrativas	3	360.00																															
		Sanitarios	10	380.00																															
		Áreas comunes	4	3070.00																															
		Otros	3	140.00																															
TOTAL	26.00	4607.00																																	
7	P-7 Continuación de Remodelación Clínica Escuela en el Centro Universitario del Sur (etapa 3) (CUSUR) FAM 2019	X				\$ 4,005,700.00	\$ -	\$ 4,005,700.00	Laboratorios	4	108.59	Obra no iniciada		0	30/06/19	31/12/19	En trámite Convenio con Gobierno del Estado y el INFEJAL para que la IES administre y contrate la obra.																		
		Oficinas administrativas	7	80.96																															
		Áreas comunes	4	125.97																															
		Otros	5	112.35																															
		TOTAL	20.00	427.87																															
8	P-8 Incorporación de energía solar al centro de formación Integral. (CUCEA) FAM 2019	X				\$ 3,640,183.06	\$ -	\$ 3,640,183.06	Modulo Solar Fotovoltaico	248	Pza.	Obra no iniciada		0	30/06/19	31/12/19	En trámite Convenio con Gobierno del Estado y el INFEJAL para que la IES administre y contrate la obra.																		
		Panel Solar de 320w	1	Paquete																															
		Sistemas de Fijación para Paneles Inversor de Corriente 40TL	2	Pza.																															
		M480	1	Lote																															
		Protección, Lote de cables THWLS	1	Pza.																															
		Sistema de Monitoreo de Carga y Sistemas de Tierras físicas, Lote de cable para tierra	1	Lote																															
		Instalación completa del sistema (Levantamiento, Calentador Solar Industrial y Soporte de Colectores)	20	Pza.																															
		Termotanque 5000 lts Depósito de Agua Térmico,	1	Pza.																															
		Recirculación Bombas de Rectificación a 1/3 Sistema de Presurización, bomba vertical de Ascenso	2	Pza.																															
		Termotanque, recubrimiento en Ingenieros del Sistema, juego de planos hidráulicos y instalación completa del sistema. Incluye tubería antibacterial	1	Lote																															
		TOTAL	282.00	NA																															
		9	P-9 Tercera etapa de construcción de edificio de 3 niveles destinado a aulas y servicios. (CUCEI) FAM 2019	X				\$ 5,200,000.00	\$ -	\$ 5,200,000.00	Aulas/salones												11	920.00	Obra no iniciada		0	30/06/19	31/12/19	En trámite Convenio con Gobierno del Estado y el INFEJAL para que la IES administre y contrate la obra.					
				Oficinas académicas	1	54.00																													
				Sanitarios	4	90.30																													
				Áreas comunes	1	297.46																													
Otros	4			121.75																															
TOTAL	21.00	1483.51																																	
10	P-10 Equipamiento multimedia en aulas para clases (CUAAD) FAM 2019	X				\$ 2,900,000.00	\$ -	\$ 2,900,000.00	Equipamiento multimedia video	51	Pza.	Obra no iniciada		0	30/06/19	31/12/19	En trámite Convenio con Gobierno del Estado y el INFEJAL para que la IES administre y contrate la obra.																		
						\$45,565,253.93	\$0.00	\$45,565,253.93																											

Dr. Roberto Villanueva Lomeli
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

¹ Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.
² En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Mayo
FECHA DE CORTE: 25/05/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD 1 Nombre de la obra: P-1 Centro de Recursos Informativos -CERI- Tercera Etapa (CUCBA). (CUCBA) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

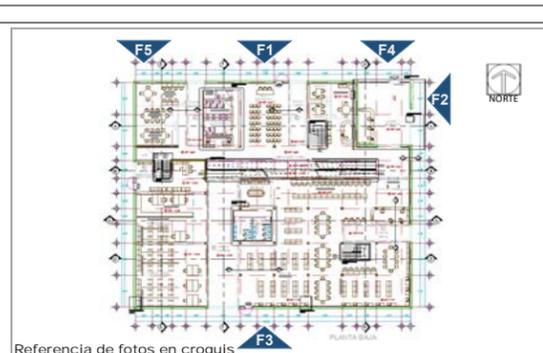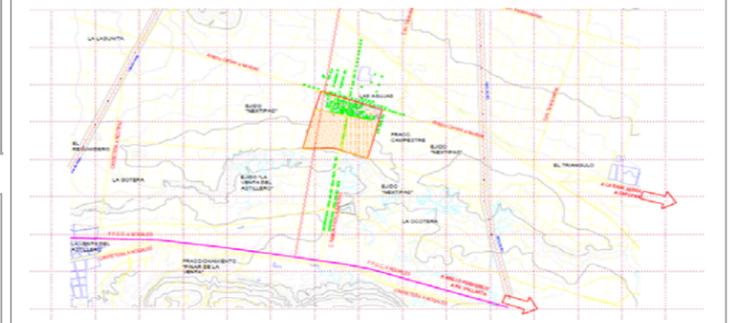

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

C. Ramón Padilla Sánchez #2100 Nextipac, Zapopan, Jalisco, México

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

1.- Se muestran imágenes del suministro y colocación de acero estructural de la última Etapa.

Dr. Ricardo Villanueva Comeli
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Serrera Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Mayo

FECHA DE CORTE: 28/05/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0


PRIORIDAD

2

Nombre de la obra:

P-2 Continuación de la construcción de laboratorios multifuncionales de las licenciaturas de Médico Cirujano Partero y Nutrición del CUCS. (CUCS) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Sierra Mojada # 950, Modulo U, Col. Independencia, C.P. 44340, Guadalajara, Jalisco, México

FOTOS



F1: Planta 1er Nivel



F2: Planta 2do Nivel



F3: Planta 3er Nivel



F4: Planta 1er Nivel



F5: Planta 2do Nivel

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra en proceso de restructuración

Dr. Ricardo Alanueva Jimenez
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Esteban Sagrera Estrada
Coordinador de Servicios Generales de Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Mayo

FECHA DE CORTE: 25/05/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD 3 Nombre de la obra:

P-3 Construcción de Edificio bioclimático de laboratorios para el Departamento de Ciencias de la Salud, del Centro Universitario de la Costa Sur, sede Anonas (CUCOSTASUR) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Camino de Capaya S/N, Colonia Castellón, Autlán,
Independencia Nacional #151
C.P. 48900, Autlán, Jalisco, México.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:
A la fecha del presente reporte no se cuenta con avance para esta etapa al no haber empresa contratada.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Domell
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Mayo

FECHA DE CORTE: 25/05/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD 4

Nombre de la obra: P-4 Continuación del Edificio Recursos Tecnológicos y Análisis de Datos para la Academia de Investigación. III Etapa (CUTONALÁ) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Nuevo Periférico No. 555 Ejido San José Tatepozco, C.P. 45425, Tonalá Jalisco, México

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra no iniciada



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Milanesva Lopez
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

ANO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Mayo

FECHA DE CORTE: 25/05/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

0



PRIORIDAD

5

Nombre de la obra:

P-5 Continuación de Construcción Sede Tomatlán del Centro Universitario de la Costa, Edificio B. (CUCOSTA) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

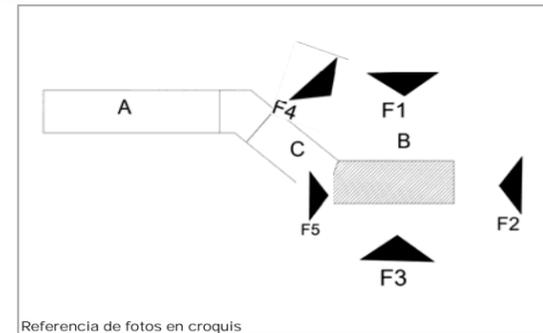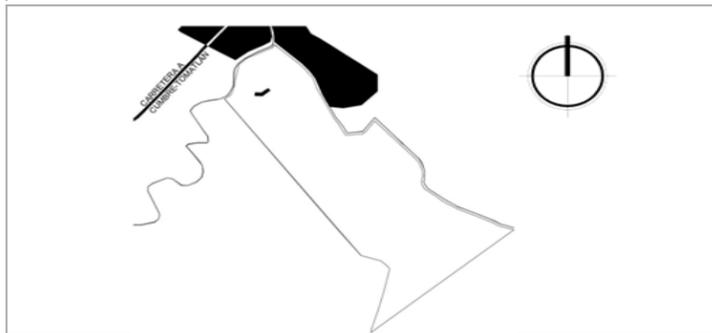

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera La Cumbre - Tomatlán, km. 2.116, Tomatlán, Jalisco.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:
Obra no iniciada



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Manuella Lovell
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Esteban Sepúlveda Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Mayo

FECHA DE CORTE: 25/05/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad


Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD 6

Nombre de la obra: P-6 Conclusión de Auditorio de Usos Múltiples (CUNORTE) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

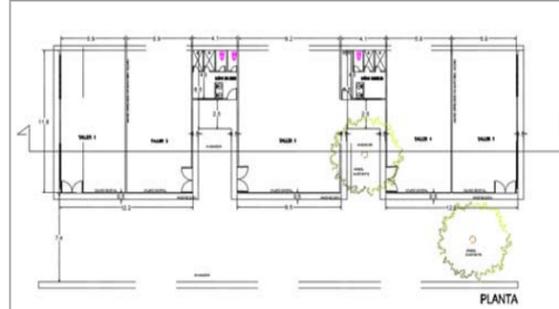

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Federal No. 23, Km. 191, C.P. 46200,
Colotlán, Jalisco, México

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra no iniciada

Dr. Ricardo Villanueva Jimeli
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Sanguera Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Mayo

FECHA DE CORTE: 25/05/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD 7

Nombre de la obra: P-7 Continuación de Remodelación Clínica Escuela en el Centro Universitario del Sur (etapa 3) (CUSUR) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

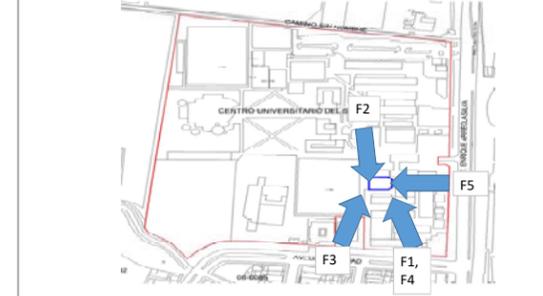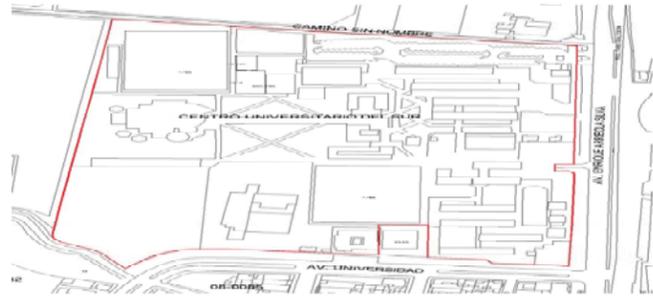

Referencia de fotos en croquis


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Enrique Arreola Silva No. 883, colonia centro
C.P. 49000, Ciudad Guzmán, Jalisco, México.

FOTOS



F1: Fachada principal

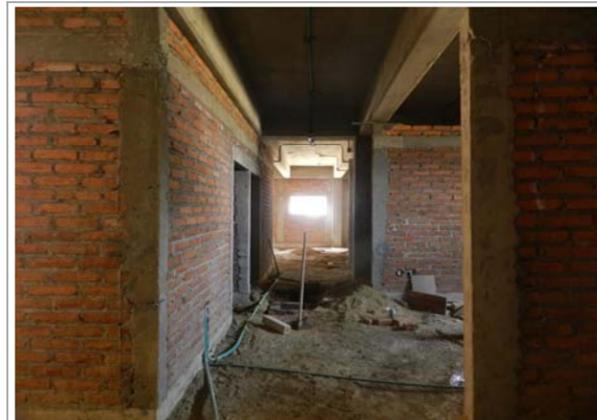

F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:
Obra no iniciada



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Lombelli
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Mayo

FECHA DE CORTE: 25/05/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad


Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD 8

Nombre de la obra: P-8 Incorporación de energía solar al centro de formación Integral. (CUCEA) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

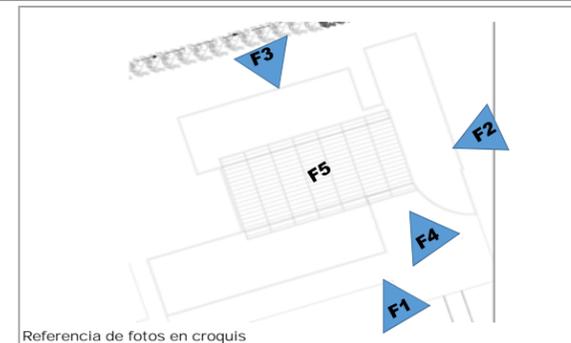


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Periférico Norte 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.

FOTOS



F1: Fachada principal

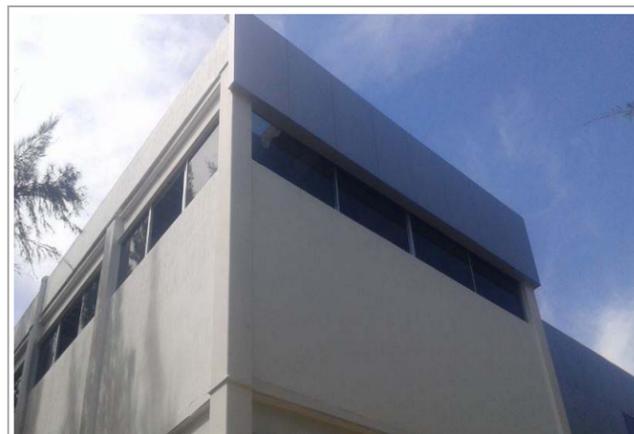

F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra no iniciada



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Jimeli
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Mayo

FECHA DE CORTE: 25/05/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD 9 Nombre de la obra: P-9 Tercera etapa de construcción de edificio de 3 niveles destinado a aulas y servicios. (CUCEI) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

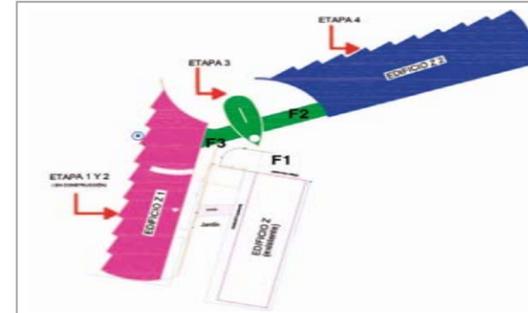

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Boulevard Marcelino Gracia Barragan No. 1421,
Esquina Calzada Olimpica C.P 44430, Guadalajara,
Jalisco.

FOTOS



F1: Fachada principal




F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:


Obra no iniciada



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Lemeli
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad
de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Mayo

FECHA DE CORTE: 25/05/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD 10 Nombre de la obra: P-10 Equipamiento multimedia en aulas para clases (CUAAD) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

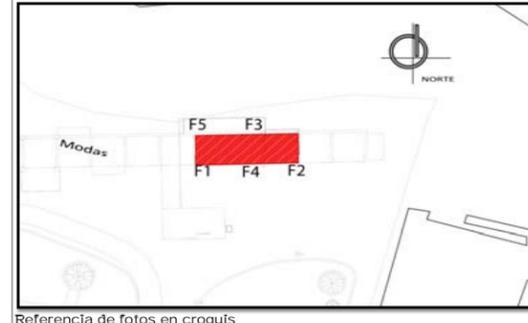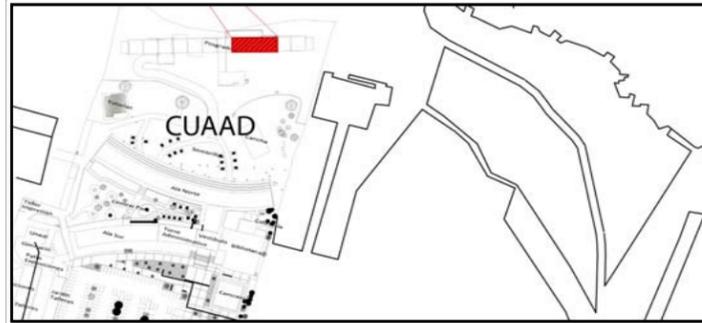

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calzada Independencia Norte no. 5075, Col. Huentitán El Bajo, C.P.44250 Guadalajara, Jal.

FOTOS




F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:
Obra no iniciada

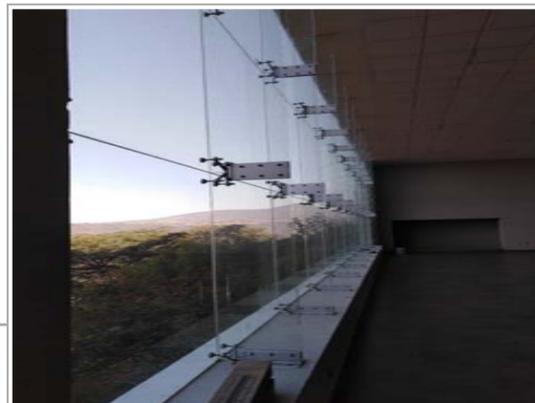

F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Lemeli
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.
