

2019
AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Noviembre
FECHA DE CORTE: 28/11/19

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad de Guadalajara**
Entidad federativa: Jalisco
Clave Inst 911: 14MSU0010Z

Nombre: Mtra. Paola Lycette Corona Gutiérrez
Cargo: Coordinador General de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara
Teléfono: 52 (01) 33 31342214 Ext 11202
Correo electrónico: paola.corona@copadi.udg.mx

Nombre: Ing. Esteban Segura Estrada
Cargo: Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Teléfono: 52 (01) 33 31342235 Ext 1801 y 1802
Correo electrónico: esegura@redudg.udg.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	Si ya fue inaugurada						
		Dirección de continuidad	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento				Proyectos sustentables	Espacio/Equipo	Cantidad				Metros cuadrados	Inicio		Término	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Cuenta con Actas		
																						Entrega- Recepción (Acta final)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
GLOBAL DEL PROYECTO																								
1	P-1 Centro de Recursos Informativos -CERJ- Tercera Etapa (CUCBA). (CUCBA) FAM 2019	X				\$ 5,000,000.00	\$ 1,482,846.42	\$ 3,517,153.58	Bibliotecas 2 950.00 Oficinas Admvas 6 200.00 Aulas didácticas 5 400.00 Sanitarios 4 300.00 Áreas comunes 10 1380.00 Otros 5 1400.00 TOTAL 32 4630.00	Habilitado, montaje y soldadura de la estructura metálica	Habilitado, montaje y soldadura de estructura metálica en áreas de azotea, y patios interiores.	59	04/11/19	31/12/19	En proceso.	No (Obra de continuidad, corresponde a etapa constructiva)								
2	P-2 Continuación de la construcción de laboratorios multifuncionales de las licenciaturas de Médico Cirujano Partero y Nutrición del CUCS. (CUCS) FAM 2019	X				\$ 5,453,808.00	\$ 1,635,830.29	\$ 3,817,977.71	Aulas/salones 1 45.53 Talleres 3 40.76 Cubículos 3 46.63 Oficinas administrativas 19 364.99 Centros de cómputo 3 327.83 Aulas magnas 1 62.96 Aulas usos múltiples 2 76.36 Aulas didácticas 8 290.59 Sanitarios 7 81.24 Áreas comunes 3 906.24 Otros 3 49.87 TOTAL 63.00 2293.00	Se ha realizado el anclaje de dados para soportar estructura y se ha iniciado trabajos de fontanería e hidráulicos en sanitarios.	Se está trabajando en la estructura metálica en fachada para la colocación posterior de recubrimiento	22	07/10/19	31/12/19	En proceso.	No (Obra de continuidad, corresponde a etapa constructiva)								
3	P-3 Construcción de edificio bioclimático de laboratorios para el Departamento de Ciencias de la Salud, del Centro Universitario de la Costa Sur, sede Anonas (CUCOSTASUR) FAM 2019	X				\$ 5,892,712.50	\$ 2,921,182.27	\$ 2,971,530.23	Instalaciones sustentables: PVC con contenido de biosidas, (polipropileno, polibuteno y polietileno) 1 1045.55 Cimentación y estructura naturales de barro mejorados con cementantes 1 1901.00 Albañilerías, ladrillos de barro precocido 1 1520.80 Acabados en general: vidrio reciclado, lanas minerales, pinturas con base mineral 1 1267.33 TOTAL 4.00 5734.68	Se cuenta con el acero de refuerzo suministrado y armado en los elementos estructurales y losas. Se encuentra fundado y preparado para recibir el concreto	Continuidad de los trabajos de estructura a base de concreto reforzado en dos niveles de la edificación y preparación de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, telecomunicaciones, gases y especiales	52	02/10/19	31/12/19	En proceso.	No (Obra de continuidad, corresponde a etapa constructiva)								
4	P-4 Continuación del Edificio Recursos Tecnológicos y Análisis de Datos para la Academia de Investigación. III Etapa (CUTONALÁ) FAM 2019	X				\$ 5,000,000.00	\$ 1,497,667.30	\$ 3,502,332.70	Aulas/salones 4 256.00 Laboratorios 3 192.00 Cubículos 8 512.00 Oficinas académicas 9 576.00 Oficinas administrativas 10 640.00 Centros de cómputo 12 768.00 Aulas magnas 4 256.00 Aulas usos múltiples 6 364.00 Aulas didácticas 3 637.00 Sanitarios 8 160.00 Áreas comunes 8 512.00 TOTAL 75.00 4893.00	Construcción de módulos sanitarios en planta baja, primer nivel de colocación de ductería eléctrica en planta baja	Instalaciones de voz y datos, construcción de módulo de baños	20	04/11/19	31/12/19	En proceso	No (Obra de continuidad, corresponde a etapa constructiva)								
5	P-5 Continuación de Construcción Sede Tomatán del Centro Universitario de la Costa, Edificio B. (CUCOSTA) FAM 2019	X				\$ 5,000,000.00	\$ 4,558,666.62	\$ 441,333.38	Aulas/salones 6 408.31 Laboratorios 1 136.17 Bibliotecas 1 82.34 Oficinas administrativas 3 90.19 Sanitarios 2 9.32 Áreas comunes 4 350.23 Otros 1 9.81 TOTAL 18.00 1086.47	Trabajos en cimentación y estructura. Colado y descimbrado de zapatas y muros de contención, habilitado de acero en columnas.	Cimbra en estructura Colado en estructura	60	10/10/19	31/12/19	En proceso.	No (Obra de continuidad, corresponde a etapa constructiva)								
6	P-6 Conclusión de Auditorio de Usos Múltiples (CUNORTE) FAM 2019	X				\$ 3,472,850.37	\$ 1,244,518.93	\$ 2,228,331.44	Talleres 5 640.00 Bibliotecas 1 17.00 Oficinas administrativas 3 360.00 Sanitarios 10 380.00 Áreas comunes 4 3070.00 Otros 3 140.00 TOTAL 26.00 4667.00	Se realizó el trazo, escarificación, armados, zapatas, contralabes, dados, anclajes, coladas y módulo de baños. Se condujo cimentación, rellenos, estructura, instalación de muros, módulo de baños, piso y recubrimientos del mismo, columnas, traves y lamina de losacero, salidas eléctricas para contactos y luminarias	Se colocará malla electrosoldada para realizar el colado de losacero, pisos de talleres, puertas y ventanas de aluminio, lámparas, accesorios de baño, áreas exteriores. Alimentaciones generales como agua luz y drenaje y detalles	55	07/10/19	21/12/19	En proceso.									
7	P-7 Continuación de Remodelación Clínica Escuela en el Centro Universitario del Sur (etapa 3) (CUSUR) FAM 2019	X				\$ 4,005,700.00	\$ 1,530,132.37	\$ 2,475,567.63	Laboratorios 4 108.59 Oficinas administrativas 7 80.96 Áreas comunes 4 125.97 Otros 5 112.35 TOTAL 20.00 427.87	Colocación de puertas de madera, colocación de carpinterías, movimiento de tierras obra exterior, colocación de estructura para elevador	Terracerías de obras exterior, conexiones de instalaciones hidráulicas, colocación de adoquín en obra exterior	18	17/09/19	31/12/19	En proceso.									
8	P-8 Incorporación de energía solar al centro de formación Integral. (CUCEA) FAM 2019	X				\$ 3,640,183.06	\$ 1,697,296.34	\$ 1,942,886.72	Acabados Fotelovoltaico 248 Pza. Baldoseres y Sistemas de Filación para Corriente 40TL 2 Pza. Módulo de Protección. Lote de cables THWLS. Sistema de Muebles de Carros y Sistemas de Tierras fijas. Lote de cable para tierra 1 Lote Instalación completa del sistema 1 Paquete Cableado Solar Industrial y Soporte de Colectores 20 Pza. Terminación 5000 ft. Depósito de Agua Térmico. 1 Pza. Reparación Bombas de Recogulación a 1/3 2 Pza. Sistema de Presurización, bomba vertical de Aslamiento 1 Pza. Terminación en regimenteros en Sistema Hidráulico y 1 Lote Instalación completa del sistema. Incluye: 1 Lote TOTAL 282.00 NA	Montaje de andamios de trabajo y preparación de sitios de trabajo.	Trabajos de instalación de sistema de fijación de paneles solares.	15	21/10/19	31/12/19	En proceso									
9	P-9 Tercera etapa de construcción de edificio de 3 niveles destinado a aulas y servicios. (CUCEI) FAM 2019	X				\$ 5,200,000.00	\$ 1,669,161.55	\$ 3,530,838.45	Aulas/salones 11 920.00 Oficinas académicas 1 54.00 Sanitarios 4 90.30 Áreas comunes 1 297.46 Otros 4 121.75 TOTAL 21.00 1483.51	Habilitado y armado de acero en muro MC-1 y trabe en escalera y descanso, así como relleno con material producto de excavación en entrase de muros de concreto en cimentación	Estructura, elementos complementarios de albañilería, acabados, herrería, instalación eléctrica, instalación hidráulica	22	03/10/19	31/12/19	En proceso									
10	P-10 Equipamiento multimedia en aulas para clases (CUAAD) FAM 2019	X				\$ 2,900,000.00	\$ -	\$ 2,900,000.00	Equipamiento multimedia video 32 Pza.	Equipo suministrado en proceso de instalación.	Se comenzaron los trabajos de instalación en aulas de la Sede de Huertacán	40	03/10/19	31/12/19	En proceso									
						\$45,665,263.93	\$18,237,302.09	\$27,327,961.84																

Darío Villanueva Laffont
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Noviembre

FECHA DE CORTE: 25/11/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance



59

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra: P-1 Centro de Recursos Informativos -CERI- Tercera Etapa (CUCBA). (CUCBA) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

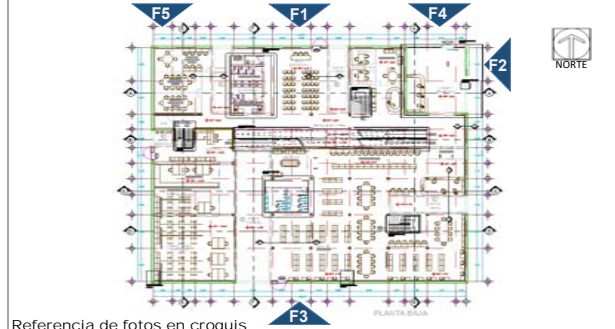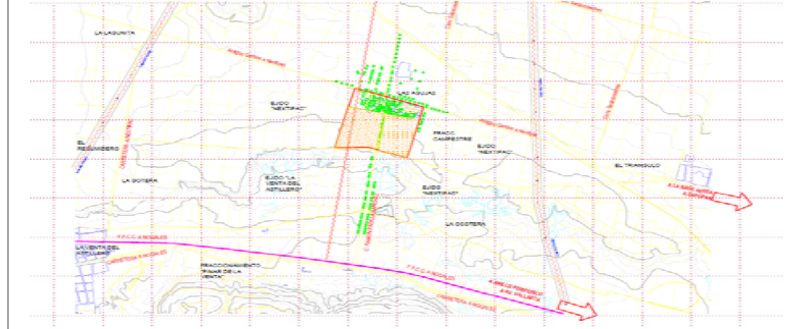

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

C. Ramón Padilla Sánchez #2100 Nextipac, Zapopan, Jalisco, México

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

1.- Se muestran imágenes de los avances que se tienen del suministro y montaje de acero en estructura.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Ricardo Villanueva Domínguez
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Serrera Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Noviembre

FECHA DE CORTE: 25/11/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad



Porcentaje de avance

22

PRIORIDAD 2 Nombre de la obra:

P-2 Continuación de la construcción de laboratorios multifuncionales de las licenciaturas de Médico Cirujano Partero y Nutrición del CUCS. (CUCS) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

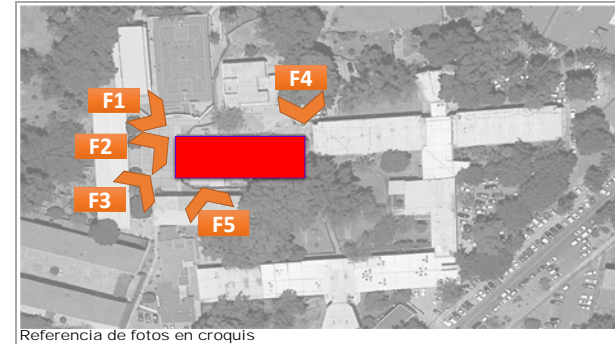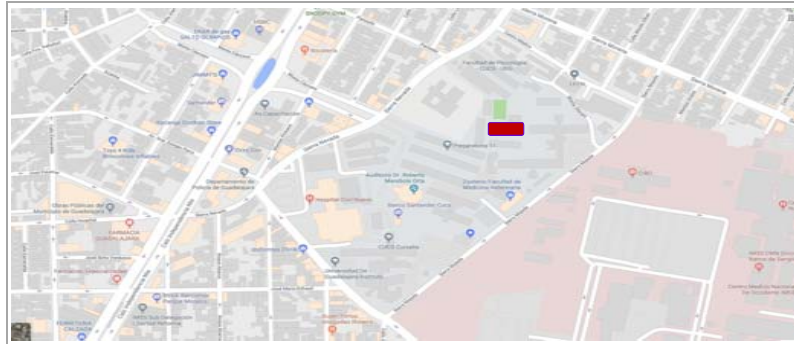

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Sierra Mojada # 950, Modulo U, Col. Independencia, C.P. 44340, Guadalajara, Jalisco, México

FOTOS



F1: Planta 1er Nivel



F2: Planta 2do Nivel



F3: Planta 3er Nivel



F4: Planta 1er Nivel



F5: Planta 2do Nivel

Comentarios de los trabajos realizados:

Se está trabajando en la estructura metálica en fachada para la colocación posterior de recubrimiento, se ha realizado el anclaje de dados para soportar estructura y se han iniciado trabajos de fontanería e hidráulicos en sanitarios.

Ricardo Villanueva Lomeli
Reg. en Gobierno de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Sagura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Noviembre

FECHA DE CORTE: 25/11/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad
Porcentaje de avance

52

PRIORIDAD 3 Nombre de la obra:

P-3 Construcción de Edificio bioclimático de laboratorios para el Departamento de Ciencias de la Salud, del Centro Universitario de la Costa Sur, sede Anonas (CUCOSTASUR) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Camino de Capaya S/N, Colonia Castellón, Autlán,
Independencia Nacional #151
C.P. 48900, Autlán, Jalisco, México.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:
Se cuenta con el acero de refuerzo suministrado y armado en los elementos estructurales y losas.
Se encuentra fondeado y preparado para recibir el concreto



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Ricardo Villanueva Comell
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Sorora Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Noviembre


FECHA DE CORTE: 25/11/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 4

Nombre de la obra: P-4 Continuación del Edificio Recursos Tecnológicos y Análisis de Datos para la Academia de Investigación. III Etapa (CUTONALA) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

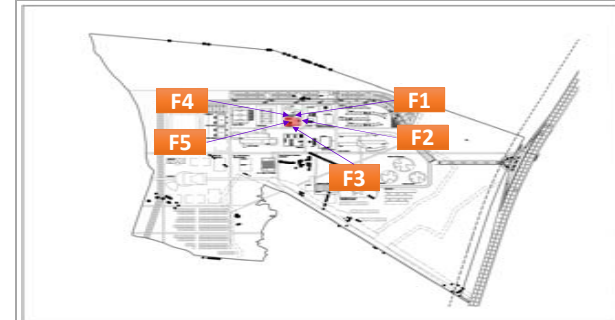

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Nuevo Periférico No. 555 Ejido San José Tatepozco, C.P. 45425, Tonalá Jalisco, México



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

20

FOTOS



F1: Colocación de ductos eléctricos



F2: Colocación de ductería eléctrica

Comentarios de los trabajos realizados:

Se muestran en las imágenes el avance de la construcción de módulo de baños de los diferentes niveles y la colocación de ductería eléctrica.




F3: Construcción de módulo de baños en planta baja y primer nivel




F4: Construcción de módulo de baños



F5: Colocación de ductería para luminaria


Ricardo Villanueva Lomeli
Rectór General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES


Ing. Esteban Sotera Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Noviembre

FECHA DE CORTE: 25/11/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad



Porcentaje de avance

60

PRIORIDAD 5

Nombre de la obra: P-5 Continuación de Construcción Sede Tomatlán del Centro Universitario de la Costa, Edificio B. (CUCOSTA) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

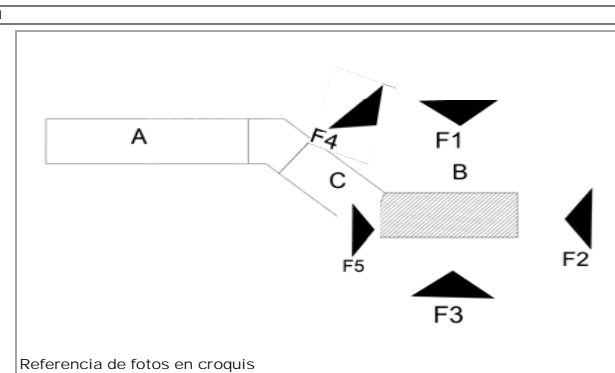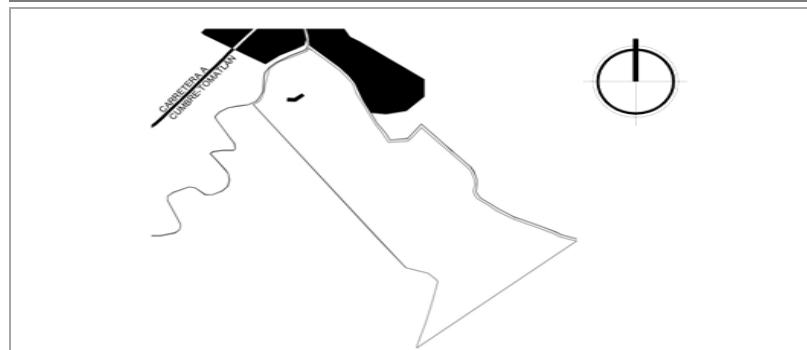

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera La Cumbre - Tomatlán, km. 2.116, Tomatlán, Jalisco.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Se trabaja en área de sótano de los ejes ① al ⑥ en lo siguiente:

- Colado de zapatas.
- Descimbra de zapatas.
- Habilitado de acero y cimbra de contratraves y dados.
- Habilitado de acero en Columnas.
- Colado y descimbra de muros de contención.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Ricardo Villanueva Comell
Recto General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ino. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Noviembre

FECHA DE CORTE: 25/11/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

55

PRIORIDAD 6 Nombre de la obra: P-6 Conclusión de Auditorio de Usos Múltiples (CUNORTE) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

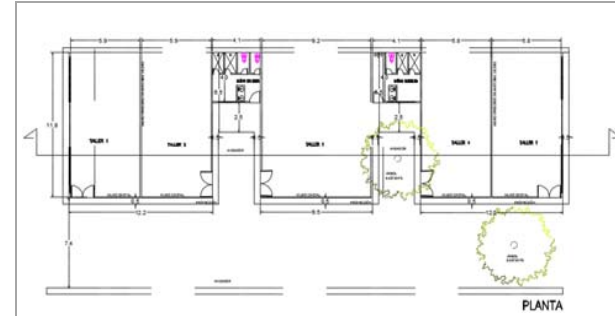

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Federal No. 23, Km. 191, C.P. 46200, Colotlán, Jalisco, México

FOTOS



F1: Cimentación, enrraces y rellenos



F2: Módulo de Baños

Comentarios de los trabajos realizados:
Los trabajos se han desarrollado de acuerdo al programa de ejecución los cuales se pretenden terminar a mediados del mes de diciembre.
Se realizó el trazo, excavación, armados, zapatas, contratraves, dados, anclas, colados y módulo de baños.
Se concluyó cimentación, rellenos, estructura, instalación de muros, modulo de baños, piso y recubrimientos del mismo, columnas, traves y lamina de losacero, salidas eléctricas para contactos y luminarias



F3: Muros y salidas eléctricas



F4: Estructura



F5: Lámina losacero

Ricardo Villanueva Lomeli
Revisor General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Sotomayor Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Noviembre

FECHA DE CORTE: 25/11/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 7

Nombre de la obra: P-7 Continuación de Remodelación Clínica Escuela en el Centro Universitario del Sur (etapa 3) (CUSUR) FAM 2019





Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

18

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

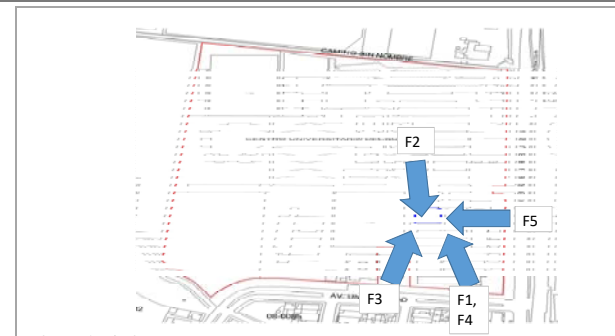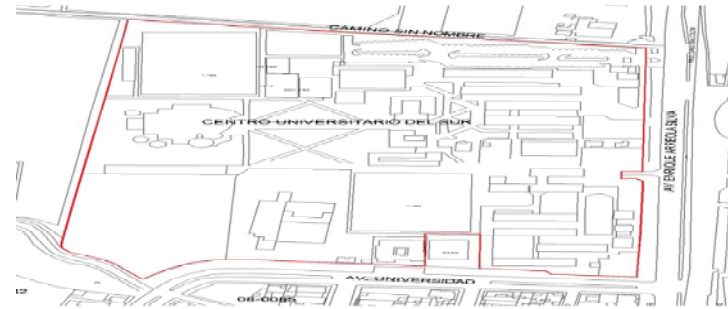

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Enrique Arreola Silva No. 883, colonia centro
C.P. 49000, Ciudad Guzmán, Jalisco, México.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:
Los trabajos realizados son:
Colocación de puertas de madera
Colocación de multipuertas
Movimiento de tierras en obra exterior
Colocación de estructura para elevador



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Jimeli
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Noviembre

FECHA DE CORTE: 25/11/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 8

Nombre de la obra: P-8 Incorporación de energía solar al centro de formación Integral. (CUCEA) FAM 2019





Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

15

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

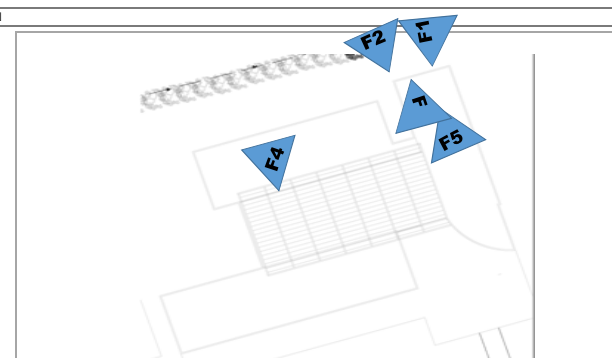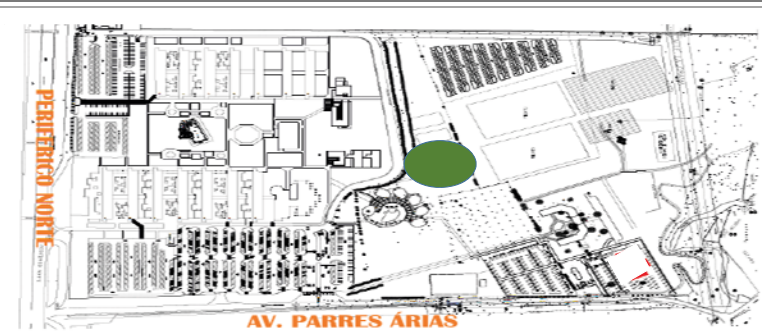

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Periférico Norte 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.

FOTOS



F1: Bodega de suministro



F2: Fachada posterior (instalación de andamios)

Comentarios de los trabajos realizados:
Se realiza la instalación de andamios y se habilitan las áreas de trabajo.
Se realiza el suministro de paneles solares e inversores.
Se inician los trabajos para la instalación del sistema de fijación de paneles solares.



F3: Preparación de espacio de trabajo



F4: Suministro en azotea



F5: Suministro en azotea

Ricardo Villanueva Lomeli
Rectór General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Noviembre

FECHA DE CORTE: 25/11/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

9

Nombre de la obra:

P-9 Tercera etapa de construcción de edificio de 3 niveles destinado a aulas y servicios. (CUCEI) FAM 2019




Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

22



CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

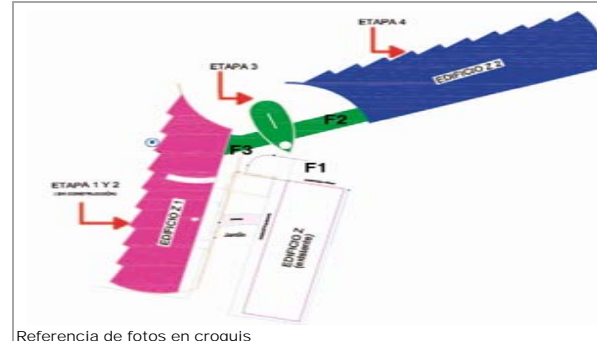

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Boulevard Marcelino Gracia Barragán No. 1421,
Esquina Calzada Olímpica C.P 44430, Guadalajara,
Jalisco.

FOTOS



F1: Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en cimentación



F2: Concreto en zapata corrida - Cimentación

Comentarios de los trabajos realizados:
Plantilla de concreto en zapatas en cimentación, suministro, habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo en cimentación.
Suministro y colocación de concreto premezclado bombeable en cimentación (zapatas).
Cimbra de acabado común en muros de cimentación MC-1
Se continua con trabajos de revestimiento de acero en MC-1 de estructura de planta baja, armando traves de faldón en descanso escalera.



F3: Concreto en zapatas aisladas en cimentación



F4: Cimbra en muro MC- Cimentación



F5: Cimentación

Ricardo Villanueva Lomeli
Regidor General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

J. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Noviembre

FECHA DE CORTE: 25/11/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad



Porcentaje de avance

40

PRIORIDAD 10

Nombre de la obra: P-10 Equipamiento multimedia en aulas para clases (CUAAD) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

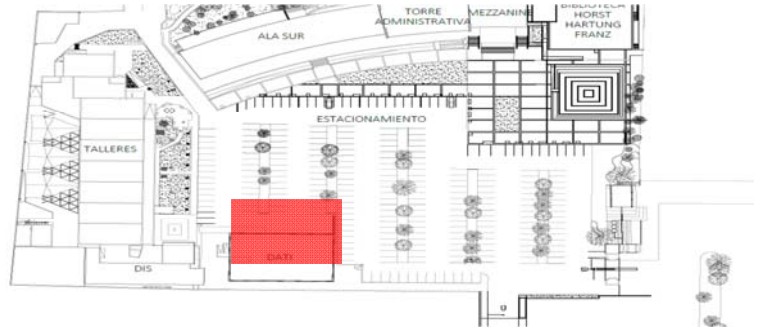


Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calzada Independencia Norte no. 5075, Col. Huentitán El Bajo, C.P.44250 Guadalajara, Jal.

FOTOS

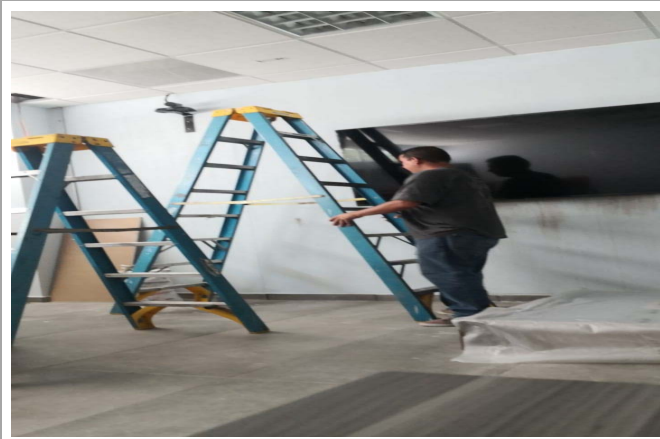


F1: Instalación de equipo



F2: Instalación de equipo

Comentarios de los trabajos realizados:
Imágenes del instalación del equipo.

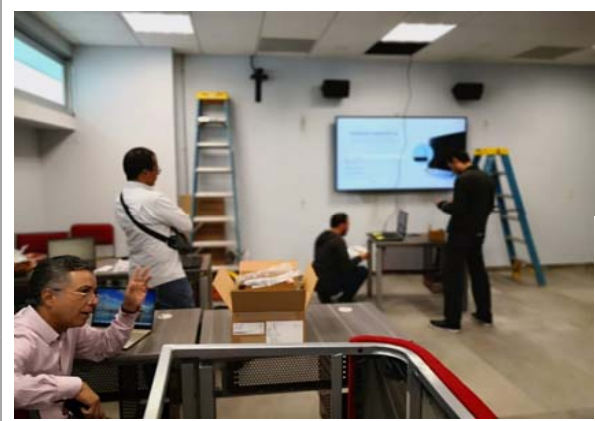

F3: Prueba del funcionamiento del equipo y programación



F4: Instalación de equipo



F5: Entrega del equipo

Ricardo Villanueva Comell
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Sepora Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
