

2019



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Octubre**

FECHA DE CORTE: 25/10/19

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

	Nombre: <b>Universidad de Guadalajara</b> Entidad federativa: Jalisco Clave Inst 911: 14MSU0010Z	RESPONSABLES	
	Nombre: <b>Mrs. Paola Lycoette Corona Gutiérrez</b> Cargo: <b>Coordinador General de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara</b> Teléfono: 52 (01) 33 31342214 Ext 11202 Correo electrónico: paola.corona@copladi.udg.mx	Nombre: <b>Ing. Esteban Segura Estrada</b> Cargo: <b>Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara</b> Teléfono: 52 (01) 33 31342235 Ext 1801 y 1802 Correo electrónico: esegura@redudg.udg.mx	
	Planeación	Obras y Mantenimiento	

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada			Cuenta con Actas		
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/Equipo	Cantidad				Metros cuadrados	Inicio			Término	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa		
																							¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?
1	P-1 Centro de Recursos Informativos -CERI- Tercera Etapa (CUCBA). (CUCBA) FAM 2019	X				\$ 5,000,000.00	\$ 1,482,846.42	\$ 3,517,153.58	Bibliotecas 2 950.00 Oficinas Admivas 6 200.00 Aulas didácticas 5 400.00 Sanitarios 4 300.00 Áreas comunes 10 1380.00 Otros 5 1400.00 <b>TOTAL 32 4630.00</b>	Obra contratada, se realiza visita para programar la entrega del área de trabajo	Habilitado de estructura metálica.	5	15/10/19	31/12/19	En proceso.	No (Obra de continuidad, corresponde a etapa constructiva)								
2	P-2 Continuación de la construcción de laboratorios multifuncionales de las licenciaturas de Médico Cirujano Partero y Nutrición del CUCS. (CUCS) FAM 2019	X				\$ 5,453,808.00	\$ 1,635,830.29	\$ 3,817,977.71	Aulas/salones 1 45.53 Talleres 3 40.76 Cubículos 3 46.63 Oficinas administrativas 19 364.99 Centros de cómputo 3 327.83 Aulas magnas 1 62.96 Aulas usos múltiples 2 76.36 Aulas didácticas 8 290.59 Sanitarios 7 81.24 Áreas comunes 3 906.24 Otros 3 49.87 <b>TOTAL 53.00 2293.00</b>	Obra iniciada, se realizan trabajos preliminares.	Terminación de azulejos, acabados en fachadas, instalación de equipos de aire acondicionado.	1	07/10/19	31/12/19	En proceso.	No (Obra de continuidad, corresponde a etapa constructiva)								
3	P-3 Construcción de edificio bioclimático de laboratorios para el Departamento de Ciencias de la Salud, del Centro Universitario de la Costa Sur, sede Anonas (CUCOSTASUR) FAM 2019		X			\$ 5,892,712.50	\$ -	\$ 5,892,712.50	Instalaciones sustentables: pvc con contenido de biosidas, (polipropileno, polibutirano y polietileno) 1 1045.55 Cimentación y estructura: materiales naturales de banco metélicos con cementantes 1 1901.00 Albanilerías: ladrillos de barro cocido 1 1520.80 Acabados en general: vidrio reciclado, lanas minerales, pinturas con base mineral 1 1267.33 <b>TOTAL 4.00 5734.68</b>	Obra contratada, se realiza visita para programar la entrega del área de trabajo	Continuidad de los trabajos de estructura a base de concreto reforzado en dos niveles de la edificación y preparación de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, telecomunicaciones, gases y especiales	5	02/10/19	31/12/19	En proceso.	No (Obra de continuidad, corresponde a etapa constructiva)								
4	P-4 Continuación del Edificio Recursos Tecnológicos y Análisis de Datos para la Academia de Investigación. III Etapa (CUTONALA) FAM 2019	X				\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	Aulas/salones 4 256.00 Laboratorios 3 192.00 Cubículos 8 512.00 Oficinas académicas 9 576.00 Oficinas administrativas 10 840.00 Centros de cómputo 12 768.00 Aulas magnas 4 256.00 Aulas usos múltiples 6 384.00 Aulas didácticas 3 637.00 Sanitarios 8 160.00 Áreas comunes 8 512.00 <b>TOTAL 75.00 4893.00</b>	Obra contratada, se realiza visita para programar la entrega del área de trabajo	Cancelería, instalaciones eléctricas, pases de porcelanito, instalaciones eléctricas	1	04/11/19	31/12/19	En proceso	No (Obra de continuidad, corresponde a etapa constructiva)								
5	P-5 Continuación de Construcción Sede Tomatlán del Centro Universitario de la Costa, Edificio B. (CUCOSTA) FAM 2019	X				\$ 5,000,000.00	\$ 1,499,619.29	\$ 3,500,380.71	Aulas/salones 7 408.31 Laboratorios 1 136.17 Bibliotecas 1 82.34 Oficinas administrativas 3 90.19 Sanitarios 2 9.32 Áreas comunes 4 350.23 Otros 1 9.91 <b>TOTAL 19.00 1086.47</b>	Trabajos en Cimentación, Excavación, Relleno, Planillas, Habilitado de Acero, Cimbrado.	Conclusión de colado en Cimentación, Cimbra en Estructura, Colado en Estructura.	15	10/10/19	31/12/19	En proceso.	No (Obra de continuidad, corresponde a etapa constructiva)								
6	P-6 Conclusión de Auditorio de Usos Múltiples (CUNORTE) FAM 2019	X				\$ 3,472,850.37	\$ 1,034,388.53	\$ 2,438,461.84	Talleres 5 640.00 Bibliotecas 1 17.00 Oficinas administrativas 3 360.00 Sanitarios 10 380.00 Áreas comunes 4 3070.00 Otros 3 140.00 <b>TOTAL 26.00 4607.00</b>	Se realizó el trazo, excavación, armados, zapatas, contratras, dados, anclas, colados y módulo de baños.	Terminación de módulo de baños, conclusión de cimentación, rellenos y muros de contención de taludes.	25	07/10/19	21/12/19	En proceso.									
7	P-7 Continuación de Remodelación Clínica Escuela en el Centro Universitario del Sur (etapa 3) (CUSUR) FAM 2019	X				\$ 4,005,700.00	\$ -	\$ 4,005,700.00	Laboratorios 4 108.59 Oficinas administrativas 7 80.96 Áreas comunes 4 125.97 Otros 5 112.35 <b>TOTAL 20.00 427.87</b>	Colocación de zócalo, Fondo para pintura en muros	Cancelería, iluminación, instalación sanitaria, red hidráulica	2	17/09/19	31/12/19	En proceso									
8	P-8 Incorporación de energía solar al centro de formación Integral. (CUCEA) FAM 2019		X			\$ 3,640,183.06	\$ -	\$ 3,640,183.06	Panel Solar Fotovoltaico 248 Pza. Sistema de Protección y Fijación para Inversor de Corriente 40TL M480 2 Pza. Medios de Protección, Lote de cables THW/LSL, Sistema de Monitoreo de Corriente y Sistemas de Tierras físicas, Lote de cable para tierra 1 Lote Instalación completa del sistema 1 Paquete Calefactor Solar Industrial y Soporte de Colectores 20 Pza. Terminación de 5000 lts Depósito de Agua Térmica, Recirculación Bombas de Recirculación a 1/3 Sistema de Presurización, bomba vertical de Alasamiento 1 Pza. Terminación, recubrimiento en Ingenierías del Sistema, Juego de plano Hidráulicos y 1 Lote Instalación completa del sistema. Incluye: 1 Lote <b>TOTAL 282.00 NA</b>	Se efectuó visita técnica de revisión y preparación de sitios de trabajo	Preparaciones para instalación hidráulica y eléctrica	5	21/10/19	31/12/19	En proceso									
9	P-9 Tercera etapa de construcción de edificio de 3 niveles destinado a aulas y servicios. (CUCEI) FAM 2019	X				\$ 5,200,000.00	\$ 1,547,691.62	\$ 3,652,308.38	Aulas/salones 11 920.00 Oficinas académicas 1 54.00 Sanitarios 4 90.30 Áreas comunes 1 297.46 Otros 4 121.75 <b>TOTAL 21.00 1483.51</b>	Preliminares En proceso de excavación, mejoramiento y relleno en área de cimentación desde nivel -2.00 hasta -4.80 m.	Habilitado y armado de zapatas, columnas y muros de concreto para desplante de cimentación. Cimentación, estructura, elementos complementarios de albanilería, acabados, herrería, instalación eléctrica, instalación hidráulica	5	03/10/19	31/12/19	En proceso									
10	P-10 Equipamiento multimedia en aulas para clases (CUAAD) FAM 2019	X				\$ 2,900,000.00	\$ -	\$ 2,900,000.00	Equipamiento multimedia video 33 Pza. <b>TOTAL 33.00 NA</b>	En proceso de suministro	Suministrar e instalar placas y pantallas	0	03/10/19	31/12/19	En proceso									
						\$45,665,253.93	\$7,200,376.15	\$38,364,877.78																

Ricardo Villalón Corneli  
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexas tanta filas como sea necesario.  
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2019

AÑO

FAM  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Octubre

FECHA DE CORTE: 25/10/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

5



PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

P-1 Centro de Recursos Informativos -CERI- Tercera Etapa (CUCBA). (CUCBA) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

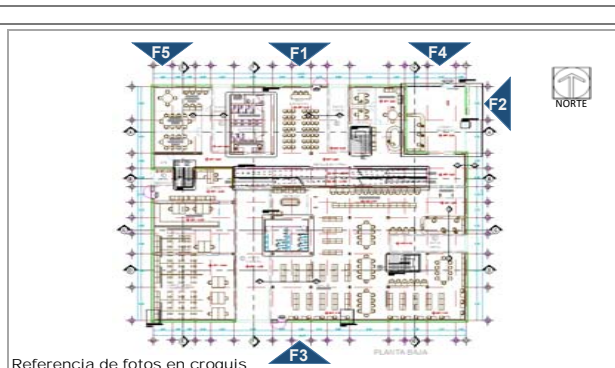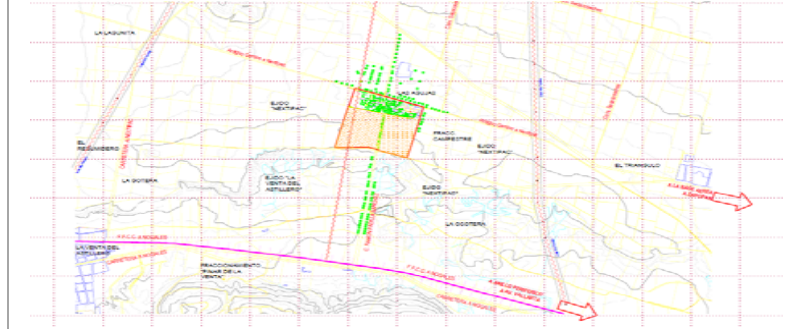

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

C. Ramón Padilla Sánchez #2100 Nextipac, Zapopan, Jalisco, México

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior




F4: Entrada




F5: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

- 1.- Se muestran imágenes de los avances que se tienen en la instalación de acero en estructura.
- 2.- Los trabajos que se realizaron en esta etapa son la habilitación de la estructura de la cubierta del Nivel 1 y del Nivel 2. Así como la colocación en una sección de losacero.

  
 Dr. Ricardo Villanueva Comelli  
 Rector General de la Universidad de Guadalajara  
 Nombre y firma del Titular de la IES

  
 Ing. Esteban Serrera Estrada  
 Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara  
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Octubre

FECHA DE CORTE: 25/10/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad



Porcentaje de avance

1

PRIORIDAD 2 Nombre de la obra:

P-2 Continuación de la construcción de laboratorios multifuncionales de las licenciaturas de Médico Cirujano Partero y Nutrición del CUCS. (CUCS) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

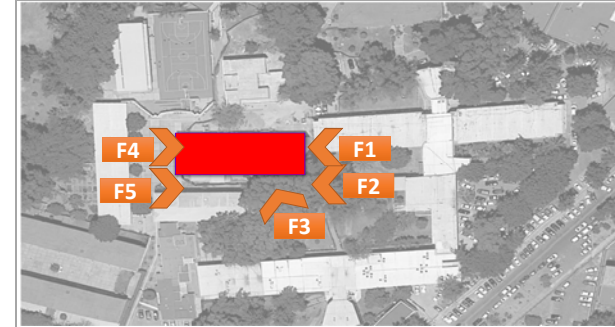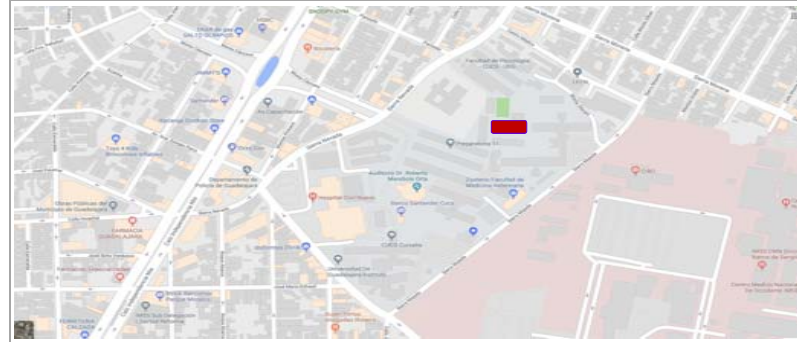

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Sierra Mojada # 950, Modulo U, Col. Independencia, C.P. 44340, Guadalajara, Jalisco, México

FOTOS



F1: Planta 1er Nivel



F2: Planta 2do Nivel



F3: Planta 3er Nivel



F4: Planta 1er Nivel



F5: Planta 2do Nivel

Comentarios de los trabajos realizados:

Se muestran imágenes de la etapa actual del edificio.

Ricardo Villanueva Lora  
Rector General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Sagura Estrada  
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

**Octubre**

FECHA DE CORTE: 25/10/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

5

PRIORIDAD 3 Nombre de la obra:

P-3 Construcción de Edificio bioclimático de laboratorios para el Departamento de Ciencias de la Salud, del Centro Universitario de la Costa Sur, sede Anonas (CUCOSTASUR) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Camino de Capaya S/N, Colonia Castellón, Autlán,  
Independencia Nacional #151  
C.P. 48900, Autlán, Jalisco, México.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Se muestran imágenes de la etapa actual.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Lamiel  
Rector General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Sorora Estrada  
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Octubre

FECHA DE CORTE: 25/10/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 4

Nombre de la obra: P-4 Continuación del Edificio Recursos Tecnológicos y Análisis de Datos para la Academia de Investigación. III Etapa (CUTONALA) FAM 2019




Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

1

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

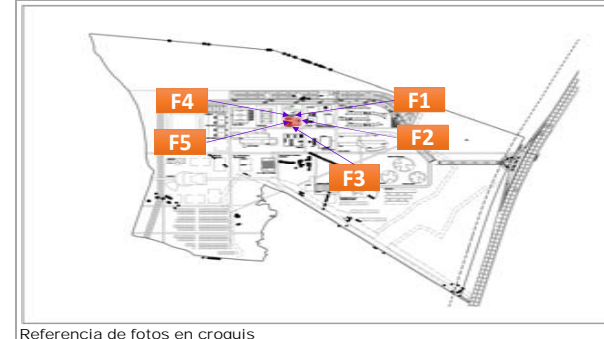

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Nuevo Periférico No. 555 Ejido San José Tatepozco, C.P. 45425, Tonalá Jalisco, México

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:  
Se muestran imágenes de la etapa actual del edificio.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Lemeli  
Rector General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Sotura Estrada  
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Octubre

FECHA DE CORTE: 25/10/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad



Porcentaje de avance

15

PRIORIDAD 5

Nombre de la obra: P-5 Continuación de Construcción Sede Tomatlán del Centro Universitario de la Costa, Edificio B. (CUCOSTA) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

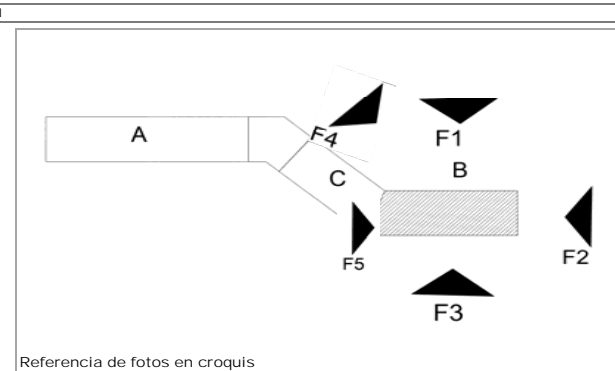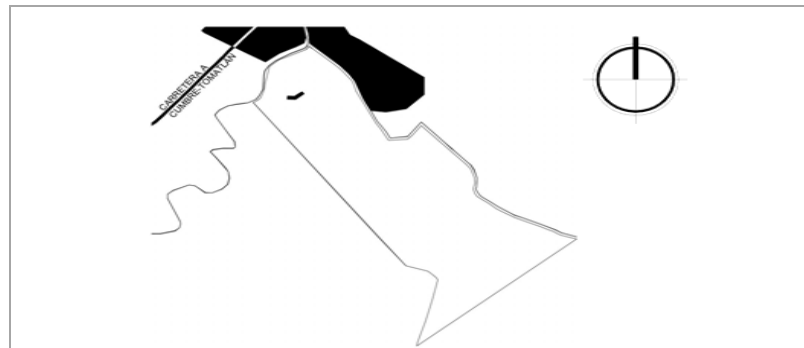

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera La Cumbre - Tomatlán, km. 2.116, Tomtlán, Jalisco.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

**Comentarios de los trabajos realizados:**

Se trabaja en área de sótano de los ejes @ al @ en lo siguiente:

- Limpieza, Trazo, Nivelación y Despalme.
- Excavación de cajón y cepas.
- Relleno de suelo cemento para desplante.
- Colocación de plantillas con concreto pobre.
- Armado de Zapatas.
- Armado de muros de contención.
- Armado de primeras columnas
- Cimbra de muros de contención.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva López  
Rector General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de la IES

Ino. Esteban Segura Estrada  
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Octubre

FECHA DE CORTE: 25/10/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad


Porcentaje de avance

25

PRIORIDAD 6

Nombre de la obra: P-6 Conclusión de Auditorio de Usos Múltiples (CUNORTE) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

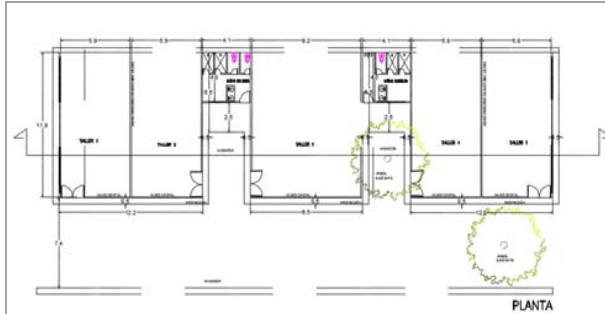

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Federal No. 23, Km. 191, C.P. 46200, Colotlán, Jalisco, México

FOTOS




F1: Escavación, cimentación y colado



F2: Cimentación

**Comentarios de los trabajos realizados:**  
Se realizó el trazo, escavación, armados, zapatas, contratraves, dados, anclas, colados y módulo de baños.

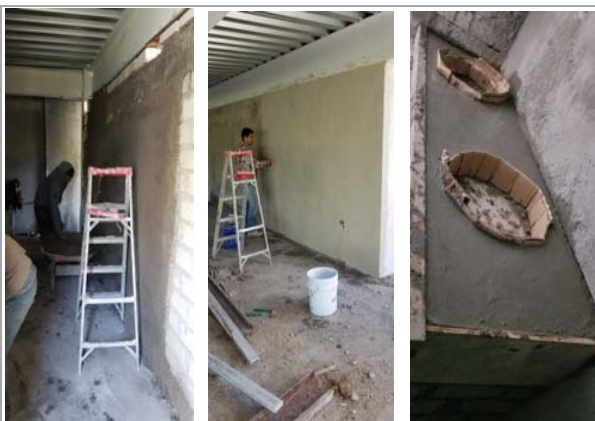

F3: Módulo de baños



F4: Enrraces y contenciones



F5: Enrraces y contenciones

Ricardo Villanueva Lencini  
Rector General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de la IES

Esteban Siguera Estrada  
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Octubre

FECHA DE CORTE: 25/10/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad



Porcentaje de avance

2

PRIORIDAD 7

Nombre de la obra: P-7 Continuación de Remodelación Clínica Escuela en el Centro Universitario del Sur (etapa 3) (CUSUR) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

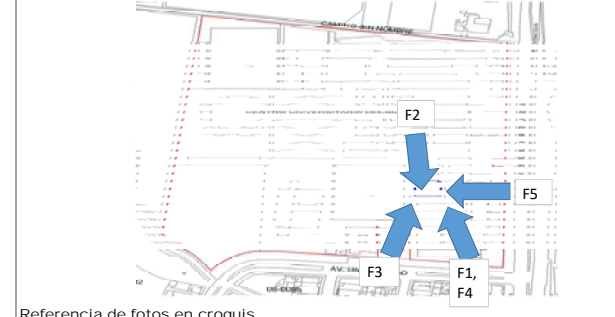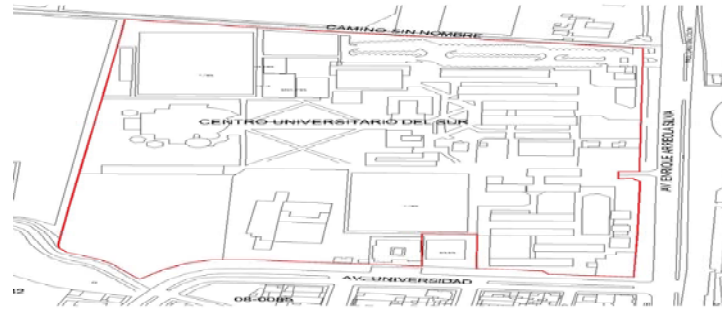

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Enrique Arreola Silva No. 883, colonia centro  
C.P. 49000, Ciudad Guzmán, Jalisco, México.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

**Comentarios de los trabajos realizados:**  
Los trabajos realizados son:  
Fondeo de muros.  
Colocación de zócalo



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Lemli  
Rector General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Saura Estrada  
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



2019

AÑO

FAM  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Octubre

FECHA DE CORTE: 25/10/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 8

Nombre de la obra: P-8 Incorporación de energía solar al centro de formación Integral. (CUCEA) FAM 2019





Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

5

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

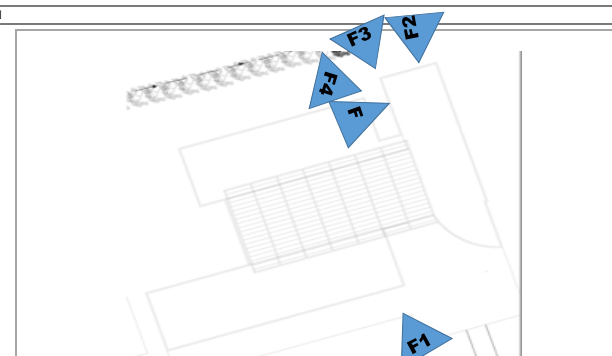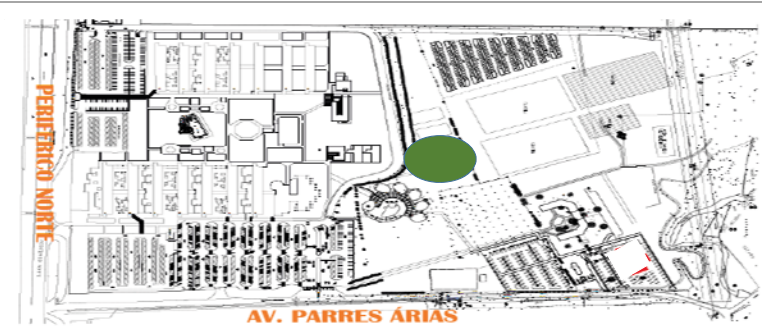

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Periférico Norte 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: tableros Cuarto de máquinas

Comentarios de los trabajos realizados:

Se realizan visitas técnicas y preparación de las instalaciones para el suministro de los equipos solares a instalar.



F3: Cuarto Eléctrico



F4: Cuarto Eléctrico



F5: Cuarto de máquinas

Ricardo Villanueva Jimeli  
Rector General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada  
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Octubre

FECHA DE CORTE: 25/10/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance


5

PRIORIDAD

9

Nombre de la obra: P-9 Tercera etapa de construcción de edificio de 3 niveles destinado a aulas y servicios. (CUCEI) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

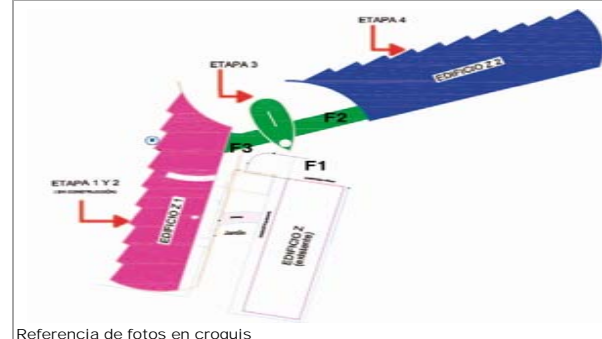

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Boulevard Marcelino Gracia Barragan No. 1421,  
Esquina Calzada Olimpica C.P 44430, Guadalajara,  
Jalisco.

FOTOS



F1: Trazo y excavación



F2: Excavación en caja 0.00 A -2.00 M



F3: Mejoramiento y relleno con material producto de excavación



F4: Relleno y compactación en capa de cimentación

Comentarios de los trabajos realizados:

Se encuentra en proceso de excavación, mejoramiento y relleno en área de cimentación desde nivel -2.00 hasta -4.80 m.

Se trabaja en habilitado y armado de zapatas, columnas y muros de concreto para desplante de cimentación.

Dr. Ricardo Villanueva Lomeli  
Rector General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada  
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2019

AÑO

FAM  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Octubre

FECHA DE CORTE: 25/10/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

10

Nombre de la obra:

P-10 Equipamiento multimedia en aulas para clases (CUAAD) FAM 2019





Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

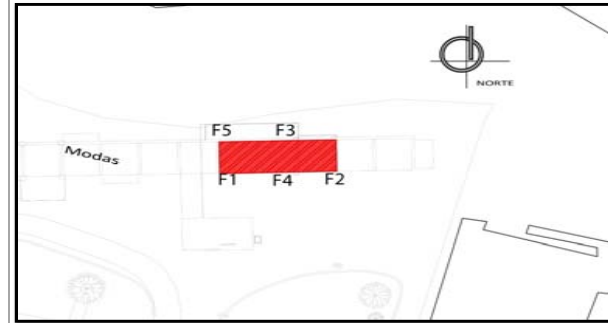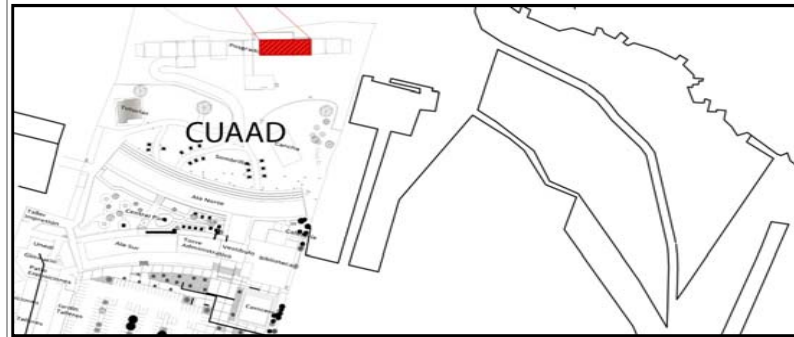

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calzada Independencia Norte no. 5075, Col. Huentitán El Bajo, C.P.44250 Guadalajara, Jal.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:  
Equipo por instalar.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Lora  
Rector General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada  
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
