

2019

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/19

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD


 Nombre: Universidad de Guadalajara
 Entidad federativa: Jalisco
 Clave Inst 911: 14MSU0010Z

RESPONSABLES

 Nombre: Mtra. Paola Lyceste Corona Gutiérrez
 Cargo: Coordinadora General de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara
 Teléfono: 52 (01) 33 31342214 Ext 11202
 Correo electrónico: ruben.garcia.sanchez@copladi.udg.mx

 Nombre: Ing. Esteban Segura Estrada
 Cargo: Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
 Teléfono: 52 (01) 33 31342235 Ext 1801 y 1802
 Correo electrónico: essegura@redudg.udg.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO
OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada						
		Obra de construcción	Equipamiento	Adaptaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacios/Equipo	Cantidad	Metros cuadrados				Cuenta con Actas										
																Entrega-Recpción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recpción			Montos de Acta Administrativa						
GLOBAL DEL PROYECTO																										
1	P-1 Centro de Recursos Informativos -CERI- Tercera Etapa (CUCBA). (CUCBA) FAM 2019	X					\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	Bibliotecas	2	950.00	Obra no iniciada	Obra no iniciada	0											
									Oficinas Académicas	6	200.00															
									Aulas didácticas	5	400.00															
									Sanitarios	4	300.00															
									Áreas comunes	10	1380.00															
									Otros	5	1400.00															
									TOTAL	32	4630.00															
2	P-2 Continuación de la construcción de laboratorios multifuncionales de las licenciaturas de Médico Cirujano Partero y Nutrición del CUCS. (CUCS) FAM 2019	X					\$ 5,453,808.00	\$ -	\$ 5,453,808.00	Aulas/salones	1	45.53	Obra no iniciada	Obra no iniciada	0											
									Talleres	3	40.76															
									Cubículos	3	46.63															
									Oficinas administrativas	19	364.99															
									Centros de cómputo	3	327.83															
									Aulas magnas	1	62.96															
									Aulas usos múltiples	2	76.36															
									Aulas didácticas	8	290.59															
									Sanitarios	7	81.24															
									Áreas comunes	3	906.24															
									Otros	3	49.87															
									TOTAL	53.00	2293.00															
3	P-3 Construcción de edificio bioclimático de laboratorios para el Departamento de Ciencias de la Salud, del Centro Universitario de la Costa Sur, sede Anonas (CUCOSTASUR) FAM 2019	X					\$ 5,892,712.50	\$ -	\$ 5,892,712.50	Instalaciones sustentables: pvc con contenido de biocidas, (polipropileno, polibutieno y polietileno)	1	1045.55	Obra no iniciada	Obra no iniciada	0											
									Cimentación y estructura: materiales naturales de banco mejorados con cementantes	1	1901.00															
									Abastecedorías: ladrillos de barro precocido	1	1520.80															
									Acabados en general: vidrio reciclado, lanas minerales, pinturas con base mineral	1	1267.33															
									TOTAL	4.00	5734.68															
4	P-4 Continuación del Edificio Recursos Tecnológicos y Análisis de Datos para la Academia de Investigación. III Etapa (CUTONAL) FAM 2019	X					\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	Aulas/salones	14	850.00	Obra no iniciada	Obra no iniciada	0											
									Cubículos	3	211.00															
									Oficinas administrativas	6	286.00															
									Aulas usos múltiples	3	202.00															
									Aulas didácticas	3	633.00															
									Sanitarios	3	104.00															
									Áreas comunes	21	1020.00															
									TOTAL	53.00	3306.00															
5	Continuación de Construcción Sede Tomatlán del Centro Universitario de la Costa, Edificio B. (CUCOSTA) FAM 2019	X					\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	Aulas/salones	7	408.31	Obra no iniciada	Obra no iniciada	0											
									Laboratorios	1	136.17															
									Bibliotecas	1	82.34															
									Oficinas administrativas	3	90.19															
									Sanitarios	2	9.32															
									Áreas comunes	4	350.23															
									Otros	1	9.31															
									TOTAL	19.00	1086.47															
6	P-6 Conclusión de Auditorio de Usos Múltiples (CUNORTE) FAM 2019	X					\$ 3,472,850.37	\$ -	\$ 3,472,850.37	Talleres	5	640.00	Obra no iniciada	Obra no iniciada	0											
									Bibliotecas	1	17.00															
									Oficinas administrativas	3	360.00															
									Sanitarios	10	380.00															
									Áreas comunes	4	3070.00															
									Otros	3	140.00															
									TOTAL	26.00	4607.00															
7	P-7 Continuación de Remodelación Clínica Escuela en el Centro Universitario del Sur (etapa 3) (CUSUR) FAM 2019	X					\$ 4,005,700.00	\$ -	\$ 4,005,700.00	Laboratorios	4	108.59	Obra no iniciada	Obra no iniciada	0											
									Oficinas administrativas	7	80.96															
									Áreas comunes	4	125.97															
									Otros	5	112.35															
									TOTAL	20.00	427.87															
8	P-8 Incorporación de energía solar al centro de formación Integral. (CUCEA) FAM 2019	X					\$ 3,640,183.06	\$ -	\$ 3,640,183.06	Modulo Solar Fotovoltaico	248	Pza.	Obra no iniciada	Obra no iniciada	0											
									Panel Solar de Bases y Sistemas de Fijación para Inversión de Corriente 40TL	1	Paquete															
									M400	2	Pza.															
									Medios de Protección, Lote de cables THW/LS.	1	Lote															
									Sistema de Monitoreo de Corriente y Sistemas de Tierras físicas. Lote de cable para tierra.	1	Lote															
									Instalación completa del sistema.	1	Paquete															
									Cableado Solar Industrial y Soporte de Coletores Termomódulos 5000	20	Pza.															
									Deposito de Agua Limpia. Recirculación	1	Pza.															
									Bombas de Recirculación a 1/3	2	Pza.															
									Sistema de Presurización, bomba vertical de Adaliento	1	Pza.															
									Termostato, recubrimiento en epoxi	1	Lote															
									Sistema, juego de planos Hidráulicos y	1	Lote															
									Instalación completa del sistema. Incluye:	1	Lote															
									TOTAL	282.00	NA															
9	P-9 Tercera etapa de construcción de edificio de 3 niveles destinado a aulas y servicios. (CUCEI) FAM 2019	X					\$ 5,200,000.00	\$ -	\$ 5,200,000.00	Aulas/salones	11	920.00								Obra no iniciada	Obra no iniciada	0				
									Oficinas académicas	1	54.00															
									Sanitarios	4	90.30															
									Áreas comunes	1	297.46															
									Otros	4	121.75															
									TOTAL	21.00	1483.51															
10	P-10 Equipamiento multimedia en aulas para clases (CUAAD) FAM 2019	X					\$ 2,900,000.00	\$ -	\$ 2,900,000.00	Equipamiento multimedia video	20	Pza.	Obra no iniciada	Obra no iniciada	0											
									TOTAL	20.00	NA															

\$45,565,253.93 \$0.00 \$45,565,253.93

 Dr. Ricardo Villanueva Leñell
 Rector General de la Universidad de Guadalajara
 Nombre y firma del Titular de la IES

 Ing. Esteban Segura Estrada
 Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturaron los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas fotos como sea necesario.

2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0



PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

P-1 Centro de Recursos Informativos -CERI- Tercera Etapa (CUCBA). (CUCBA) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

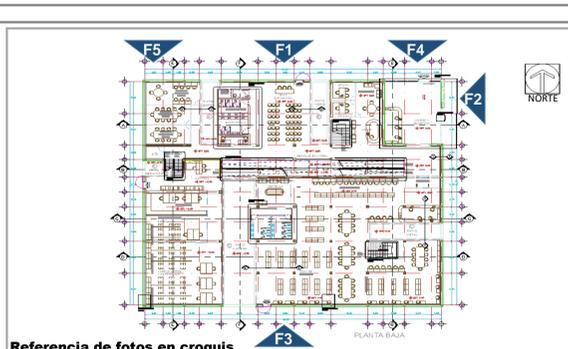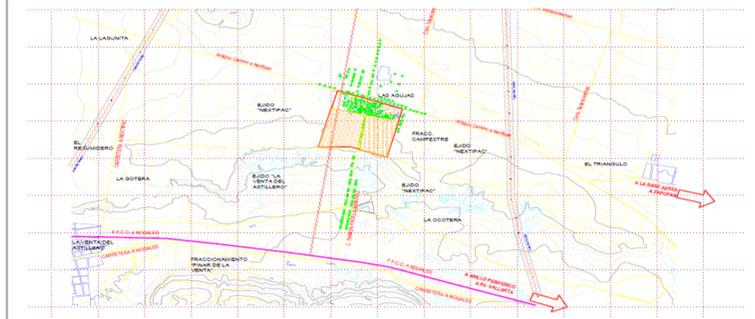


Referencia de fotos en croquis


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

C. Ramón Padilla Sánchez #2100 Nextipac, Zapopan, Jalisco, México

FOTOS

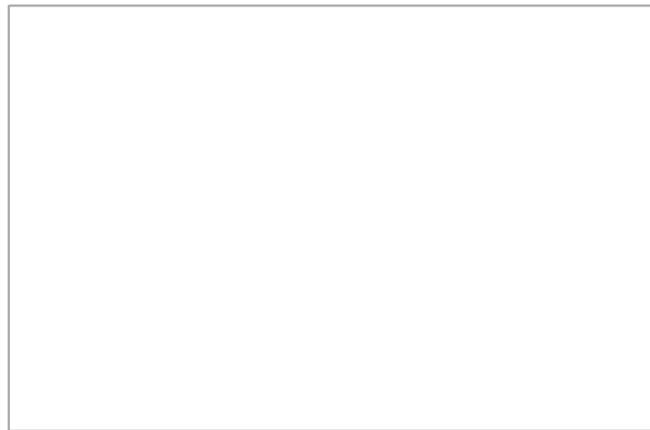


F1: Fachada principal

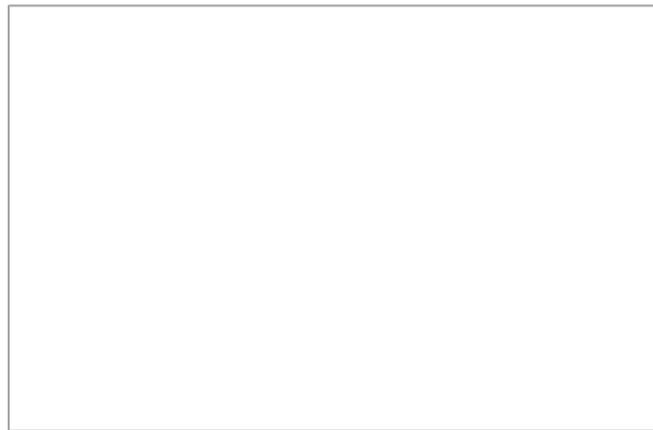


F2: lateral


Comentarios de los trabajos realizados:
Obra no iniciada



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Comeli
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD **2** Nombre de la obra:

P-2 Continuación de la construcción de laboratorios multifuncionales de las licenciaturas de Médico Cirujano Partero y Nutrición del CUCS. (CUCS) FAM 2019

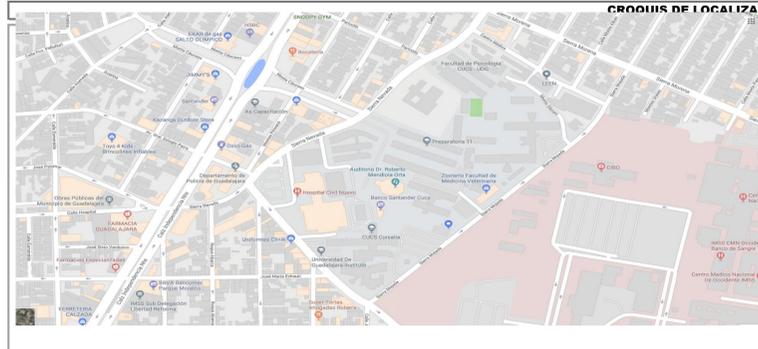

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




Referencia de fotos en croquis


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Sierra Mojada # 950, Modulo U, Col. Independencia,
C.P. 44340, Guadalajara, Jalisco, México

FOTOS

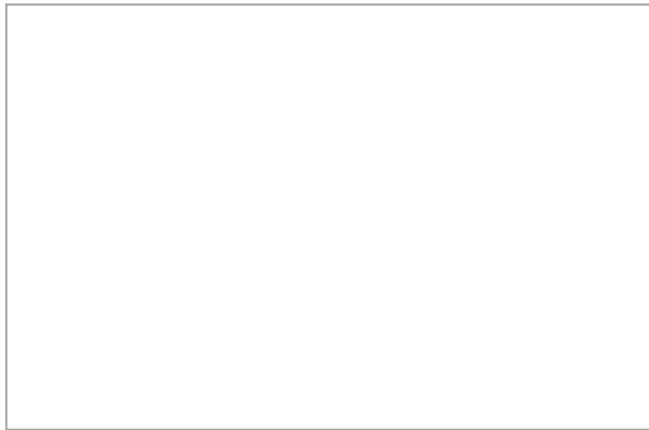


F1: Fachada principal

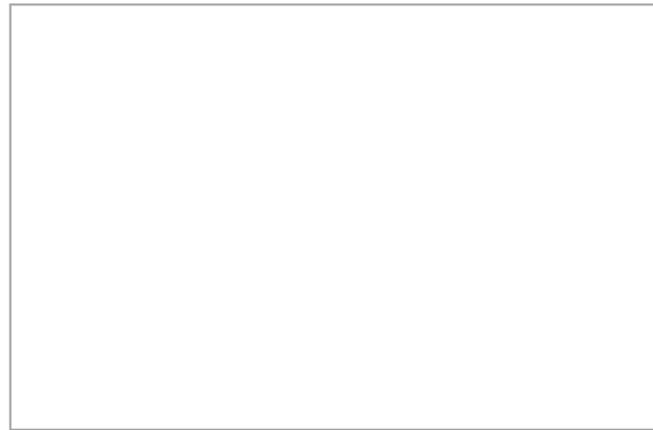


F2: lateral


Comentarios de los trabajos realizados:
Obra no iniciada



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Loguani
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.**

2019

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD 3 Nombre de la obra:

P-3 Construcción de Edificio bioclimático de laboratorios para el Departamento de Ciencias de la Salud, del Centro Universitario de la Costa Sur, sede Anonas (CUCOSTASUR) FAM 2019


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

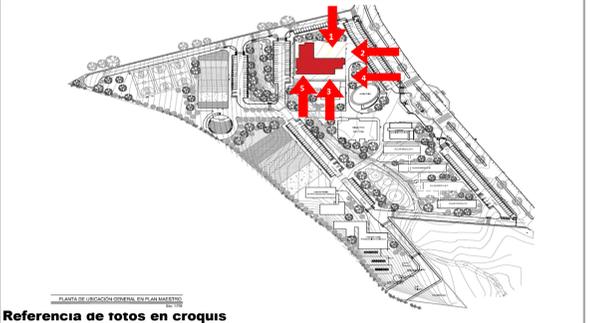


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Camino de Capaya S/N, Colonia Castellón, Autlán,
Independencia Nacional #151
C.P. 48900, Autlán, Jalisco, México.

FOTOS

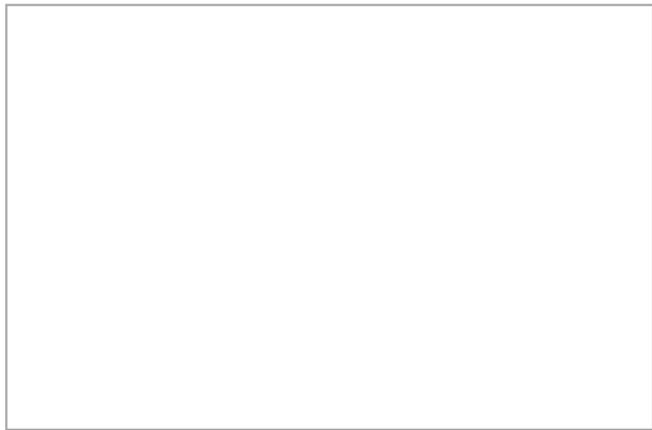


F1: Fachada principal

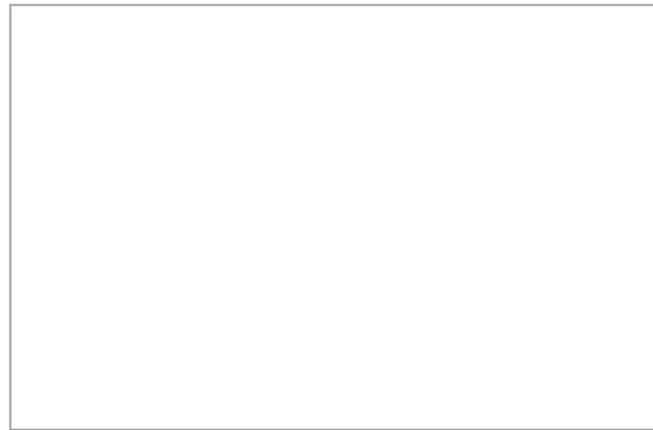


F2: lateral


Comentarios de los trabajos realizados:
Obra no iniciada



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Lomelí
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **4**

Nombre de la obra: **P-4 Continuación del Edificio Recursos Tecnológicos y Análisis de Datos para la Academia de Investigación. III Etapa (CUTONALÁ) FAM 2019**



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




Referencia de fotos en croquis


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Nuevo Periférico No. 555 Ejido San José
Tatepozco, C.P. 45425, Tonalá Jalisco, México

FOTOS




F1: Fachada principal




F2: lateral


Comentarios de los trabajos realizados:
Obra no iniciada



F3: Fachada posterior



F4: Entrada

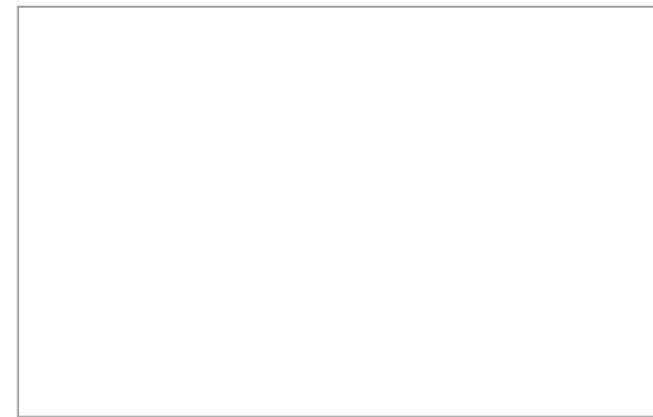

F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Lomeli
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Sotera Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad



Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD **5**

Nombre de la obra: **Continuación de Construcción Sede Tomatlán del Centro Universitario de la Costa, Edificio B. (CUCOSTA) FAM 2019**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

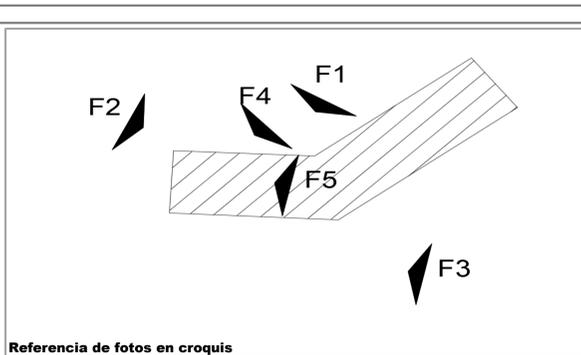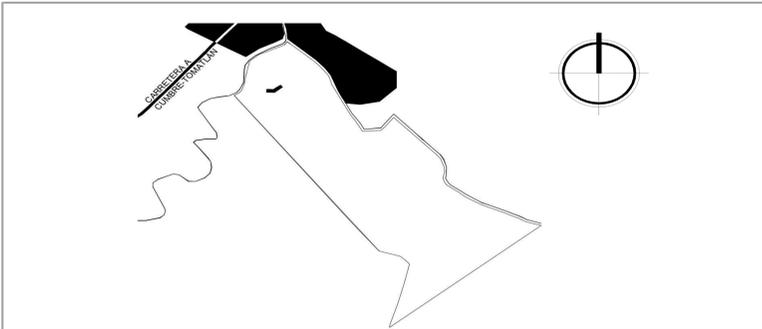


Referencia de fotos en croquis


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera La Cumbre - Tomatlán, km. 2.116, Tomatlán, Jalisco.

FOTOS




F1: Fachada principal




F2: lateral


Comentarios de los trabajos realizados:
Obra no iniciada



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Lopez
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **6**

Nombre de la obra: **P-6 Conclusión de Auditorio de Usos Múltiples (CUNORTE) FAM 2019**





Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

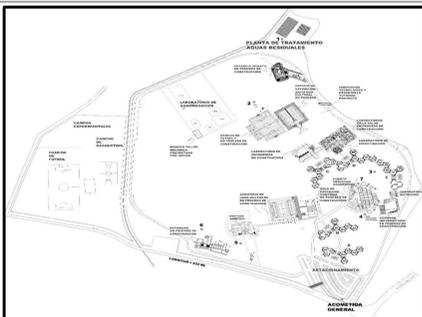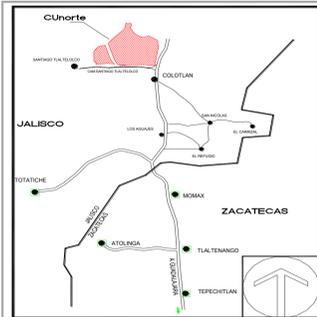


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO


Carretera Federal No. 23, Km. 191, C.P. 46200,
Colotlán, Jalisco, México

Referencia de fotos en croquis

FOTOS

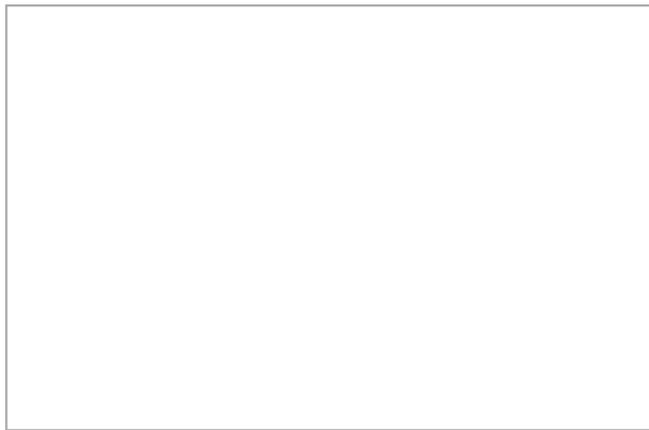


F1: Fachada principal

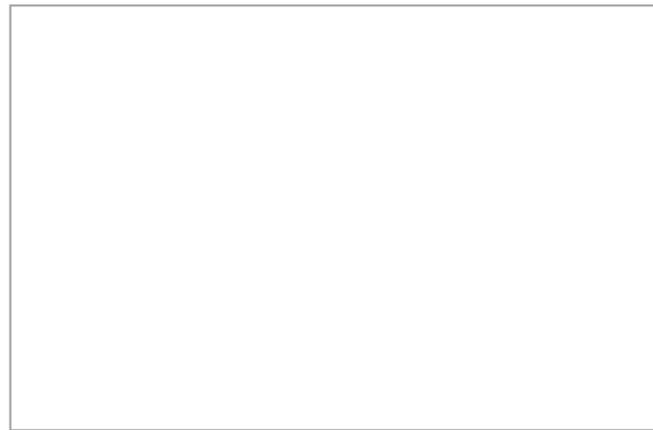


F2: lateral


Comentarios de los trabajos realizados:
Obra no iniciada

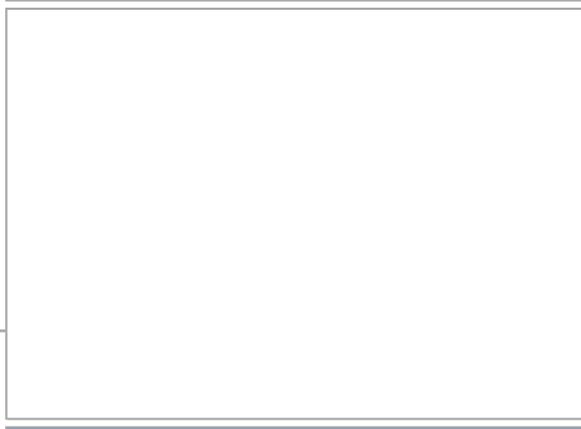

F3: Fachada posterior

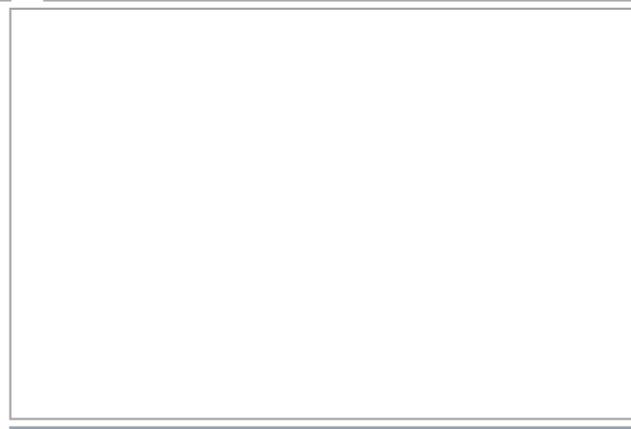

F4: Entrada

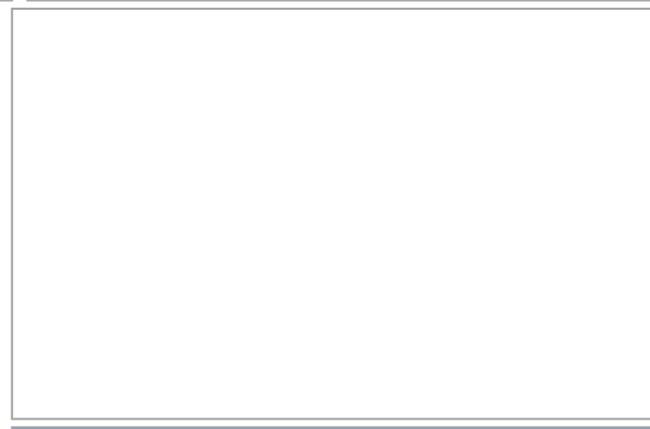

F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Lompa
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **7**

Nombre de la obra: **P-7 Continuación de Remodelación Clínica Escuela en el Centro Universitario del Sur (etapa 3) (CUSUR) FAM 2019**





Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

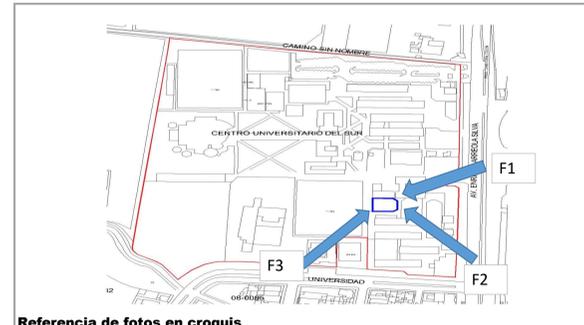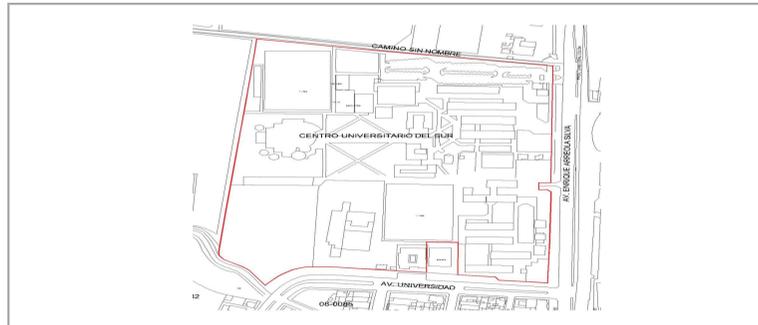


Referencia de fotos en croquis


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Enrique Arreola Silva No. 883, colonia centro
C.P. 49000, Ciudad Guzmán, Jalisco, México.

FOTOS

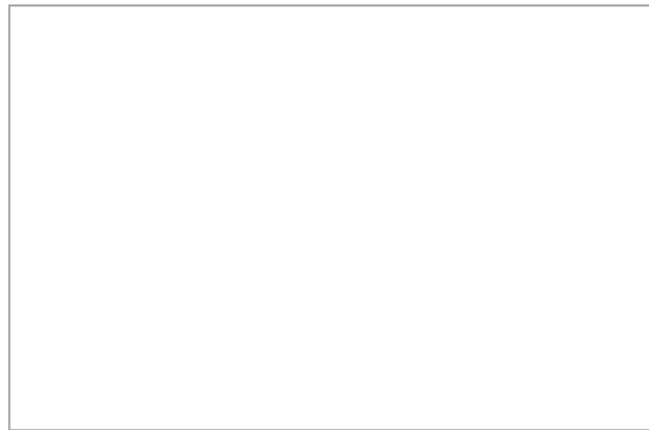


F1: Fachada principal

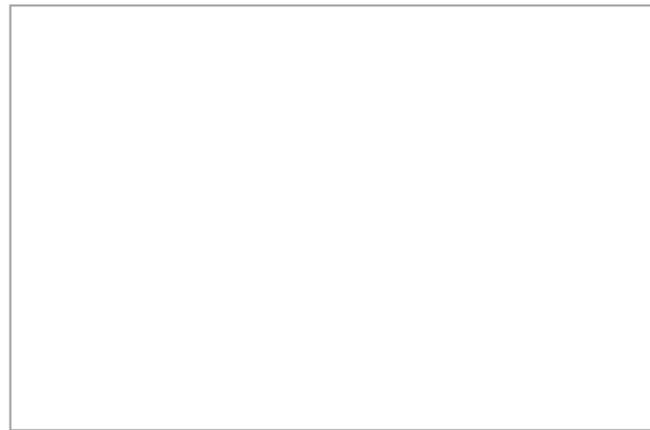


F2: lateral


Comentarios de los trabajos realizados:
Obra no iniciada

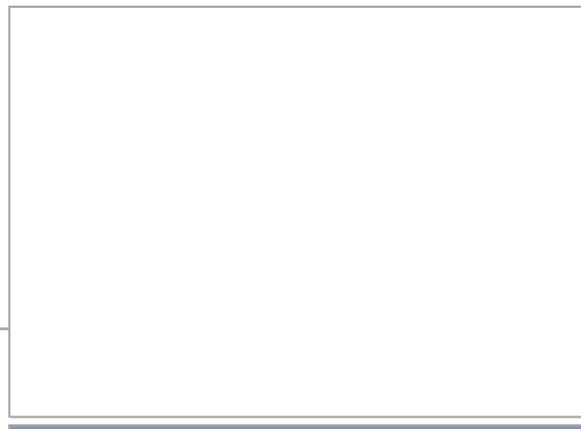

F3: Fachada posterior

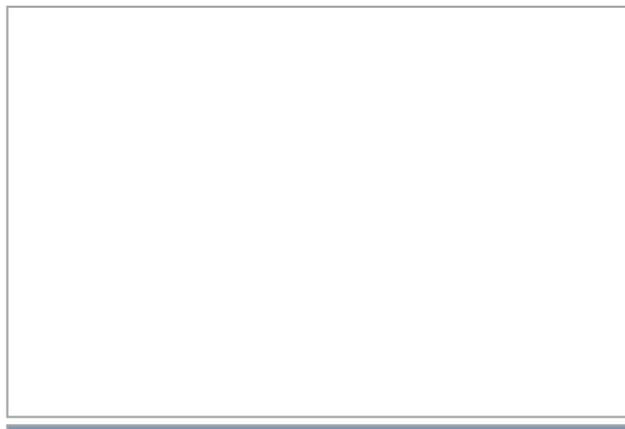

F4: Entrada

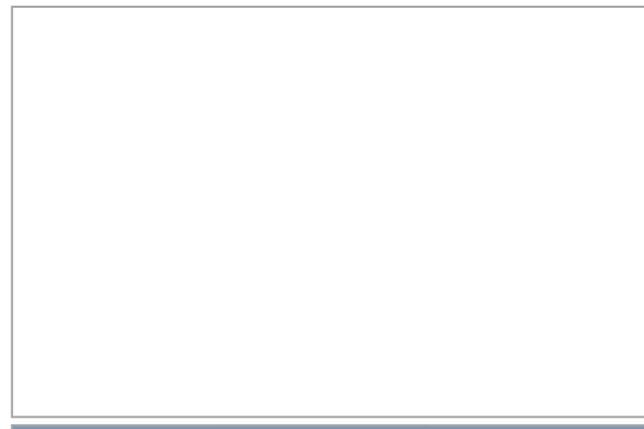

F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Lora
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Inq. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **8**

Nombre de la obra: **P-8 Incorporación de energía solar al centro de formación Integral. (CUCEA) FAM 2019**




Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

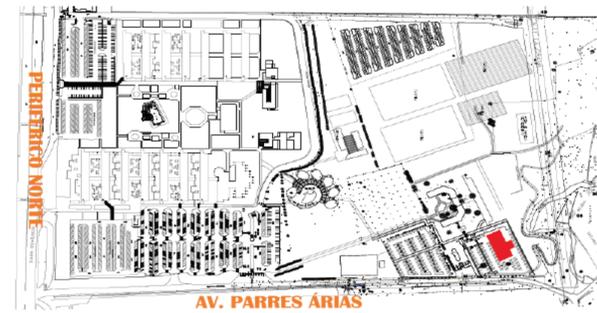


Referencia de fotos en croquis


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Periférico Norte 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.

FOTOS

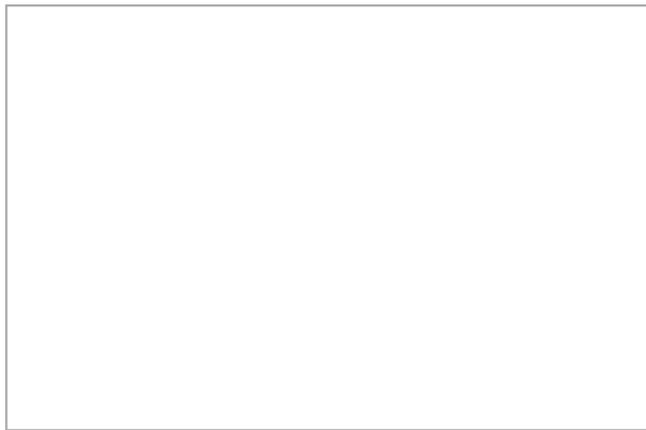


F1: Fachada principal

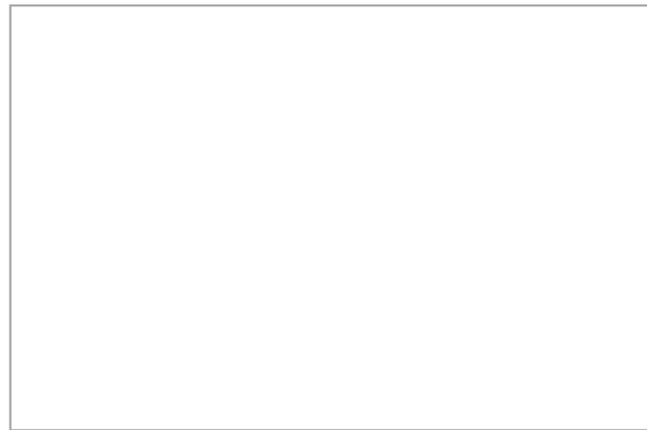


F2: lateral


Comentarios de los trabajos realizados:
Obra no iniciada



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Lomen
Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0


PRIORIDAD

9

Nombre de la obra:

P-9 Tercera etapa de construcción de edificio de 3 niveles destinado a aulas y servicios. (CUCEI) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

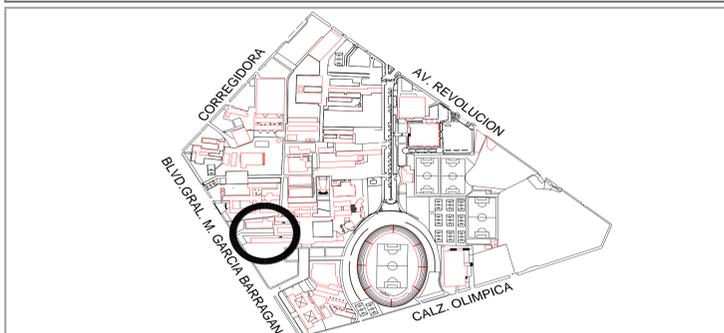

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Boulevard Marcelino Gracia Barragan No. 1421,
Esquina Calzada Olímpica C.P 44430, Guadalajara,
Jalisco.

FOTOS




F1: Fachada principal




F2: lateral


Comentarios de los trabajos realizados:
Obra no iniciada



F3: Fachada posterior

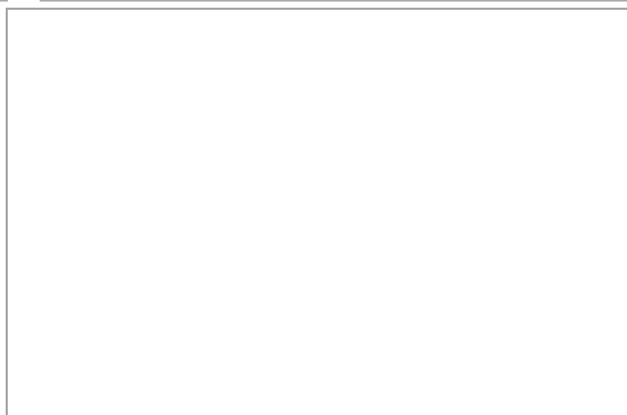

F4: Entrada

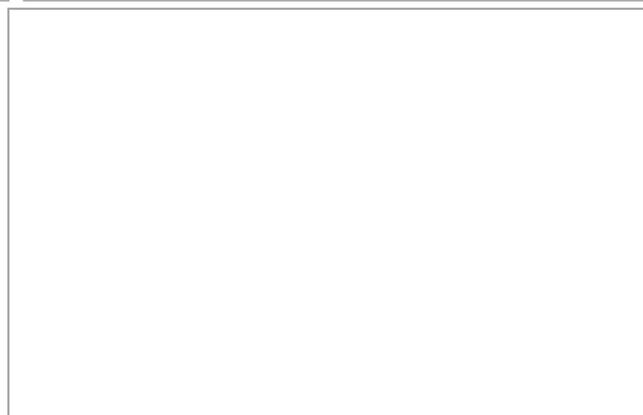

F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Lomeli
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad


Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD **10**

Nombre de la obra: **P-10 Equipamiento multimedia en aulas para clases (CUAAD) FAM 2019**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

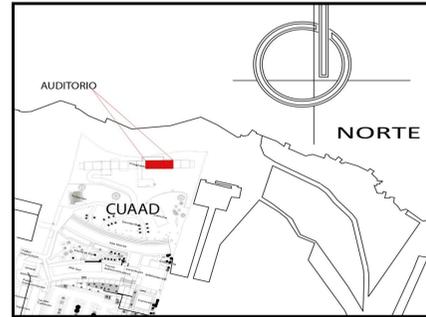


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO


Calzada Independencia Norte no. 5075, Col. Huentitán El Bajo, C.P.44250 Guadalajara, Jal.

Referencia de fotos en croquis

FOTOS




F1: Fachada principal




F2: lateral


Comentarios de los trabajos realizados:
Obra no iniciada



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Lopez
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.
