

2024



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta
3er Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 30/09/2024

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD (6)

Nombre: (5) Universidad de Guadalajara
Entidad federativa: (5) Jalisco
Clave 911: (6) 14MSU010Z
Nombre: Mtra. Paola Lyccette Corona Gutiérrez
Cargo: Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara
Teléfono: 52 (01) 33 31342214 Ext 11202
Correo electrónico: paola.corona@cgpe.udg.mx

RESPONSABLES

Planeación (6)

Obras y Mantenimiento (7)

Nombre: Ing. Esteban Segura Estrada
Cargo: Coordinador de Servicios Generales Universidad de Guadalajara
Teléfono: 52 (01) 33 31342235 Ext 1601 y 1602
Correo electrónico: esteban.segura@udg.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Table with columns for project details, contract execution calendar, and work completion status. Includes rows for 'P.1 Construcción del Museo de Ciencias Ambientales', 'P.2 Reforzamiento y ampliación de los Edificios P-Q', and 'P.3 Construcción de Edificio II de Aulas de Posgrados'.

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Universidad de Guadalajara

Mtra. Paola Lyccette Corona Gutiérrez
Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara

Dr. Ricardo Villanueva Comeli
Rector General de la Universidad de Guadalajara

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

3er Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 30/09/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL




Porcentaje de avance

20%

PRIORIDAD 1 Nombre de la obra: Construcción del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario (Quinta etapa de instalaciones eléctricas, iluminación, voz y datos).


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)




Dirección Postal: Periférico Norte N°. 1695, Colonia Parque Industrial Belenes Norte, C.P. 45150, Zapopan, Jalisco


FOTOS



Estado Actual Nivel Azotea

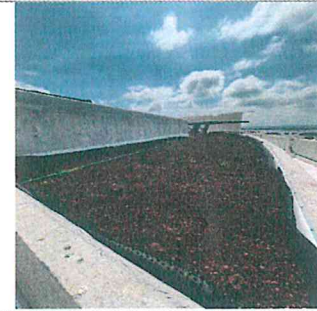

Estado Actual Nivel Azotea

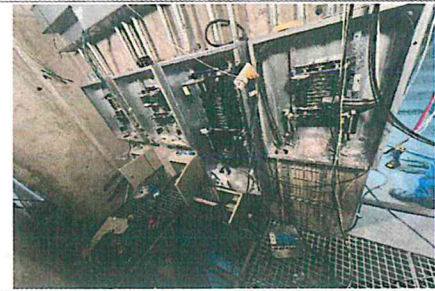

Estado Actual Nivel Galerías



Estado Actual Nivel Galerías



Observaciones :
Actualmente se encuentran realizando salidas eléctricas de contactos, iluminación y fuerza de aire acondicionado.
Canalizaciones para el sistema CCTV, voz y datos
Adecuación de los tableros eléctricos en nivel galerías.
Se adjudicó el proceso de adquisición de los paneles fotovoltaicos para el Museo de Ciencias Ambientales el día 23 de septiembre 2024
Se adjudicó el proceso de adquisición de cableado para voz y datos del Museo de Ciencias Ambientales el día 23 de septiembre 2024
Se encuentra en proceso de adjudicación el concurso que corresponde al suministro del Equipo para CCTV, voz y datos

[Signature]
Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Universidad de Guadalajara

[Signature]
Mtra. Paola Leocadio Cortés Gutiérrez
Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara

[Signature]
Dr. Ricardo Villanueva Lomeli
Rector General de la Universidad de Guadalajara

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES





DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

3er Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 30/09/2024

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 <p>Porcentaje de avance</p> <p>45%</p>	<p>PRIOIDAD 2</p> <p>Nombre de la obra: Reforzamiento y ampliación de los Edificios P-Q que albergarán el Instituto Transdisciplinar de Investigación e Innovación en Salud (16va Etapa) en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. (CUCS)</p>	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)</p>  <p>Dirección Postal: Sierra Mojada 950, Col. Independencia, C.P. 44340, Guadalajara, Jal.</p>
	<p>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)</p> 	<p>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)</p> 

FOTOS

 <p>F1.- Actual: NIVEL 3</p>	 <p>F2.- Actual: NIVEL 3</p>	<p>Observaciones : (11)</p> <p>Anticipo otorgado 24 de junio de 2024, iniciando con trabajos de canceleria y muros de tablaroca</p> <p>Se han realizado avances en trabajos de instalaciones electricas, instalaciones de aire acondicionado</p> <p>instalaciones de Voz y datos, se avanza en trabajos de tablaroca, canceleria y acabados</p>
 <p>F3.- Actual: NIVEL 2</p>	 <p>F4.- Actual: NIVEL 2</p>	

[Signature]

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Universidad de Guadalajara

[Signature]

Mtra. Paola Lyceste Gómez Gutiérrez
Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara

[Signature]

Dr. Ricardo Villanueva Lomell
Rector General de la Universidad de Guadalajara

NOTA:
Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES




DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:


3er Trimestre 2024


Fecha de elaboración: 30/09/2024


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 PRIORIDAD 3 Nombre de la obra: Construcción de Edificio II de Aulas de Posgrados. (CUCEA) Primera etapa.	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8) 	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9) 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)  Dirección Postal: Periférico Norte N° 799 Núcleo Universitario, C. Prol. Belenes, 45100 Zapopan, Jal.
	Porcentaje de avance <h1>60%</h1>		

FOTOS

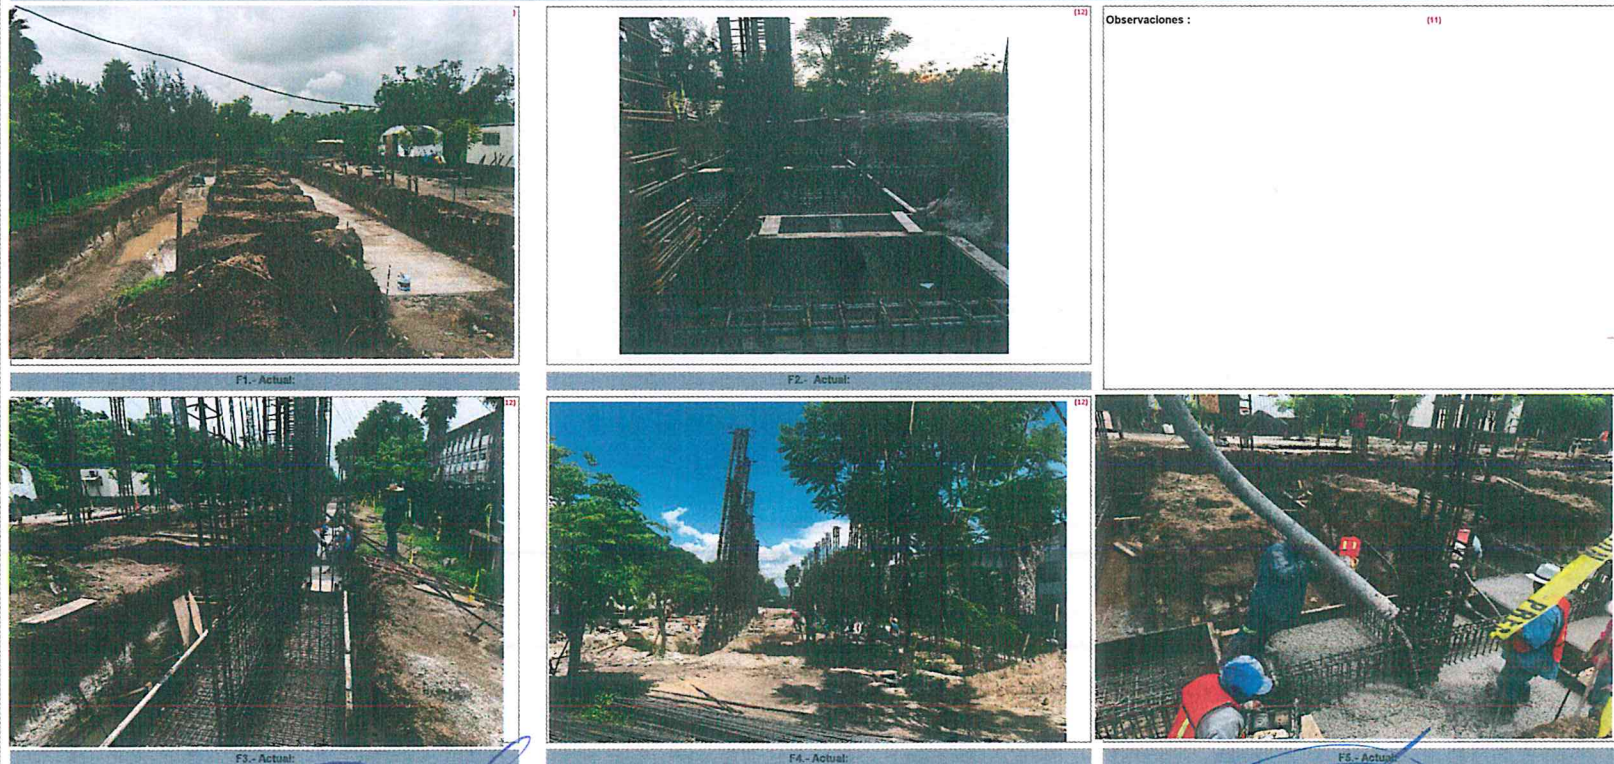

(12)

 Ing. Esteban Segura Estrada
 Coordinador de Servicios Generales de la Universidad de Guadalajara

(12)

 Mtra. Paola Lyocette Corona Gutiérrez
 Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara

(12)

 Dr. Ricardo Villanueva Lomeli
 Rector General de la Universidad de Guadalajara

NOTA:
 * Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
