

2024



EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

1er Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 31/03/2024

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad de Guadalajara

Entidad federativa: Jalisco

Clave 911: 14MSU0010Z

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: Mtra. Paola Lyccette Corona Gutiérrez
Cargo: Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara
Teléfono: 52 (01) 33 31342214 Ext 11202
Correo electrónico: paola.corona@cgpe.udg.mx

Nombre: Ing. Esteban Segura Estrada
Cargo: Coordinador de Servicios Generales Universidad de Guadalajara
Teléfono: 52 (01) 33 31342235 Ext 1801 y 1802
Correo electrónico: esteban.segura@udg.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Table with columns for project details, contract info, physical spaces, and completion status. Includes rows for P.1 Museo de Ciencias Ambientales, P.2 Investigación e Innovación en Salud, and P.3 Construcción de Edificio II de Aulas de Posgrados.

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Universidad de Guadalajara

Mtra. Paola Lyccette Corona Gutiérrez
Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara

Dr. Ricardo Villanueva Lomeli
Rector General de la Universidad de Guadalajara

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta fotos como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM


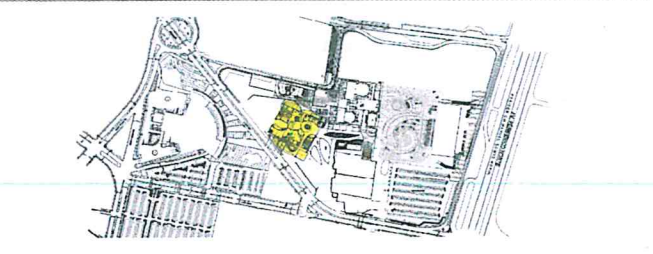
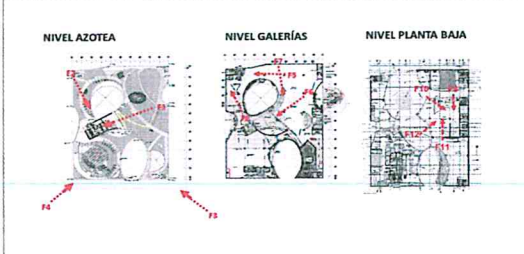

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA









Trimestre y año que se reporta
1er Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 31/03/2024

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 LOGO DE INSTITUCIÓN UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PRIORIDAD 1 Nombre de la obra: Construcción del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario (Quinta etapa de instalaciones eléctricas, iluminación, voz y datos).	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)		CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)			UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)
	Porcentaje de avance 0%						Dirección Postal: Periférico Norte N°. 1695, Colonia Parque Industrial Belenes Norte, C.P. 45150, Zapopan, Jalisco

FOTOS

 Estado Actual Nivel Azotea	 Estado Actual Nivel Azotea	Observaciones :
 Estado Actual Nivel Galerías	 Estado Actual Nivel Galerías	
 Estado Actual Nivel Planta Baja		
 Ing. Esteban Segura Estrada Coordinador de Servicios Generales de la Universidad de Guadalajara	 Mtra. Paola Lyette Corona Guzmán Coordinadora General de Planeación y Búsqueda de la Universidad de Guadalajara	 Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Rector General de la Universidad de Guadalajara

NOTA:
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

1er Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 31/03/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL




Porcentaje de avance

0%


PRORIDAD 2

Nombre de la obra: Reforzamiento y ampliación de los Edificios P-Q que albergarán el Instituto Transdisciplinar de Investigación e Innovación en Salud (16va Etapa) en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS)


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)



Dirección Postal: Sierra Mojada 950, Col. Independencia, C.P. 44340, Guadalajara, Jal.

FOTOS



F1.- Actual: NIVEL 3



F2.- Actual: NIVEL 3

Observaciones: (11)



F3.- Actual: NIVEL 2



F4.- Actual: NIVEL 2



F5.- Actual: NIVEL 2

[Signature]
Mtro. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Universidad de Guadalajara

[Signature]
Mtra. Paola Lyceste Corona Gutiérrez
Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara

[Signature]
Dr. Ricardo Villanueva Lomeli
Rector General de la Universidad de Guadalajara

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

1er Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 31/03/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance


0%

Nombre de la obra: Construcción de Edificio II de Aulas de Posgrados. (CUCEA) Primera etapa.

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)

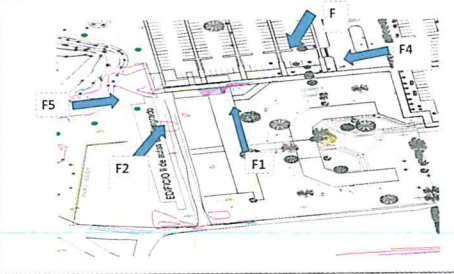

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)



Dirección Postal: Periférico Norte N° 799 Núcleo Universitario, C. Prol. Belenes, 45100 Zapopan, Jal.

FOTOS



F1.- Actual:



F2.- Actual:


Observaciones: (11)



F3.- Actual:



F4.- Actual:

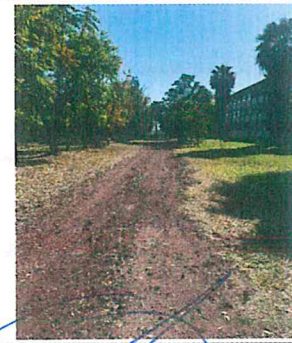

F5.- Actual:

Ing. Esteban Aguirre Estrella
Coordinador de Servicios Generales de la Universidad de Guadalajara

Mtra. Paola Lyccette Corona Gutiérrez
Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara

Dr. Ricardo Villanueva Lomeli
Rector General de la Universidad de Guadalajara

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
