

2025

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta: 4to Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 31/12/2025

REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad de Guadalajara

Entidad federativa: Jalisco

Clave 911: 14MSU0010Z

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: Mtra. Celina Díaz Michel

Cargo: Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara

Teléfono: 52 (01) 33 31342214 Ext 11235

Correo electrónico: celina.diaz@udg.mx

Nombre: Ing. Esteban Segura Estrada

Cargo: Coordinador de Servicios Generales Universidad de Guadalajara

Teléfono: 52 (01) 33 31342235 Ext 11801 y 11802

Correo electrónico: esteban.segura@udg.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

(8) Prioridad	(9) Nombre del proyecto	(10) Tipo de proyecto						(11) Monto Rectificado (A)	(12) CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA				(13) Monto ejercido (D)	(14) REMANENTES		(15) Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado)			(16) Acciones que sustentan el avance	(17) % de avance	(18) Fechas Reales (DD/MM/AA)		(19) Observaciones	(20) Reintegro a la TESOFE			(21) Actas							
		Otra nueva (construcción)	Otra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable		Hospital/Escuela	No. (s) de Contrato (s)	Fechas Programadas			Monto Contratado (B)	Contratista	Monto no Contratado(C) Diferencia entre rectificado y Contratado C=A-B	(E1) Diferencia entre Monto Rectificado y Monto ejercido E1 =A-D	(E2) Diferencia entre Monto contratado y Monto ejercido E2 =B-D			Nombre del Espacio/equipo	Cantidad		Metros Cuadrados (m²)	Inicio	Término	Línea de Captura	Fecha de pago	Importe	Entrega-Recepción (Acta finalizado) MONTO	Fecha	Acta Administrativa de Entrega-Recepción (formato DGESUI) MONTO	Fecha	
											INICIO	TÉRMINO																						
1	Construcción de la segunda etapa de fachada flotada y obras exteriores del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara.		X						VAAD/CC-0796/2025	10/07/2025	08/12/2025	\$ 23,380,502.45	Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V.	\$ 0.04	\$ 22,830,644.54	\$ 1,399,922.48	\$ 549,857.91	Áreas comunes	1.00	1173.00	Colocación de fachada flotada	100.00	10/07/2025	05/12/2025	Los trabajos adjudicados quedaron exclusivamente acotados a la fachada flotada. En la columna Monto Rectificado (A), adicionalmente al monto original autorizado, se agrega el importe de productos financieros por la cantidad de \$700,126.45, autorizados mediante oficio No. 511/2025-3741 de la DGEUI de fecha 10 de noviembre de 2025. En proceso de cierre administrativo.									
									ADENDUM VAAD/CC-1539/2025	07/12/2025	31/12/2025	\$ 850,064.51			\$ -	\$ 850,064.51	TOTAL	1.00	1173.00			07/12/2025	31/12/2025											
2	Reforzamiento de edificio "A" en el Centro Universitario de Chapala (CUCHAPALA) segunda etapa.		X						VAAD/CUCHAPALA-1007/2025	25/10/2025	31/12/2025	\$ 6,319,669.47	Constructora Najisa, S.A. de C.V.	\$ 0.00	\$ 6,319,669.47	\$ -	\$ -	Aulas Laboratorios Áreas comunes Sanitarios Otros	11.00 2.00 2.00 2.00 2.00	737.00 171.00 608.00 150.00 108.00	Reforzamiento en estructura metálica y continuación en refuerzos de cimentación.	100.00	25/10/2025	15/12/2025	Trabajos adjudicados concluidos. En proceso de cierre administrativo.									
									Orden de Trabajo AD-011-CUCHAPALA-2025	12/12/25	16/12/2025	\$ 15,449.08	Abadín, S.A. de C.V.		\$ 15,449.08	\$ -	\$ -	TOTAL	19.00	1774.00	Limpieza, despalme y deshierbe de terreno natural en la obra Reforzamiento en estructura metálica y continuación en refuerzos de cimentación.		12/12/2025	16/12/2025										
3	Construcción de edificio II de aulas de posgrados en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) segunda etapa.		X						CGSAT/UCUEA-0666/2025	15/07/2025	13/12/2025	\$ 15,698,916.31	El Opeño Constructores, S.A. de C.V.	\$ -	\$ 11,983,660.61	\$ 4,306,644.30	\$ 3,715,255.70	Áreas comunes Aulas Oficinas académicas Sanitarios Otros	1.00 33.00 1.00 6.00 8.00	24.00 1750.00 890.00 144.00 112.00	Se tiene la estructura de concreto completa al 100%	100.00	12/07/2025	31/12/2025	Trabajos adjudicados concluidos. En proceso de cierre administrativo.									
									ADENDUM VAAD/UCUEA-1542/2025	15/07/2025	13/12/2025	\$ 591,388.60			\$ -	\$ 591,388.60	TOTAL	49.00	2920.00			12/07/2025	31/12/2025											
															\$0.04	\$41,149,423.70	\$5,706,566.76	\$5,706,566.72		5,867.00														

Coordinador de Servicios Generales de la Universidad de Guadalajara






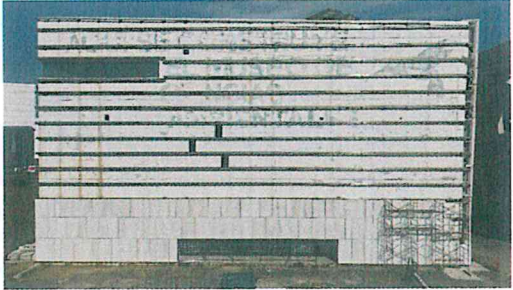


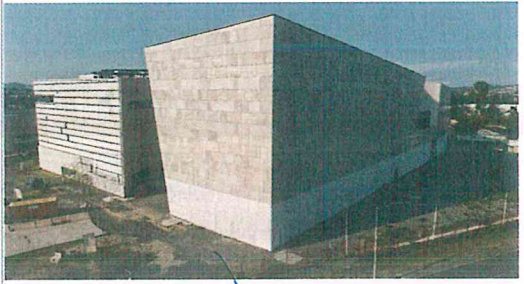



Mtra. Karla Alejandra Planter Pérez


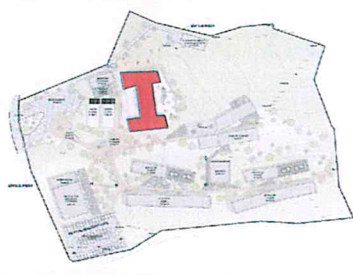





Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara












1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2025 EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO		FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Trimestre y año que se reporta: (2) 4to Trimestre 2025	
Fecha de elaboración: 31/12/2025 (9)							
REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL							
 Porcentaje de avance 100.00%		PRIORIDAD (5) 1 Nombre de la obra: (8) Construcción de la segunda etapa de fachada flotada y obras exteriores del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara.		CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)		UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)	
		GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (6)					
							
						Dirección Postal: Periférico Norte N°. 1695, Colonia Parque Industrial Belenes Norte, C.P. 45150, Zapopan, Jalisco	
FOTOS							
 Estado Actual		 Estado Actual		(11) Observaciones : Los trabajos adjudicados quedaron exclusivamente acotados a la fachada flotada Trabajos adjudicados concluidos. En proceso de finiquito			
 Estado Actual		 Estado Actual		 Estado Actual			
 Ing. Esteban Segura Betradá Coordinador de Servicios Generales de la Universidad de Guadalajara OBRAS Y MANTENIMIENTO		 Mtra. Karla Alejandrina Planter Pérez Rectora General de la Universidad de Guadalajara RECTORÍA		 Mtra. Celina Díaz Michel Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara PLANEACIÓN			
NOTA: * Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.							

<div>2025</div> <div>EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO</div>		<div>FAM</div> <div>FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES</div>		<div>DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL</div> <div>DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</div> <div>SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA</div>		<div>Trimestre y año que se reporta</div> <div>4to Trimestre 2025</div>			
				<div>Fecha de elaboración: 31/12/2025</div>					
<div>REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL</div>									
<div><div><div>LOGO DE INSTITUCIÓN</div><div>UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA</div></div><div>Porcentaje de avance</div><div>100.00%</div></div>		<div>PRIORIDAD (5) 2</div> <div>Nombre de la obra: (6) 'Reforzamiento de edificio "A" en el Centro Universitario de Chapala (CUCHAPALA) segunda etapa.</div>		<div>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)</div> <div></div>		<div>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)</div> <div></div>		<div>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)</div> <div><div>Dirección Postal: Predio rustico el Cuije, del Ejido de Chapala, municipio de Chapala, Jalisco, C.P. 45905</div></div>	
<div>FOTOS</div>									
<div><div>1</div></div> <div>Estado Actual</div>		<div><div>2</div></div> <div>Estado Actual</div>		<div>Observaciones : (11)</div> <div>Trabajos adjudicados concluidos</div>					
<div><div>3</div></div> <div>Estado Actual</div>		<div><div>4</div></div> <div>Estado Actual</div>		<div></div>		<div></div>			
<div><div>Ing. Esteban Segura Estrada</div><div>Coordinador de Servicios Generales de la Universidad de Guadalajara</div><div>OBRAS Y MANTENIMIENTO</div></div>		<div><div>Mtra. Karla Alejandrina Planter Pérez</div><div>Rectora General de la Universidad de Guadalajara</div><div>RECTORÍA</div></div>		<div><div>Mtra. Celia Díaz Michel</div><div>Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara</div><div>PLANEACIÓN</div></div>					
<div>NOTA</div> <div>* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.</div>									

2025 EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO		FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Trimestre y año que se reporta: (2) 4to Trimestre 2025	
Fecha de elaboración: 31/12/2025 (3)							
REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL							
 Porcentaje de avance 100.00%		PRIORIDAD (5) 5 Nombre de la obra: (6) Construcción de edificio II de aulas de posgrados en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) segunda etapa.		CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)		UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)	
		GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)					
							
				Ubicación en el conjunto		Dirección Postal: Periférico Norte 799 Los belenes, Zapopan Jalisco, México.	
FOTOS							
				Observaciones: (11) Trabajos adjudicados concluidos.			
Foto 1		Foto 2					
							
Foto 3		Foto 4		Foto 5			
 Ing. Eusebio Segura Estrada Coordinador de Servicios Generales de la Universidad de Guadalajara OBRAS Y MANTENIMIENTO		 Mtra. Karla Alejandrina Planter Pérez Rectora General de la Universidad de Guadalajara RECTORÍA		 Mtra. Celina Diaz Michel Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara PLANEACIÓN			
NOTA: * Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.							
