

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta (2)
2do Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 30/08/2025

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD (5)



Nombre: Universidad de Guadalajara
Entidad federativa: Jalisco
Clave 911: 14MSU0010Z

Nombre: Mtra. Celina Díaz Michel
Cargo: Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara
Teléfono: 52 (01) 33 31342214 Ext 11235
Correo electrónico: celina.diaz@udg.mx

Planeación (6)

Nombre: Ing. Esteban Segura Estrada
Cargo: Coordinador de Servicios Generales Universidad de Guadalajara
Teléfono: 52 (01) 33 31342235 Ext 11801 y 11802
Correo electrónico: esteban.segura@udg.mx

Obras y Mantenimiento (7)

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Table with columns for Priority, Project Name, Type of Project, Contract and Calendar, Remnants, Physical Spaces/Equipment, Actions, Dates, Observations, and Reimbursement/Actas. Includes rows for 'Construcción de la segunda etapa de fachada flotada...', 'Reforzamiento de edificio "A" en el Centro Universitario de Chapala...', and 'Construcción de edificio II de aulas de posgrados...'

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Universidad de Guadalajara
OBRAS Y MANTENIMIENTO

Mtra. Karla Alejandrina Planter Pérez
Rectora General de la Universidad de Guadalajara
RECTORÍA

Mtra. Celina Díaz Michel
Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara
PLANEACIÓN

1. Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
7. En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotográfico.
3. Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGO EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

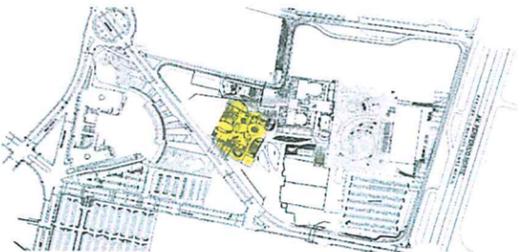
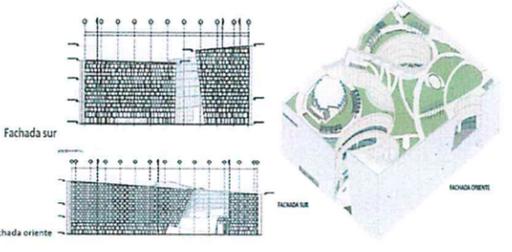

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta: (2)

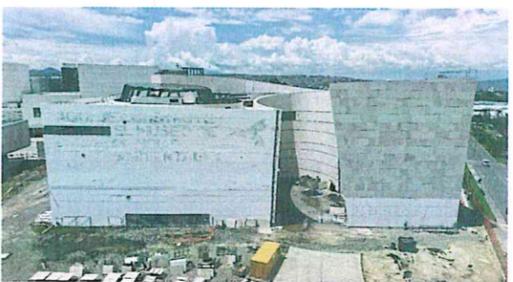


2do. Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 30/06/2025 (3)

REPORTÉ FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 Porcentaje de avance  <h1>0.00%</h1>	PRIORIDAD (5) 1 Nombre de la obra: (6) *Construcción de la segunda etapa de fachada flotada y obras exteriores del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara.	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)
				Dirección Postal: Periférico Norte N°. 1695, Colonia Parque Industrial Belenes Norte, C.P. 45150, Zapopan, Jalisco

FOTOS

 Estado Actual	 Estado Actual	Observaciones: (11) Obra adjudicada el 19 de junio, en espera de la entrega del anticipo. Los trabajos adjudicados quedaron exclusivamente acotados a la fachada flotada.
 Estado Actual	 Estado Actual	
 Ing. Esteban Segura Estrada Coordinador de Servicios Generales de la Universidad de Guadalajara OBRAS Y MANTENIMIENTO	 Mtra. Karla Alejandrina Planter Pérez Rectora General de la Universidad de Guadalajara RECTORÍA	 Mtra. Celina Díaz Michel Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara PLANEACIÓN

NOTA:

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

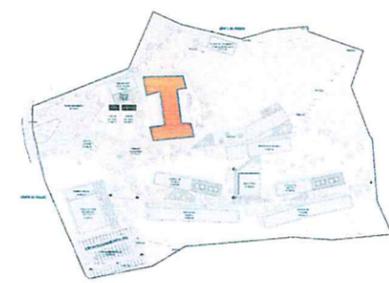
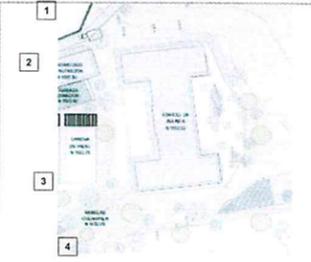
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta: (7)

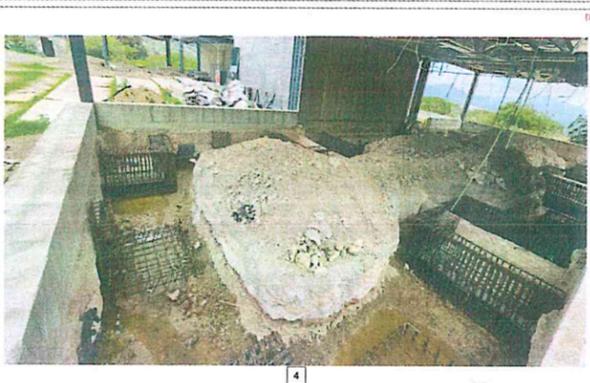
2do. Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025 (8)

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 Porcentaje de avance <p style="font-size: 24px; color: orange;">0.00%</p>	PRIORIDAD (5) 2 Nombre de la obra: (6) <b>Reforzamiento de edificio "A" en el Centro Universitario de Chapala (CUCHAPALA) segunda etapa.</b>	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8) 	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9) 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)  Dirección Postal: Predio rustico el Cuije, del Ejido de Chapala, municipio de Chapala, Jalisco. C.P. 45905
---	---	---	---	---

FOTOS

 Estado Actual	 Estado Actual	Observaciones : (11) Estado actual en donde se ejecutará la obra.
 Estado Actual	 Estado Actual	
 Sr. Esteban Sierra Estrada Coordinador de Servicios Generales de la Universidad de Guadalajara OBRAS Y MANTENIMIENTO	 Mtra. Karla Alejandrina Planter Pérez Rectora General de la Universidad de Guadalajara RECTORÍA	 Mtra. Celina Díaz Michel Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara PLANEACIÓN

NOTA.

Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta: (2)


2do. Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 30/06/2025 (3)

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

PRORIDAD (5) Nombre de la obra: (6) \*Construcción de edificio II de aulas de posgrados en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) segunda etapa.

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)
	 Ubicación en el conjunto	 Dirección Postal: Periférico Norte 799 Los belenes, Zapopan Jalisco, México.

Porcentaje de avance

0.00%

FOTOS

 Foto 1	 Foto 2	Observaciones : (11) Estado actual en donde se ejecutará la obra.
 Foto 3	 Foto 4	 Foto 5
 Ing. Esteban Segura Estrada Coordinador de Servicios Generales de la Universidad de Guadalajara OBRAS Y MANTENIMIENTO	 Mtra. Karla Alejandrina Planter Pérez Rectora General de la Universidad de Guadalajara RECTORÍA	 Mtra. Celina Díaz Michel Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara PLANEACIÓN

NOTA:

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
