

2026

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta: (2)

1er Trimestre 2026

Fecha de elaboración: 31/03/2025 (3)

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD (5)



Nombre: Universidad de Guadalajara

Entidad Federativa: Jalisco

Clave 911: 14MSU0010Z

Planeación (6)

Titulares de Área

Obras y Mantenimiento (7)

Nombre: Mtra. Celina Díaz Michel
Cargo: Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara
Teléfono: 52 (01) 33 31342214 Ext 11235
Correo electrónico: celina.diaz@udg.mx

Nombre: Ing. Esteban Segura Estrada
Cargo: Coordinador de Servicios Generales Universidad de Guadalajara
Teléfono: 52 (01) 33 31342235 Ext 11801 y 11802
Correo electrónico: esteban.segura@udg.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Table with columns for Priority, Project Name, Type of Project, Contract and Execution Calendar, Remnants, Physical Spaces/Equipment, Advances, Real Dates, Observations, and Actas. Includes rows for construction projects in Tlajomulco and Tlaquepaque.

Handwritten signature of Ing. Esteban Segura Estrada, Coordinador de Servicios Generales de la Universidad de Guadalajara, OBRAS Y MANTENIMIENTO.

Handwritten signature of Mtra. Karla Alejandra Planter-Pérez, Rectora General de la Universidad de Guadalajara, RECTORÍA.

Handwritten signature of Mtra. Celina Díaz Michel, Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara, PLANEACIÓN.

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta fotos como sea necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos, dd, mm y aa.

2026

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta: (2)

1er Trimestre 2026

Fecha de elaboración: 31/10/2026 (3)

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

0.00%

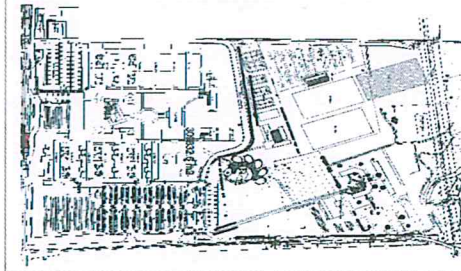
PRIORIDAD (5) *

Nombre de la obra: (6) * Construcción de edificio II de aulas de posgrados en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) tercera etapa.

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)



Dirección Postal: Periférico Norte Manuel Gómez Morín No. 799 Núcleo Universitario Los Belenes C.P. 45100, Zepopan, Jalisco, México

FOTOS



Estado Actual (12)



Estado Actual (13)

Observaciones: (14)



Estado Actual (15)



Estado Actual (16)



(17)

Ing. Esteban Segura Espada
Coordinador de Servicios Generales de la Universidad de Guadalajara
OBRAS Y MANTENIMIENTO

Mtra. Karla Alejandrina Planter Pérez
Rectora General de la Universidad de Guadalajara
RECTORÍA

Mtra. Celsia Diaz Michel
Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara
PLANEACIÓN

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2026

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta (2)

1er Trimestre 2026

Fecha de elaboración: 31/03/2026 (4)

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

0.00%

PRORIDAD (5) 2

Nombre de la obra: (6) 'Construcción del Centro de Atención Médica Integral (CAMI) del Centro Universitario de los Altos, tercera etapa.

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)



Dirección Postal: Av. González Gallo No. exterior 205, entre las calles M. Jiménez y F. Ramos, Colonia Centro, CP 47600, Tepatitlán de Morelos Jalisco

FOTOS



Estado Actual



Estado Actual

Observaciones: (11)



Estado Actual



Estado Actual



Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Universidad de Guadalajara
OBRAS Y MANTENIMIENTO

Mtra. Karla Alejandrina Planter Pérez
Rectora General de la Universidad de Guadalajara
RECTORÍA

Mtra. Celina Díaz Michel
Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara
PLANEACIÓN

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2026

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta (2)

1er Trimestre 2026

Fecha de elaboración: 31/03/2026 (1)

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

0.00%

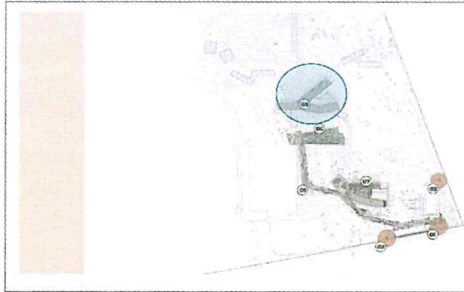
PRIORIDAD (5) 3

Nombre de la obra: (6) 'Construcción de la primera etapa del edificio de aulas "B" en el Centro Universitario de Tlaquepaque.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)



Dirección Postal: Leocares 323, Colonia Cerro del Cuatro, C.P. 45599, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

FOTOS



Estado Actual



Estado Actual

Observaciones: (11)

- Foto 1 Vista hacia el edificio administrativo-gobierno
- Foto 2 Vista hacia el norte del terreno
- Foto 3 Vista hacia el Ote. Del terreno
- Foto 4 Vista de ingreso al terreno
- Foto 5 Vista al Nor-Ote



Estado Actual



Estado Actual



Estado Actual



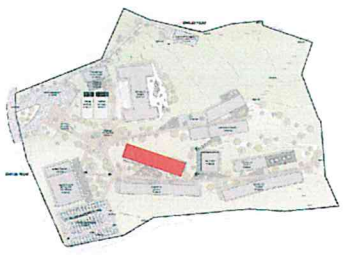







Mra. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Universidad de Guadalajara
OBRAS Y MANTENIMIENTO

Mtra. Karla Alejandrina Planter Pérez
Rectora General de la Universidad de Guadalajara
RECTORÍA

Mtra. Celina Díaz Michel
Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara
PLANEACIÓN

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2026 <small>EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO</small>	FAM <small>FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES</small>	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL <small>DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA</small>	<small>Trimestre y año que se reporta</small> 1er Trimestre 2026
<small>REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL</small>			
 <small>Porcentaje de avance</small> 0.00%	<small>PRIORIDAD (9) 4</small> <small>Nombre de la obra: (8) "Construcción de la primera etapa del edificio de aulas y laboratorios módulo "B" en el Centro Universitario de Chapala.</small>	<small>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)</small> 	<small>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)</small> 
		<small>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)</small>  <small>Dirección Postal: Predio rustico el Cuije, del Ejido de Chapala, municipio de Chapala, Jalisco. C.P. 45905</small>	
FOTOS			
 <small>1</small>	 <small>2</small>	<small>Observaciones: (11)</small> Imágenes donde se construirá el Edificio	
<small>Estado Actual</small>	<small>Estado Actual</small>		
 <small>3</small>			
<small>Estado Actual</small>	<small>Estado Actual</small>		
 <small>Ing. Esteban Segura Estrada Coordinador de Servicios Generales de la Universidad de Guadalajara OBRAS Y MANTENIMIENTO</small>	 <small>Mtra. Karla Alejandrina Planter Pérez Rectora General de la Universidad de Guadalajara RECTORÍA</small>	 <small>Mtra. Celina Díaz Michel Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara PLANEACIÓN</small>	
<small>NOTA:</small> * Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.			

2026

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA








Trimestre y año que se reporta: **1er Trimestre 2026**

Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 Porcentaje de avance 0.00%	PRIORIDAD (9) 5 Nombre de la obra: (8) "Construcción de la primera etapa del edificio de laboratorios módulo "B" en el Centro Universitario de Tlajomulco.	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)
				Dirección Postal: Carretera a Tlajomulco, Santa Fé, km 3.5, No. 595, Lomas de Tejeda. C.p. 45641

FOTOS

 Foto 1	 Foto 2	Observaciones : (11) Foto 1 Área rústica de la ubicación del Módulo "A" de laboratorios Foto 2 Foto aérea del espacio donde se desplantará el edificio del laboratorio Foto 3 Posición desde acceso principal del espacio donde se desplantará el edificio del laboratorio Foto 4 Posición desde dentro de la infraestructura existente del CUTLAJO
 Foto 3	 Foto 4	
 Ing. Esteban Segura Estrada Coordinador de Servicios Generales de la Universidad de Guadalajara OBRAS Y MANTENIMIENTO	 Mtra. Mada Alejandrina Platter Pérez Rectora General de la Universidad de Guadalajara RECTORÍA	 Mtra. Celina Diaz Michel Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara PLANEACIÓN

NOTA:
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra
