

2026

FAM

2026

2do Trimestre 2026

Reporte Descriptivo del Informe de Avance Trimestral

Logo of Universidad de Guadalajara

Nombre: Universidad de Guadalajara

Entidad federativa: Jalisco

Clave D11: 14MSU0010Z

Nombre: Mira, Celina Díaz Michel

Cargo: Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara

Teléfono: 52 (01) 33 31342214 Ext 11235

Correo electrónico: celina.diaz@udg.mx

Nombre: Ing. Esteban Segura Estrada

Cargo: Coordinador de Servicios Generales Universidad de Guadalajara

Teléfono: 52 (01) 33 31342235 Ext 11801 y 11802

Correo electrónico: esteban.segura@udg.mx

(10) Tipo de proyecto

Otra nueva construcción

Obra en construcción

Reparaciones

Reconstrucción y mejoras

Manutención

Proyecto suspendido

Rehabilitación

(11) Monto Rectificado (A)

18,981,516.00

(12) CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

No. (s) de Contrato (s)

1/04/2024

12/12/2024

18,987,205.83

Unidad Ejecutora y Construcción S.A. de C.V.

324,310.17

5,597,161.74

13,384,354.26

13,000,044.09

(13) Monto ejercido (D)

5,597,161.74

(14) REMANENTES

(E1) Diferencia entre Monto Rectificado y Monto ejercido E1 = A-D

7,387,352.46

(E2) Diferencia entre Monto contratado y Monto ejercido E2 = B-D

13,000,044.09

(15) Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado)

Nombre del Espacio/equipamiento

Cantidad

Metros Cuadrados (m²)

Aulas

33.00

1790.00

Oficinas administrativas

1.00

24.00

Áreas comunes

1.00

890.00

Sanitarios

0.00

144.00

Chapas

8.00

112.00

TOTAL

44.00

2960.00

Cubículos

59.00

617.00

Laboratorios

31.00

617.00

Oficinas

18.00

222.00

Áreas comunes

24.00

1093.00

Sanitarios

11.00

221.00

Chapas

4.00

146.00

TOTAL

188.00

3419.00

Aulas

0.00

0.00

Laboratorios

0.00

0.00

Teleros

0.00

0.00

Áreas comunes

0.00

0.00

Sanitarios

0.00

0.00

Chapas

1.00

1490.00

TOTAL

1.00

1490.00

Aulas

0.00

0.00

Laboratorios

0.00

0.00

Teleros

0.00

0.00

Áreas comunes

0.00

0.00

Sanitarios

0.00

0.00

Chapas

1.00

1430.00

TOTAL

0.00

0.00

Aulas

0.00

0.00

Laboratorios

0.00

0.00

Teleros

0.00

0.00

Áreas comunes

2.00

411.00

Sanitarios

2.00

154.00

Chapas

0.00

0.00

TOTAL

19.00

1636.00

(16) Acciones que sustentan el avance

100

23/06/2024

Obra en proceso

(17) % de avance

100

(18) Fechas Reales (DD/MM/AA)

Inicio

23/06/2024

Término

23/06/2024

(19) Observaciones

Actualización de datos de desplante, muros de block, solado, rellenos, cadenas y preparación para instalaciones.

(20) Reintegro a la TESOFE

Línea de Captura

Fecha de pago

Importe

(21) Actas

Entrega-Recepción (Acta finalizado MONTO)

Fecha

Acta Administrativa de Entrega-Recepción (formato DGE/SH) MONTO

Fecha

Ing. Esteban Segura Estrada

Coordinador de Servicios Generales de la Universidad de Guadalajara

OBRA Y MANTENIMIENTO

Mira, Karla Alejandra Planter Pérez

Rectora General de la Universidad de Guadalajara

RECTORÍA

Mira, Celina Díaz Michel


Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara


PLANEACIÓN

1. Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se pueden anexar tantas fotos como sea necesario.


2. En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3. Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos, día, mes y año.

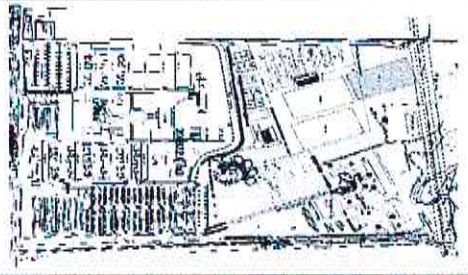2026 EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO		FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Trimestre y año que se reporta (1) 2do Trimestre 2026	
Fecha de elaboración 30/06/2026 (2)							
REPORTES FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL							
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		PRIMICIA (3) 1		Nombre de la obra (4) Construcción de edificio II de aulas de pasados en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) tercera etapa.			
Porcentaje de avance		GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (5)		CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (6)		UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)	
3.00%							
						Dirección Postal: Periférico Norte Manuel Gómez Morán No. 799 Núcleo Universitario Los Belenes C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, México	
FOTOS							
				Observaciones: (11)			
Estado Actual		Estado Actual					
							
Estado Actual		Estado Actual					
							
		Mg. Esteban Segura Estrada Coordinador de Servicios Generales de la Universidad de Guadalajara OBRAS Y MANTENIMIENTO		Mtra. Karla Alejandra Planter Pérez Rectora General de la Universidad de Guadalajara RECTORÍA		Mtra. Celina Díaz Michel Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara PLANEACIÓN	
NOTA: * Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.							

2026 EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Trimestre y año que se reporta 2do Trimestre 2026 Fecha de elaboración 30/06/2026								
REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL											
 Porcentaje de avance 10.00%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center; vertical-align: top;"> PRIORIDAD (1) 2 Nombre de la obra: (2) "Construcción del Centro de Atención Médica Integral (CAMI) del Centro Universitario de los Altos, tercera etapa." </td> <td style="width: 35%; text-align: center; vertical-align: top;"> GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (6)  </td> <td style="width: 30%; text-align: center; vertical-align: top;"> CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)  </td> <td style="width: 5%; text-align: center; vertical-align: top;"> UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)  </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right; font-size: 0.8em;"> Dirección Postal: Av. González Gallo No. exterior 205, entre las calles M. Jiménez y F. Ramos, Colonia Centro, CP 47600, Tepatlán de Morelos Jalisco. </td> </tr> </table>			PRIORIDAD (1) 2 Nombre de la obra: (2) "Construcción del Centro de Atención Médica Integral (CAMI) del Centro Universitario de los Altos, tercera etapa."	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (6) 	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9) 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10) 	Dirección Postal: Av. González Gallo No. exterior 205, entre las calles M. Jiménez y F. Ramos, Colonia Centro, CP 47600, Tepatlán de Morelos Jalisco.			
PRIORIDAD (1) 2 Nombre de la obra: (2) "Construcción del Centro de Atención Médica Integral (CAMI) del Centro Universitario de los Altos, tercera etapa."	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (6) 	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9) 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10) 								
Dirección Postal: Av. González Gallo No. exterior 205, entre las calles M. Jiménez y F. Ramos, Colonia Centro, CP 47600, Tepatlán de Morelos Jalisco.											
FOTOS											
 Estado Actual		 Estado Actual									
 Estado Actual		 Estado Actual									
 Estado Actual		 Estado Actual									
Ing. Esteban Segura Estrada Coordinador de Servicios Generales de la Universidad de Guadalajara OBRAS Y MANTENIMIENTO		Mrs. Karla Alejandra Páez Pérez Rectora General de la Universidad de Guadalajara RECTORÍA									
Mrs. Celina Díaz Michel Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara PLANEACIÓN											
NOTA: * Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestañita, se podrán copiar tantas pestañitas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.											

a de la primera etapa del edificio de aulas "B" en el Centro Universitario de Tla



(5) 3

(10) *Ph*

(10) *Ph*

(B)

**PROYECTO (9)****FOTOS REFERENCIADAS (10)**

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.

Source: <http://www.fishbase.org>



... ..



... ..

100

Planta de conjunto

Foto 1 vista de la f

Foto 3 Escavaciones Con


Foto 4 Plataformado de

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 2689-2695.



100

may impact

Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2026 EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO		FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Trimestre y año que se reporta 2do Trimestre 2026			
REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL									
Porcentaje de avance 10.00%		PRORIDAD (8) 4 Nombre de la obra (9) Construcción de la primera etapa del edificio de aulas y laboratorios módulo "B" en el Centro Universitario de Chapala.		GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)		CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)		UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10) Dirección Postal: Predio rustico el Cuije, del Ejido de Chapala, municipio de Chapala, Jalisco. C.P. 45905	
FOTOS									
1 Estado Actual		2 Estado Actual		Observaciones : (11) Imágenes donde se construirá el Edificio					
3 Estado Actual		4 Estado Actual		(12)					
Ing. Esteban Segura Estrada Coordinador de Servicios Generales de la Universidad de Guadalajara OBRA Y MANTENIMIENTO		Mtra. Karla Alejandra Planter Pérez Rectora General de la Universidad de Guadalajara REGIONAL		Mtra. Celina Díaz Michel Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara PLANEACIÓN					
NOTA * Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestañita, se podrán copiar tantas pestañitas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.									

2026		FAM		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL		Trimestre y año que se reporta (7)	
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO		FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		2do Trimestre 2026	
				SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Fecha de elaboración: 30/06/2026 (8)	
REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL							
 Porcentaje de avance		Nombre de la obra: (4) Construcción de la primera etapa del edificio de laboratorios módulo "B" en el Centro Universitario de Tlaxiaco.		UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)			
		GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (6)		CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)			
12.00%						 Dirección Postal: Carretera a Tlaxiaco, Santa Fe, km 3.5, No. 595, Lomas de Tejeda, C.p. 45641	
FOTOS							
						Observaciones: (11) Georeferencia: Área rústica de la ubicación del Módulo "A" de laboratorios Ubicación P. Conjunto en donde se desplantará el edificio del laboratorio Imagen referenciada Posición desde acceso principal del espacio donde se desplantará el edificio del laboratorio Foto 1 Trazo y nivelación Foto 2 Excavación de Cimentaciones Foto 3 Implementación de acero en elementos estructurales (zapatas, pilas, columnas) Foto 4 Contralabes Zapatas, Dados (Concreto) Foto 5 Contralabes Zapatas, Dados (Impermeabilizado)	
							
 Ing. Esteban Segura Estrada Coordinador de Servicios Generales de la Universidad de Querétaro OBRAS Y MANTENIMIENTO		 Mtra. Karla Alejandra Planter Pérez Rectora General de la Universidad de Querétaro RECTORÍA		 Mtra. Celina Díaz Michel Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Querétaro PLANEACIÓN			
NOTA: * Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.							
