

2018

AÑO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Noviembre

FECHA DE CORTE: 25/11/18

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad de Guadalajara**

Entidad federativa: Jalisco

Clave Inst 911: 14MSU0010Z


 Nombre: Mtro. Rubén Juan Sebastián García Sánchez
 Cargo: Coordinador General de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara
 Teléfono: 52 (01) 33 31342214 Ext 11202
 Correo electrónico: ruben.garcia.sanchez@copladi.udg.mx

 Nombre: Ing. Esteban Segura Estrada
 Cargo: Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
 Teléfono: 52 (01) 33 31342235 Ext 1801 y 1802
 Correo electrónico: esegura@redudg.udg.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO
OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/ Equipo	Cantidad	Metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Conclusión de módulo A (4 aulas y pasillo de intercomunicación) en la planta alta del Centro Universitario de la Ciénega, sede Atotonilco (CUCIENEGA) FAM 2019 P-2	X					\$ 4,000,000.00	\$ 863,033.65	\$ 3,136,966.35	Aulas/Salones 4 256.00 Áreas comunes 1 32.00		Demoliciones, preparación de nodos y habilitado de estructura	Habilitado y montaje de estructura, colado de losa, albañilerías e instalación eléctrica	40	24/09/18	08/12/18	En proceso de revisión, validación y posterior pago de estimaciones 1 y 2.							
TOTAL										5	288.00													
2	Instalación de luminarias led, fotoceldas y paneles solares en las instalaciones del Sistema de Universidad Virtual. (SUV) FAM 2018 P-36		X				\$ 1,211,625.00	\$ -	\$ 1,211,625.00	Paneles solares y estructura 70 0.00 Lámparas led de 30 watts 12 0.00 Inversor central de interconexión 6 0.00 Instalación y mano de obra de paneles 70 0.00 Instalación y mano de obra de lámparas led 30w 12 0.00 Instalación Inversor central de interconexión 6 0.00		Se realizó la firma de contrato.	Proceso de pago de anticipo.	0	23/10/18	31/12/18								
TOTAL										176.00	0.00													
3	Edificio de Investigación (Vinculación y Transferencia del Conocimiento) (CUCEA) FAM 2019 P-11	X					\$ 4,000,000.00	\$ 915,556.44	\$ 3,084,443.56	Cubículos 60 1269.44 Sanitarios 4 117.00 Áreas comunes 2 544.11		Los trabajos realizados incluyen limpieza, deshierbe, retiro de escombros, instalación de tapal de obra y pretil de azotea.	Los trabajos en proceso incluyen, la construcción de muros de enlace, muros de fachada (durok), entorato e impermeabilización en azotea.	3	25/10/10/18	15/01/19								
TOTAL										66.00	1930.55													
4	CULAGOS Sustentable (CULAGOS) FAM 2019 P-14		X				\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00	Sistema de captación solar 2 0.00 Captación pluvial 1 0.00		Se realizó la firma de contrato.	Proceso de pago de anticipo.	0	23/10/18	31/12/18	Los trabajos a realizar son: suministro y colocación de módulos fotovoltaicos, retiro de luminarias existentes y suministro y colocación de luminarias con tecnología LED y luminarias para alumbrado público solar, para el Centro Universitario de los Lagos.							
TOTAL										3.00	0.00													

2018

AÑO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Noviembre
 FECHA DE CORTE: 25/11/18

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad de Guadalajara**

Entidad federativa: Jalisco

Clave Inst 911: 14MSU010Z


 Nombre: Mtro. Rubén Juan Sebastián García Sánchez
 Cargo: Coordinador General de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara
 Teléfono: 52 (01) 33 31342214 Ext 11202
 Correo electrónico: ruben.garcia.sanchez@copladi.udg.mx

RESPONSABLES

 Nombre: Ing. Esteban Segura Estrada
 Cargo: Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
 Teléfono: 52 (01) 33 31342235 Ext 1801 y 1802
 Correo electrónico: esegura@redudg.udg.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO
OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada			Cuenta con Actas	
		Diseño de construcción	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/ Equipo	Cantidad	Metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
9	Continuación de Construcción Sede Tomatán del Centro Universitario de la Costa, Edificio C. (CUCOSTA) FAM 2016 P-7 (ajuste de monto)	X					\$ 4,500,000.00	\$ 1,465,107.05	\$ 3,034,892.95	Aulas/salones 2 748.24 Sanitarios 2 68.47 Áreas comunes 5 614.37 Otros 2 24.14 TOTAL 21.00 1455.22	Se trabaja en colocación de pisos cerámicos, construcción de escalera, aplanados, registros, colocación de hormigón en azotea, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.	Continuación de trabajos en acabados, instalaciones y azotea.	50	03/10/18	26/12/18									
10	Construcción de edificio bioclimático de laboratorios para el Departamento de Ciencias de la Salud, del Centro Universitario de la Costa Sur, sede Anonas (CUCOSTASUR) FAM 2016 P-11		X				\$ 3,000,000.00	\$ 712,474.71	\$ 2,287,525.29	Preliminares de instalaciones sustentables: pvc con contenido de bicoides, (polipropileno, polibutileno y polietileno) 855 0.00 Cimentación y estructura: materiales naturales de banco mejorados con cementantes 634 0.00 TOTAL 1489.12 0.00	Preliminares, (limpieza de terreno, despalmes, excavaciones, rellenos). Cimentación (plantillas). Habilitado y armado total del acero de refuerzo. Anclaje de castillos y suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo para las columnas de la estructura	Habilitado y armado de cimbras comunes, suministro y colocación de concreto premezclado, colocación de muro a tezon de block de jalisco para nivelación de cimentación así como la colocación de su impermeabilizante	70	02/10/18	16/12/18	En la actualidad se encuentra habilitado el 100% del acero de refuerzo para la cimentación y los alcances contratados de la estructura. Se comenzará a suministrar el concreto premezclado en la cimentación								
11	Cuarta etapa de la construcción del Auditorio del Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño (CUAAD) FAM 2016 P-16	X					\$ 4,000,000.00	\$ 1,045,834.84	\$ 2,954,165.16	Auditorios 1 720.00 TOTAL 1.00 720.00	Instalación de piso cerámico y zócalo, instalación de cristal en fachada norte.	Plafond, instalación eléctrica, aplicación de recubrimiento texturizado y pintura.	75	08/10/18	21/12/18									

2018

AÑO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Noviembre
 FECHA DE CORTE: 25/11/18

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad de Guadalajara**

Entidad federativa: Jalisco

Clave Inst 911: 14MSU0010Z

RESPONSABLES

 Nombre: Mtro. Rubén Juan Sebastián García Sánchez
 Cargo: Coordinador General de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara
 Teléfono: 52 (01) 33 31342214 Ext 11202
 Correo electrónico: ruben.garcia.sanchez@copiadi.udg.mx


 Nombre: Ing. Esteban Segura Estrada
 Cargo: Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
 Teléfono: 52 (01) 33 31342235 Ext 1801 y 1802
 Correo electrónico: esegura@redutg.udg.mx


DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
		Obras de continuidad	Equipamiento	Adelantamientos y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/Equipo	Cantidad				Metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
12	Obras exteriores y conectividad del Edificio de Laboratorio de Ingenierías (CUNORTE) FAM 2019 P-25	X				\$ 1,500,000.00	\$ 579,280.87	\$ 920,719.13	Talleres	2	210.00	Al momento la plazoleta y andadores se encuentran concluidos, así como los trabajos de albañilerías para instalación de transformador y tableros, tendido de cableado por los ductos.	Concluir la instalación y conexión de la transición aéreo subterránea, y la instalación a tableros del edificio desde i-line, y la libranza para energización.	95	10/09/18	28/11/18	La empresa solicitó prórroga de 7 días para concluir conexiones eléctricas y solicitar la libranza eléctrica ante CFE							
									Laboratorios	12	680.00													
									Oficinas académicas	1	26.00													
									Aulas didácticas	3	156.00													
									Sanitarios	2	52.00													
									Áreas comunes	4	763.00													
									Otros	3	105.00													
TOTAL	27.00	1992.00																						
13	Laboratorio de Química, quinta etapa, (CUCIE) FAM 2018 P-22	X				\$ 4,532,644.16	\$ 1,017,560.06	\$ 3,515,084.10	Laboratorios	5	817.39	Trabajos de reforzamiento verticales en estructura fidecalle y suministro de láminas de metal desplegado	Una vez concluido el reforzamiento vertical se inicia la instalación de las pieles	8	18/10/18	11/01/19	La empresa contratista implementará otro frente de trabajo para dar avance a la instalación de reforzamientos verticales en fachadas							
									Cubículos	12	436.39													
									Sanitarios	4	41.51													
									Otros	12	904.71													
									TOTAL	33.00	2200.00													

\$45,544,269.16 \$13,988,842.56 \$31,555,426.60


 Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
 Rector General de la Universidad de Guadalajara
 Nombre y firma del Titular de la IES


 Ing. Esteban Segura Estrada
 Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

¹ Se capturará los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas fotos como sea necesario.

² En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Noviembre

FECHA DE CORTE: 25/11/18

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 1 Nombre de la obra:

Conclusión de módulo A (4 aulas y pasillo de intercomunicación) en la planta alta del Centro Universitario de la Ciénega, sede Atotonilco (CUCIENEGA) FAM 2019 P-2



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

40

CROQUIS DE LOCALIZACION



Referencia de fotos en croquis

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Universidad, No.1115, Col. Lindavista,
Código Postal 47820, Ocotlán, Jalisco. México.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Se realiza la demolición de hormigón, ladrillo de azotea, trazos, fabricación de columnas y estructura, además de montaje y soldadura de estructura.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Noviembre

FECHA DE CURTE: 25/11/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad

0

PRIORIDAD

2

Nombre de la obra:

Instalación de luminarias led, fotoceldas y paneles solares en las instalaciones del Sistema de Universidad Virtual. (SUV) FAM 2018 P-36

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



ARQUITECTÓNICA PLANTA



Referencia de fotos en croquis



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. La Paz No. 2453
Col. Arcos Sur, C.P. 44130
Guadalajara, Jalisco.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Proceso de pago de anticipo.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Sagura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Noviembre

FECHA DE CURTE: 29/11/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Edificio de Investigación (Vinculación y Transferencia del Conocimiento) (CUCEA) FAM 2019 P-11

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

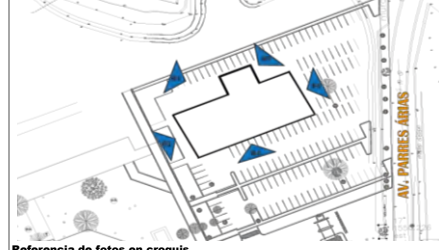

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Periférico Norte 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

3

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Los trabajos realizados a la fecha incluyen limpieza, deshierbe, y retiro de escombros, prefi de azotea y tapial perimetral de obra.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración Central de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO





DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Noviembre

FECHA DE CURTE: 25/11/18

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

 Escudo de la universidad Porcentaje de avance <p style="font-size: 24px; text-align: center;">0</p>	PRIORIDAD 4 Nombre de la obra: CULAGOS Sustentable (CULAGOS)	FAM 2019 P-14	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO Enrique Díaz de León No. 1144, Colonia Paseos de la Montaña C.P. 47460, Lagos de Moreno, Jalisco, México
	CROQUIS DE LOCALIZACIÓN 		

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral


Comentarios de los trabajos realizados:
 Proceso de pago de anticipo.



F3: Fachada posterior




F4: Entrada



F5: Interior de aula


 Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
 Rector General de la Universidad de Guadaluajara
 Nombre y firma del Titular de la IES


 Mtro. Esteban Segura Estrada
 Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadaluajara
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Noviembre

FECHA DE CORTE: 25/11/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad



Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD 5 Nombre de la obra:

Equipamiento de Mobiliario especializado para laboratorios de aprendizaje del Centro Universitario de los Valles (CUVALLES) FAM 2018 P-6 (ajuste de monto)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Guadalajara - Ameca Km. 45.5, C.P. 46600, Ameca, Jalisco, México.

FOTOS




F1: Fachada principal



F2: Lateral

Comentarios de los trabajos realizados:


Anticipo pagado el 21/11/2018, en proceso de entrega por parte del proveedor.

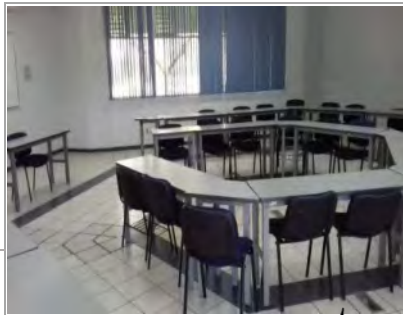

F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Espinosa
Coordinador de Servicios Generales de la Subdirección General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Noviembre

FECHA DE CURTE: 25/11/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad

85


PRIORIDAD

6

Nombre de la obra:

Centro de Recursos Informativos -CERI- Tercera Etapa (CUCBA). (CUCBA) FAM 2019 P-16

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

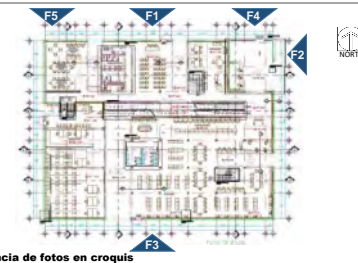

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

C. Ramón Padilla Sánchez #2100 Nextipac,
Zapopan, Jalisco, México

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

1.- Se muestran imágenes de los avances del suministro y cobocación de acero de refuerzo en entripiso

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Noviembre

FECHA DE CURTE: 25/11/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad

60


PRIORIDAD 7

Nombre de la obra:

Continuación de Remodelación Clínica Escuela en el Centro Universitario del Sur (etapa 2) (CUSUR)

FAM 2018 P-17

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Enrique Arreola Silva No. 883, colonia centro
C.P. 49000, Ciudad Guzmán, Jalisco, México.

FOTOS



F1: Fachada principal




F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:


- Refino con material de banco hasta nivel de piso terminado.
- Colado de columnas
- Cimbrao de losa y traves



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES

Dr. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración Central de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Noviembre

FECHA DE CURTE: 29/11/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

PRIORIDAD

8

Nombre de la obra:

Continuación de la construcción de nuevas instalaciones para el Laboratorio de Psicología y Educación Especial (CUCS) FAM 2018 P-3

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Sierra Mojada # 950, Modulo U, Col. Independencia, C.P. 44340, Guadalajara, Jalisco, México

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Lateral

Comentarios de los trabajos realizados:


Se culminan trabajos de herrería, instalación de luminarias solares, colocación de paneles solares para luminarias de fachada, Colocación de letrero de acero inoxidable, instalación de aires acondicionados, iluminación, cercados, electricidad e iluminación.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada

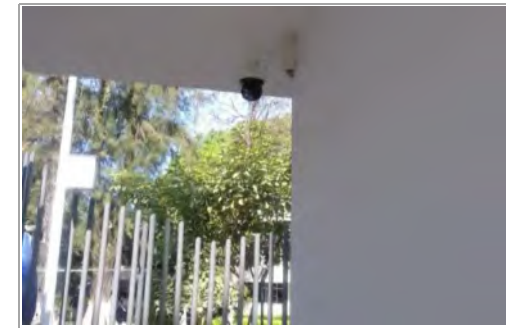

F5: Interior de aula

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES

Dr. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Noviembre

FECHA DE CURTE: 25/11/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PRIORIDAD

9

Nombre de la obra:

Continuación de Construcción Sede Tomatlán del Centro Universitario de la Costa, Edificio C. (CUCOSTA) FAM 2018 P-7 (ajuste de monto)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera La Cumbre - Tomatlán, km. 2.116, Tomatlán, Jalisco.



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

50

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

- SE TRABAJA EN COLOCACIÓN DE PISOS CERÁMICOS
- SE TRABAJA EN APLANADO EN MUROS.
- SE TRABAJA EN CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS.
- SE TRABAJA EN TENDIDO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS.
- SE TRABAJA EN COLOCACIÓN DE ORMIGÓN EN AZOTEA.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Noviembre

FECHA DE CORTE: 25/11/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Escudo de la universidad
Porcentaje de avance

70

PRIORIDAD 10 Nombre de la obra:

Construcción de edificio bioclimático de laboratorios para el Departamento de Ciencias de la Salud, del Centro Universitario de la Costa Sur, sede Anonas (CUCOSTASUR) FAM 2018 P-11

CROQUIS DE LOCALIZACION



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Camino de Capaya S/N, Colonia Castellón, Autlán, Independencia Nacional #151 C.P. 48900, Autlán, Jalisco, México.



FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:
En la actualidad se encuentra habilitado el 100% del acero de refuerzo para la cimentación y los alcances contratados de la estructura. Se comenzará a suministrar el concreto premezclado en la cimentación



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Dr. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Noviembre

FECHA DE CURTIR: 25/11/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **11**

Nombre de la obra:



Cuarta etapa de la construcción del Auditorio del Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño (CUAAD) FAM 2018 P-16



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance
75

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

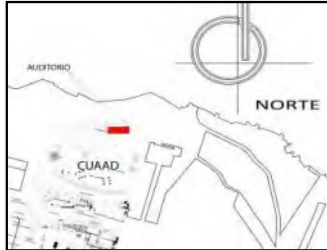

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calzada Independencia Norte no. 5075, Col. Huentitán El Bajo, C.P.44250 Guadalajara, Jal.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:
Instalación de piso cerámico y zoclo, instalación de cristal en fachada norte.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES

Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Noviembre



FECHA DE CORTE: 25/11/18

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 12 Nombre de la obra:

Obras exteriores y conectividad del Edificio de Laboratorio de Ingenierías (CUNORTE)
FAM 2019 P-25

CROQUIS DE LOCALIZACION



Referencia de fotos en croquis

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Federal No. 23, Km. 191, C.P. 46200, Colotlán, Jalisco, México



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

95

FOTOS



Conclusion de plazuelas y andadores



Conclusion de I-Line, y registros

Comentarios de los trabajos realizados:

AL MOMENTO SE TRABAJA EN CONEXIONES ELÉCTRICAS ENTRE TRANSFORMADOR Y TABLEROS, Y PRÓXIMOS A REALIZAR LA LIBRANZA YA SEA DE MANERA INTERNA O SOLICITARLA A CFE, LO QUE RESULTE DE LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL TENIDIDO ELÉCTRICO PROPIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO.



Suministro y colocación de transformador



Instalación y conexión de transformador



Conexión entre transformador y tableros.

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Juan Sebastian Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Noviembre

FECHA DE CURTE: 25/11/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **13**

Nombre de la obra: **Laboratorio de Química, quinta etapa. (CUCEI)**

FAM 2018 P-22





Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

8

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

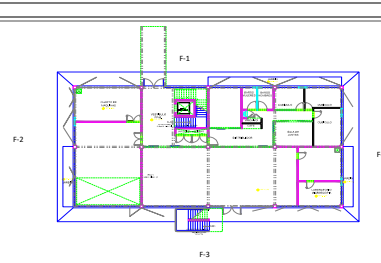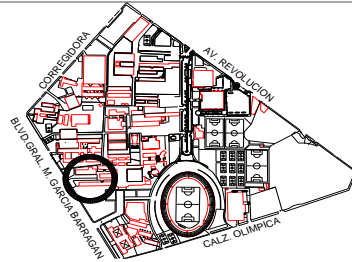

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Boulevard Marcelino Gracia Barragán No. 1421,
Esquina Calzada Olímpica C.P 44430, Guadalajara,
Jalisco.

FOTOS



Fachada principal



Reforzamiento verticales

Comentarios de los trabajos realizados:

LOS TRABAJOS EN EL EDIFICIO DE QUÍMICA PRESENTAN AVANCE CON LA INSTALACION DE REFUERZOS VERTICALES EN ESTRUCTURA FLOTANTE EXISTE PARA PODER RECIBIR LAS



Fachada posterior



Colocacion de veteales para recibir placas



Colocacion de veteales para recibir placas

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
